

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/19-07-П от 19 июля 2023г.**

г. Москва

«02» мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КИКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КИКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее – Соглашение) к Договору строительного подряда № МВМ/19-07-П от 19 июля 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору График выполнения Работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный подрядчик:

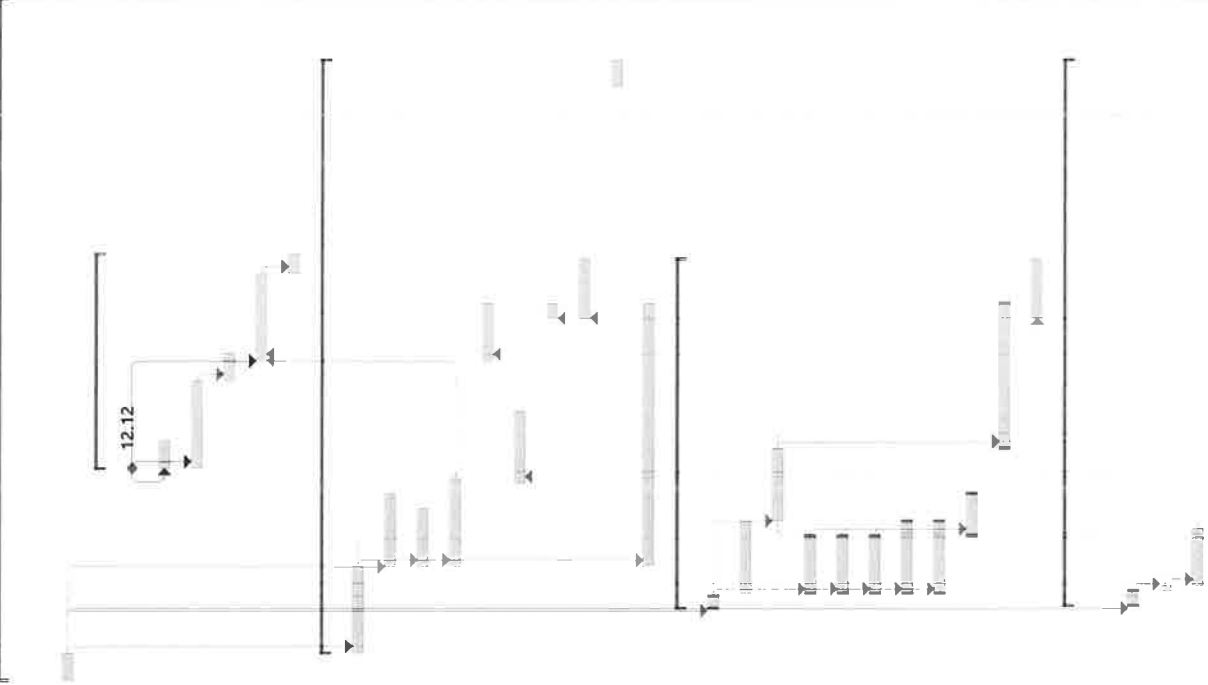
**Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»**

  **Ю.Ф. Кесслер**

Подрядчик:

**Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

  **Е.А. Бусел**

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	
1	«Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт»	235 дней	18.09.23	17.06.24	
2	Подготовительные мероприятия	10 дней	18.09.23	28.09.23	
3	Архитектурно-строительные решения (130-23-АС1)	74 дней	12.12.23	06.03.24	
4	Поставка сэндвич панелей	0 дней	12.12.23	12.12.23	
5	Демонтажные работы	10 дней	12.12.23	22.12.23	
6	Монтаж металлических конструкций	30 дней	12.12.23	15.01.24	
7	ОГЗ металлоконструкций	10 дней	16.01.24	26.01.24	
8	Устройство перегородки	30 дней	24.01.24	27.02.24	
9	Бетонный плитус	7 дней	28.02.24	06.03.24	
10	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	204 дней	29.09.23	23.05.24	
11	Демонтаж существующего слоя пола под пути №3 и №4	30 дней	29.09.23	02.11.23	
12	Демонтаж существующего слоя пола под пути №1 и №2	25 дней	03.11.23	01.12.23	
13	Кабельные лотки	20 дней	03.11.23	25.11.23	
14	Фундаменты под домкраты ФМ1-12шт.	30 дней	03.11.23	07.12.23	
15	Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей	20 дней	24.01.24	15.02.24	
16	Полы сварочного цеха и компрессорной	25 дней	06.12.23	03.01.24	
17	Кладка стен	5 дней	10.02.24	15.02.24	
18	Заполнение проёмов	20 дней	10.02.24	04.03.24	
19	Ремонт кровли	10 дней	13.05.24	23.05.24	
20	Отделочные работы	90 дней	03.11.23	15.02.24	
21	АБК. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС3)	120 дней	17.10.23	04.03.24	
22	Демонтажные работы	5 дней	17.10.23	21.10.23	
23	Ограждающие конструкции (сэндвич панели)	25 дней	23.10.23	20.11.23	
24	Устройство перегородок	25 дней	21.11.23	19.12.23	
25	Лестничная клетка	20 дней	23.10.23	14.11.23	
26	Лестничная клетка в осях Б/З-В и 32-33	20 дней	23.10.23	14.11.23	
27	Лестница в осях Б/З-В и 23-24	20 дней	23.10.23	14.11.23	
28	Плита перекрытия на отм.+3,725	25 дней	23.10.23	20.11.23	
29	Стеновые панели	25 дней	23.10.23	20.11.23	
30	АКЗ и ОГЗ металлических конструкций	15 дней	15.11.23	01.12.23	
31	Отделочные работы	50 дней	20.12.23	15.02.24	
32	Заполнение проёмов (окна, двери)	20 дней	10.02.24	04.03.24	
33	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС4)	188 дней	18.10.23	23.05.24	
34	Демонтажные работы	5 дней	18.10.23	23.10.23	
35	Земляные работы	2 дней	24.10.23	25.10.23	
36	Фундаментная плита наружной установки под воздухооборник и компрессоры	20 дней	26.10.23	17.11.23	

Ид	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Гр
37	Монтаж металлических конструкций	15 дней	18.11.23	05.12.23	04 Сен 25 Сен 16 Окт 06 Ноя 27 Ноя 18 Дек 08 Янв 19 Фев 11 Мар 01 Апр 22 Апр 13 Май 03 Июн 24
38	Ограждающие конструкции	10 дней	06.12.23	16.12.23	П С В П С Ч П С В П С Ч П С В П С Ч П С В П
39	Устройства отверстия под жалюзийные решётки	2 дней	18.12.23	19.12.23	
40	Устройства ограждения	10 дней	13.05.24	23.05.24	
41	Заделка оконного проёма	5 дней	18.12.23	22.12.23	
42	Заполнение проёмов	4 дней	23.12.23	27.12.23	
43	Железнодорожные пути (130-23-ПЖ)	100 дней	29.09.23	23.01.24	
44	Земляные работы	30 дней	29.09.23	02.11.23	
45	Устройство пути №1 (66 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
46	Устройство пути №2 (40 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
47	Устройство пути № 3 (156,39 п.м.)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
48	Устройство пути № 4 (97,20)	40 дней	08.12.23	23.01.24	
49	Работы в осях I-14/А-Б	190 дней	17.10.23	24.05.24	
50	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
51	Кабельные лотки	10 дней	17.10.23	27.10.23	
52	Поставка ворот	0 дней	20.11.23	20.11.23	20.11
53	Заполнение проёмов (ворота А/2 -А/3)	10 дней	20.11.23	30.11.23	
54	Отделочные работы	30 дней	28.10.23	01.12.23	
55	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	185 дней	23.10.23	24.05.24	
56	Монтаж воздуховодов в осях I-14/А-Б	20 дней	23.10.23	14.11.23	
57	Теплоснабжение	20 дней	02.05.24	24.05.24	
58	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	40 дней	17.10.23	01.12.23	
59	Низковольтное оборудование	20 дней	17.10.23	08.11.23	
60	Кабельные линии	20 дней	17.10.23	08.11.23	
61	Светотехническое оборудование	20 дней	09.11.23	01.12.23	
62	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	20 дней	16.11.23	08.12.23	
63	Кабельные линии	20 дней	16.11.23	08.12.23	
64	Низковольтное оборудование	20 дней	16.11.23	08.12.23	
65	Устройство временной перегородки по оси 14	10 дней	02.12.23	13.12.23	
66	Внутренние системы водоснабжения и канализации (130-23-ВК)	45 дней	20.12.23	09.02.24	
67	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	45 дней	20.12.23	09.02.24	
68	Горячее водоснабжение Т3, Т4	45 дней	20.12.23	09.02.24	
69	Противопожарный водопровод В2	45 дней	20.12.23	09.02.24	
70	Бытовая канализация К1	45 дней	20.12.23	09.02.24	
71	Воздухоснабжение (130-23-ВС)	55 дней	17.10.23	19.12.23	
72	Демонтажные работы	5 дней	17.10.23	21.10.23	
73	Монтаж трубопроводов	30 дней	23.10.23	25.11.23	
74	Оборудование	20 дней	27.11.23	19.12.23	

Ид	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Авт. 04 Сен 25 Сен 16 Окт 06 Ноя 27 Ноя 18 Дек 08 Янв 29 Янв 19 Фев 11 Мар 01 Апр 22 Апр 13 Май 03 Июнь 24
75	Наружные сети канализации (130-23-НК)	40 дней	17.10.23	01.12.23	П С В П В С Ч П С В П 8 С Ч П С В П С Ч П С В П С Ч П С В П
76	Демонтажные работы	10 дней	17.10.23	27.10.23	
77	Наружная хозяйственно-бытовая канализация К1.	20 дней	28.10.23	20.11.23	
78	Восстановительные работы	10 дней	21.11.23	01.12.23	
79	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ1)	40 дней	20.12.23	03.02.24	
80	Отопление	40 дней	20.12.23	03.02.24	
81	Теплоснабжение установок ПИ	40 дней	20.12.23	03.02.24	
82	Вентиляция	40 дней	20.12.23	03.02.24	
83	Система ДУ1	35 дней	20.12.23	29.01.24	
84	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24	
85	Цех №8. Отопление и вентиляция (130-23-ОВ2)	128 дней	17.10.23	13.03.24	
86	Вентиляция	128 дней	17.10.23	13.03.24	
87	Монтаж воздухопроводов в осях 17-33/Б-В - 17-33/А-Б	40 дней	17.10.23	01.12.23	
88	Монтаж воздухопроводов в осях 1-17/Б-В - 1-17/А-Б	40 дней	02.12.23	17.01.24	
89	Монтаж ФВУ в осях 1-17/Б-В	30 дней	26.12.23	29.01.24	
90	Монтаж ФВУ в осях 17-33/Б-В	30 дней	06.01.24	09.02.24	
91	Монтаж и обвязка вентоборудования в венткамерах и на кровле	45 дней	22.01.24	13.03.24	
92	Теплоснабжение	45 дней	17.01.24	08.03.24	
93	АБК. Вентиляция и кондиционирование (130-23-ОВ3)	85 дней	21.11.23	27.02.24	
94	Отопление	70 дней	21.11.23	09.02.24	
95	Монтаж магистральных трубопроводов	25 дней	21.11.23	19.12.23	
96	Монтаж и подключение радиаторов	45 дней	20.12.23	09.02.24	
97	Вентиляция	85 дней	21.11.23	27.02.24	
98	Монтаж воздухопроводов	50 дней	21.11.23	17.01.24	
99	Монтаж и обвязка оборудования вентиляции	35 дней	18.01.24	27.02.24	
100	Кондиционирование воздуха	35 дней	20.12.23	29.01.24	
101	Монтаж кондиционирования	35 дней	20.12.23	29.01.24	
102	Пожарная сигнализация (130-23-ПС)	94 дней	27.12.23	13.04.24	
103	Монтаж оборудования	50 дней	16.02.24	13.04.24	
104	Прокладка кабельных трасс	50 дней	27.12.23	22.02.24	
105	Структурированная кабельная сеть (130-23-СКС)	50 дней	20.12.23	15.02.24	
106	Оборудование	50 дней	20.12.23	15.02.24	
107	Кабельные линии	50 дней	20.12.23	15.02.24	
108	Система охранного телевидения (130-23-СОТ)	110 дней	08.12.23	13.04.24	
109	Оборудование	50 дней	16.02.24	13.04.24	
110	Кабельные линии	50 дней	08.12.23	03.02.24	
111	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА1)	15 дней	13.05.24	29.05.24	

