

Исх.№ 504-К от 18.11.2025г.

**Директору по эксплуатации  
и безопасности производственной деятельности  
АО «Коломенский завод»  
Степанкевичу В.С.**

*копия*  
**Заместителю директора МТО  
Григоряну Т.С.**

**Начальнику ОпС  
Губанову П.В.**

**Начальнику ЖДЦ  
Невежину Д.М.**

**Руководителю проектов  
ООО «Проминжиниринг»  
Глазкову С.Н.**

О приемке технической готовности СП6

**Уважаемый Вячеслав Станиславович!**

В рамках проведения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод» в рамках договора подряда №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 прошу организовать работу комиссии по приемке технической готовности к эксплуатации стрелочного перевода СП6.

Сбор комиссии на месте монтажа СП6 (см. Приложение 1 - план производства работ) предлагаю на 20.11.2025 (четверг) 14-00 МСК.


Форму акта технической готовности прилагаю (Приложение 2 – Акт технической готовности).

С уважением,

Руководитель проектного офиса  
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Липатов В.Е.

План производства работ по замене стрелочных переводов №6, №9, №10, №11.

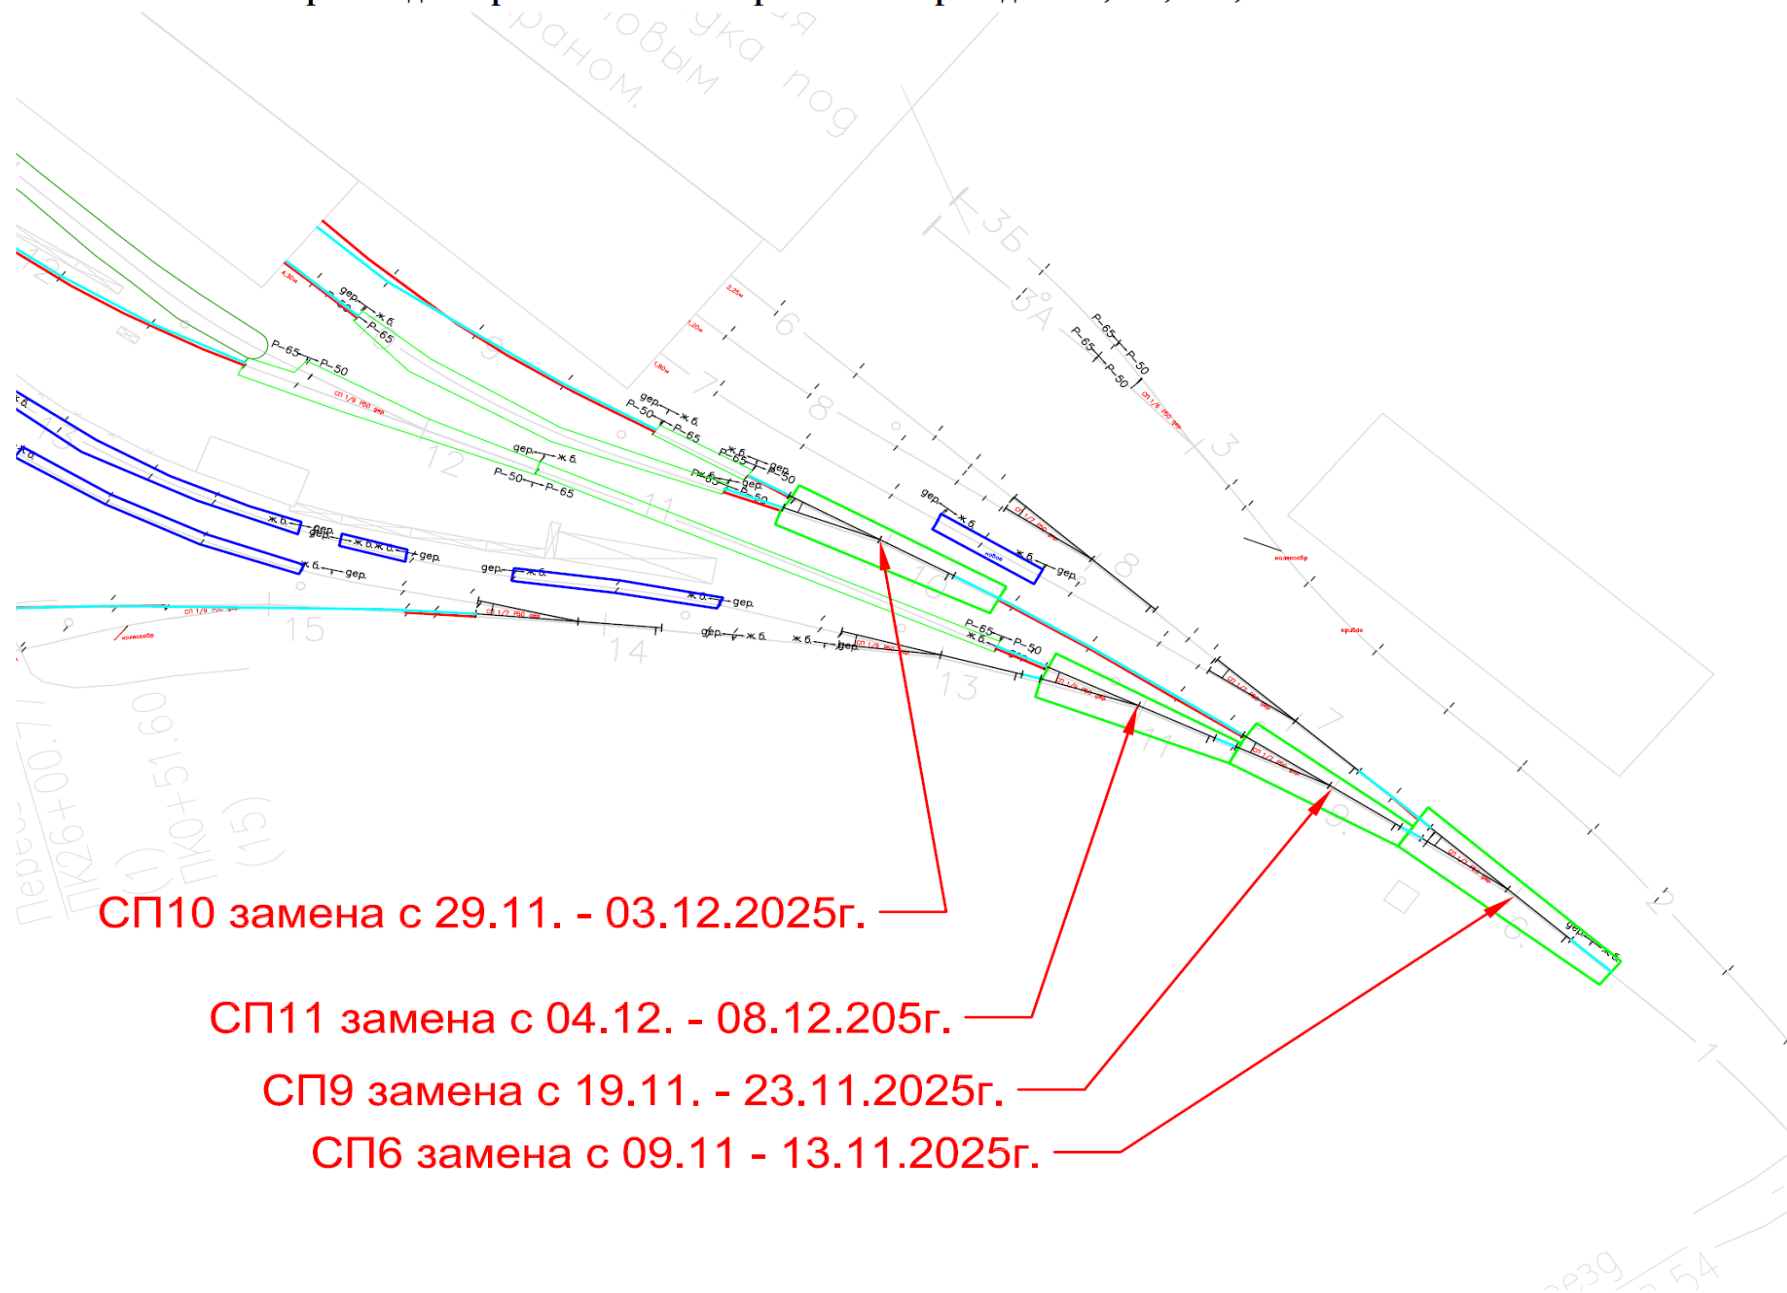

АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
стрелочного перевода № 6

1. Дата выполнения работ: 09.11.2025 г. - 13.11.2025 г.

2. Место работ: АО «Коломенский завод», М.О., г. Коломна, ул. Партизан 42

4. Стрелочный перевод: №6, тип Р65, марка 1/7 колеи 1524 мм.

(N, тип, марка)

5. Виды работ: Демонтаж СП№6, Выемка грунта (загрязнённого балласта), Уплотнение основания, Устройство балластного основания из щебня, Монтаж брусьев полимерных композитных, Сборка и монтаж стрелочного перевода, Монтаж переводного механизма (флюгарки), Монтаж стыковочных накладок, Балластировка, Выправка, Рихтовка

6. Кем выполнены работы: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛПРОКК»,  
ООО «ЭлектроЭнергетика»

7. Перечень смонтированных элементов (применённых материалов): Щебень гранитный фр. 20/40, Композитный брус, Стрелочный перевод, Переводной механизм (флюгарка), Шпала железобетонная, в комплекте со скреплением КБ-65, Стыковочные накладки Р-65, Лак битумный БТ-577, Эмаль ПФ-115 (белая, черная)

8. Работа выполнена в полном объеме, стрелочный перевод готов к приемке в эксплуатацию.

**Подписи комиссии:**

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта

Липатов В.Е. \_\_\_\_\_

ООО «ШЕЛПРОКК» Старший прораб

Шинкарев М.В. \_\_\_\_\_

ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера

Аверкин А.В. \_\_\_\_\_

ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля

Дураев В.Ю. \_\_\_\_\_

АО «Коломенский завод» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

АО «Коломенский завод» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

АО «Коломенский завод» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

АО «Коломенский завод» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
