

Исх № 050-К от 30.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О дополнительных работах по мусору на трансбордере

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

Настоящим сообщаем, что при планировке грунта в районе переустройства трансбордера в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ» вместо предусмотренного проектом грунта выявлен строительный мусор в виде железобетонного и кирпичного боя, а также бытовой мусор в виде покрышек, металла и отходов производства (приложение №1 Акт выявления дополнительных работ).

Затраты на вывоз и утилизацию указанного мусора не предусмотрена договором и требует корректировки стоимости. Общий объем вышеуказанного мусора составляет 2 360,60 м3 без учета коэффициента разрыхления (приложение №2 Съёмка земляных масс).

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

АКТ

Выявления дополнительных работ

Г. О. Мытищи


«18» августа 2023 г.

ООО «КикГЕОСТРОЙ» в лице Руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании Приказа, именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и ООО «Проминжиниринг» в лице ведущего инженера технического надзора Дураева В.Ю., действующего на основании Приказа, именуемый в дальнейшем «Технический заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том что:

1. При производстве работ в зоне Трансбордера (РД 131-23-ГП1), вместо предусмотренного проектом грунта, выявлен строительный мусор в виде железобетонного и кирпичного боя.
2. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Генерального подрядчика и Технического заказчика

ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный подрядчик
Руководитель проекта
ООО «КикГЕОСТРОЙ»




Шевчук К.А.

Заказчик
Ведущий инженер технического надзора
ООО «Проминжиниринг»



Дураев В.Ю.

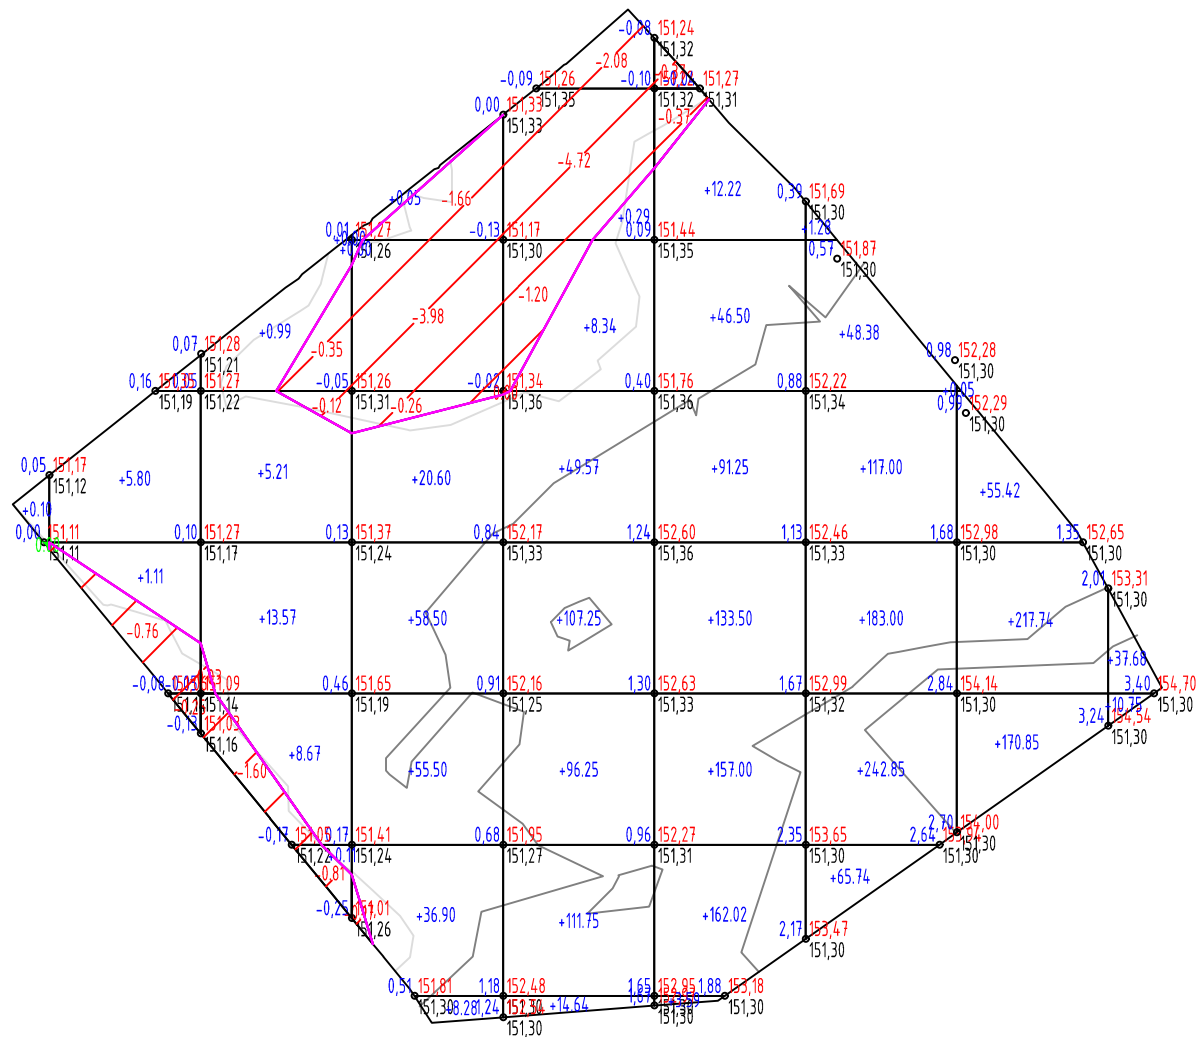

Итого, м³	Насыпь (+)	0.10	7.24	28.55	179.83	388.09	606.08	658.25	444.06	48.43	Всего, м³	2360.63
	Выемка (-)	0.00	-1.01	-2.91	-6.07	-8.00	-0.74	0.00	0.00	0.00		-18.73
