

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Исполнительная документация

**«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением
трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи,
ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»**

131-23-ГП2

**Генеральный план.
Ограждение вдоль ММЗ**

ГП2-ОГ

**Том 4
Экземпляр 1**

Московская область, г.о. Мытищи

131-23-ГП2 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.» Генеральный план.

Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>№ акта, чертежа, разрешения, журнала и др.</i>	<i>Количество листов</i>	<i>Страница по списку</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	АОСР Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50	131-23-ГП2-ОГ-01 от 05.06.2024г.	1	1
2	Исполнительная схема №01 от 05.06.2024г. Демонтаж панелей ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.		1	2
3	АОСР Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.	131-23-ГП2-ОГ-01 от 07.06.2024г.	1	3
4	Панель ограждения ПО-2, фундамент ограждения ФО2 – технический паспорт № 01/09/2023 от 01.09.2023г.		1	4
5	Щебень фр 20-40мм - сертификат №85 от 24.01.2023г.		1	5
6	Цемент М500 - документ о качестве №12/68 от 60.03.2024г.		1	6
7	Песок строительный - паспорт качества б/н от 02.09.2023г.		1	7

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
8	<i>Песок строительный - сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г.</i>		<i>1</i>	<i>8</i>
9	<i>Исполнительная схема 02 от 07.06.2024г. Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.</i>		<i>1</i>	<i>9</i>

Составил:

Инженер ПТО

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Принял:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Объект капитального строительства:

«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):

ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва,

ул. Русаковская, д.13, помещение ХХ-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей

«Саморегулируемая организация «Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный номер СРО-С-187-26012010

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

1. ООО «ШЕЛПРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6, К. 2, член саморегулируемой ассоциации «Архитектурное наследие», регистрационный номер СРО-С-230-07092010

2. ООО «ЭлектроЭнергетика», ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5, член саморегулируемой ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители», регистрационный номер СРО-С-219-21042010

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ**освидетельствования скрытых работ**

№ 131-23-ГП2-ОГ-01

"05" июня 2024 г.
(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Дураев В. Ю., приказ №5 от 03.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчук К.А. приказ №2-МВМ от 01.07.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф., приказ №1СК-МВМ от 03.07.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-77-118776 от 28.09.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Руководитель службы управления проектами ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Липатов В. Е. приказ № 2-АН от 02.10.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

1. Начальник участка ООО «ШЕЛПРОКК» Перевизнык А.П., приказ №1 от 01.08.2023г.

2. Главный инженер ООО «ЭлектроЭнергетика» Юрченко В. И., приказ № 1/08 от 04.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО "ШЕЛПРОКК", ООО "ЭлектроЭнергетика"

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

131-23-ГП2 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.» Генеральный план.

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку, раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

Исполнительная схема №01 Демонтаж панелей ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ: «05» июня 2024 г.

окончания работ: «05» июня 2024 г.

6. Работы выполнены в соответствии:

131-23-ГП2 «ЖД пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.» Генеральный план.

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»

СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: отсутствуют

Акт составлен в 5 (пяти) экземплярах.

Приложения:

Документы перечисленные в п.3 и п.4 настоящего акта

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Дураев В. Ю.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Шевчук К. А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Кесслер Ю. Ф.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Липатов В. Е.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

1. Перевизнык А. П.


(фамилия, инициалы, подпись)

2. Юрченко В. И.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

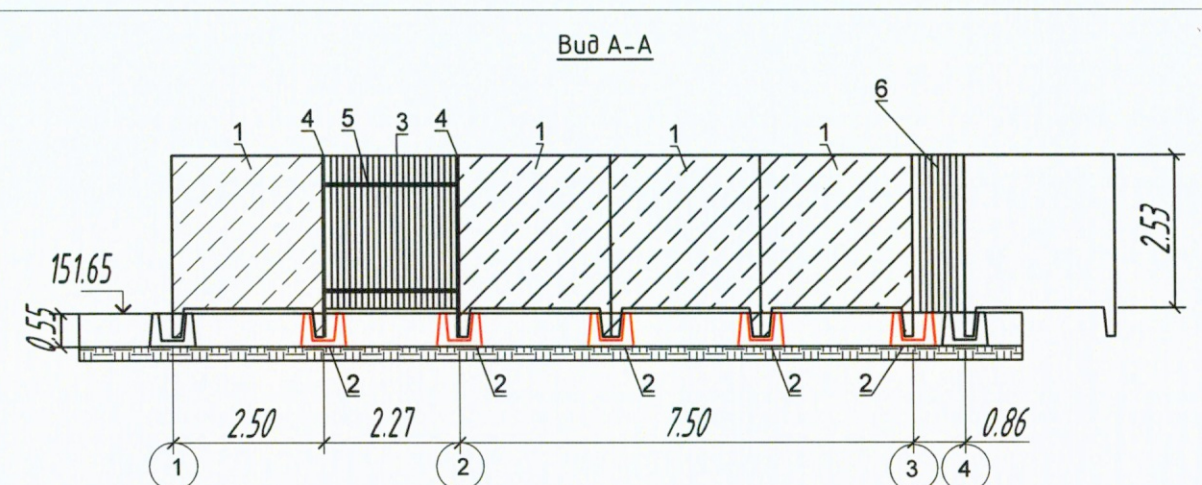

Ведомость объемов выполненных работ по демонтажу панелей ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50			
№ поз.	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Демонтаж панель ограждения ПО2 (утилизация)	шт	4
2	Демонтаж фундаментов тограждения ФО2 (утилизация)	шт	5
3	Демонтаж профлиста 2,27*2,53м	м2	5,74
4	Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм, 2,45кг/м	кг	7,35
5	Демонтаж профтрубы 40*20*2мм L=2270мм, 1,704кг/м	кг	1,704*2,27*2=7,74
6	Демонтаж профлиста 0,86*2,53м	м2	2,18

		Объем вынимаемого грунта при разработке участка							
№	Участок	Длина участка L, м	Ширина траншеи B, м	Толщина H, м	Всего V, м3	Объем V1, вытесняемый ФО2 0,95*0,75*0,55, м3	Объем разработки, V2, м ³	Объем разработки мех. способом, V3, м ³	Объем доработки руч. способом, V4=L*B*H*0,03 м ³
1	т1-т2	3,41	1,37	0,55	2,57	0,39*2=0,78	1,79	1,74	0,05
2	т.2-т4	7,49	(1,17+2,11)/2=1,64	0,55	6,76	0,39*4=1,56	5,2	5,04	0,16
ИТОГО					9,33	2,34	6,99	6,78	0,21

					2024	131-23-ГП2			
						Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи ул. Колонцова,4			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
Руков. проекта	Барчук Р.А.				05.06		ИД	1	1
Ген. директор	Кессельер Ю.Ф.				05.06				
Нач. участка	Перевизникова А.И.				05.06	Исполнительная схема № 01 Демонтаж панелей ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.	000 "КиКГЕОСТРОЙ"		
Гл. инженер	Юрченко В.И.				05.06				

Объект капитального строительства:

«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):

ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва,

ул. Русаковская, д.13, помещение ХХ-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей

«Саморегулируемая организация «Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный номер СРО-С-187-26012010

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

1. ООО «ШЕЛПРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6, К. 2, член саморегулируемой ассоциации «Архитектурное наследие», регистрационный номер СРО-С-230-07092010

2. ООО «ЭлектроЭнергетика», ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5, член саморегулируемой ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители», регистрационный номер СРО-С-219-21042010

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ**освидетельствования скрытых работ**

№ 131-23-ГП2-ОГ-02

"07" июня 2024 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Дураев В. Ю., приказ №5 от 03.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчук К.А. приказ №2-МВМ от 01.07.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф., приказ №1СК-МВМ от 03.07.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-77-118776 от 28.09.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Руководитель службы управления проектами ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Липатов В. Е. приказ № 2-АН от 02.10.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

1. Начальник участка ООО «ШЕЛПРОКК» Перевизнык А.П., приказ №1 от 01.08.2023г.

2. Главный инженер ООО «ЭлектроЭнергетика» Юрченко В. И., приказ № 1/08 от 04.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО "ШЕЛПРОКК", ООО "ЭлектроЭнергетика"

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

131-23-ГП2 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.» Генеральный план.

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку, раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

Панель ограждения ПО2, фундамент ограждения ФО2 – технический паспорт № 01/09/2023 от 01.09.2023г.,
щебень 20*40мм - сертификат №85 от 24.01.2023г., цемент М500 – документ о качестве №12/68 от 06.03.2024г.,
песок строительный – паспорт качества песка б/н от 02.09.2023г.,
сертификат соответствия. № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г.

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

Исполнительная схема №02 Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31
ПК5+50

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе)
строительного контроля)

5. Даты: начала работ: «06» июня 2024 г.

окончания работ: «07» июня 2024 г.

6. Работы выполнены в соответствии:

131-23-ГП2 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.» Генеральный план.

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»

СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: отсутствуют

Акт составлен в 5 (пяти) экземплярах.

Приложения:

Документы перечисленные в п.3 и п.4 настоящего акта

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Дураев В. Ю.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Шевчук К. А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Кесслер Ю.Ф.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Липатов В. Е.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

1. Перевизнык А. П.


(фамилия, инициалы, подпись)

2. Юрченко В. И.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

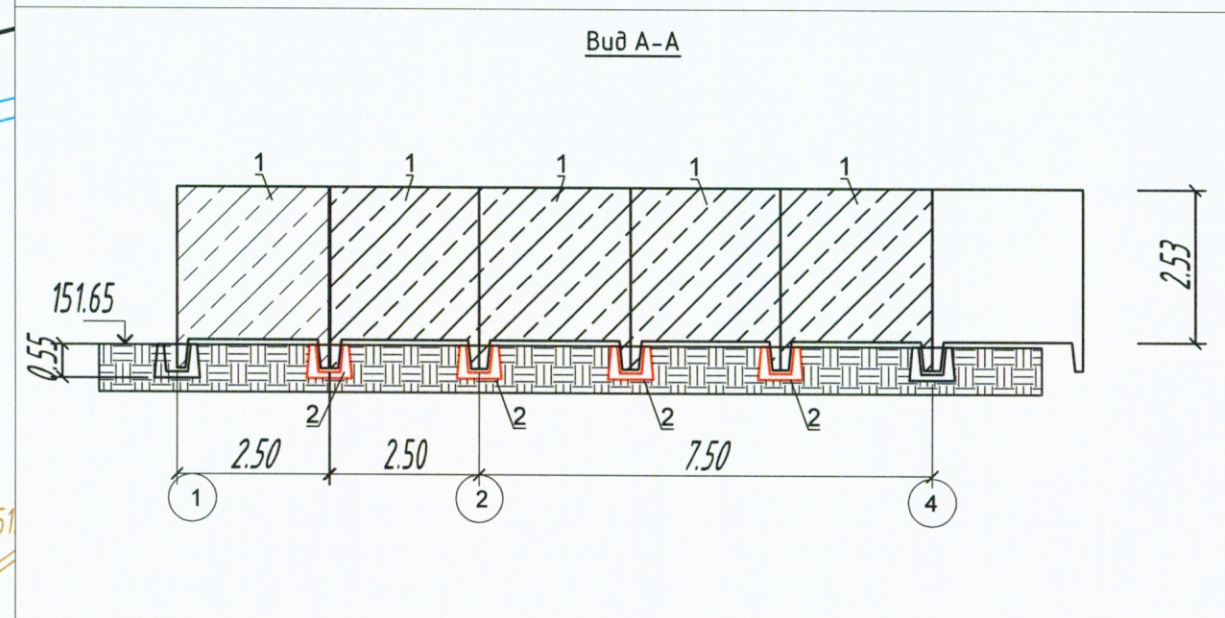

Объем выполненных работ по обратной засыпке грунтом							
№	Участок	Длина участка L, м	Ширина траншеи B, м	Толщина H, м	Всего V, м3	Объем V1, вытесняемый ФО2 0,95*0,75*0,55, м3	Объем обратной засыпке грунтом, V2, м ³
1	Т1-Т2	3,41	1,37	0,55	2,57	0,39*2=0,78	1,79
2	Т.2-Т4	7,49	(1,17+2,11)/2=1,64	0,55	6,76	0,39*3=1,17	5,59
ИТОГО					9,33	1,95	7,38

- | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|----------------|-------|--|------|--------|
| | | | | | 2024 | 131-23-ГП2 | | |
| | | | | | | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи ул. Колонцова,4 | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Стадия | Лист | Листов |
| Руководитель | 1 | 1 | 1 | Васильев С.А. | 07.06 | ИД | 1 | 1 |
| Ген. директор | 1 | 1 | 1 | Кесселер Ю.Ф. | 07.06 | | | |
| Нач. участка | 1 | 1 | 1 | Перевизов А.В. | 07.06 | | | |
| Гл. инженер | 1 | 1 | 1 | Турченко В.И. | 07.06 | | | |
| Исполнительная схема № 02
Монтаж панелей ограждения П02 с
обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ
ПЖ31 ПК5+50. | | | | | | 000 "КуКГЕОСТРОЙ" | | |



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПО «ТРЕСТ ЖБИ»

ИНН 9723091630, КПП 772301001,
р/с 40702810204290000089 в филиале центральный
ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с 30101810945250000297, БИК 044525297
109383, г. Москва, Батюнинский пр., д. 11, стр. 1
Тел. 8 (499) 343-48-52, 8 (495) 971-67-95
E-mail: info@trestgbi.ru, WEB www.trestgbi.ru

Технический паспорт № 01/09/2023
на железобетонные изделия

Получатель: ООО «Электроэнергетика»
Дата отгрузки: 01.09.2023г
Наименование изделия:

ПО2- 58 шт.
ФО2- 41 шт.

Дата изготовления конструкций : август 2023г.
Класс(марка) бетона по прочности : В-15
Процент отпускной прочности бетона: % 70
Марка бетона по морозостойкости: F 75
Марка бетона по водонепроницаемости: W4
Вес изделия: P = 1.4т, 0.6т.
Изделие изготовлено по ГОСТ,ТУ: чертежам ИЖ 31-77,ГОСТ 13015-2012.

Предприятие гарантирует, что прочность бетона(при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-2012) достигает требуемой прочности 200 кг/см², соответствующей проектной марки и по возрасту бетона 28 суток со дня изготовления.



КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.

Российская Федерация
Липецкая область, 399854
г. Данков, ул. Свердлова, 1
АО «ДОЛОМИТ»
Факс +7(47465) 28-4-46
«24» Января 2023 г.
Отдел технического контроля

Сертификат № 85
Щебень доломитовый
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий
из плотных горных пород для
строительных работ»

Получатель и его адрес Бескудниково ИП Марунич

Номер партии 8

Количество 6

Номера вагонов

Номера накладных

Количество тонн:

Фракция: 20х40 мм

416,75

№	Наименование параметров	Значение показателей	
		Требование ГОСТ 8267-93	Факт
1	Зерновой состав фракции	Полные остатки на ситах, % по массе	
		1,25D	До 0,5
		D	0
		0,5(d+D)	До 10
		d	49,19
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	От 30 до 60	93,7
3	Содержание глины в комках, %	От 90 до 100	1,4
4	Содержание зерен слабых пород, %	Не более 3	0
5	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	До 0,25	6,3
6	Насыпная плотность, т/м ³	Не более 10	15
7	Марка по дробимости	I-V	Не нормируется
8	Марка по морозостойкости	Не	1,26
9	Марка по истираемости	нормируется	400-600
			400
			25-400
			50
			И1-И4
			И3
10	Устойчивость структуры щебня против всех видов распада: - потеря массы при распаде, %	И1-И4	Не более 5
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, БК/кг	Не более 5	3,1
		До 370	10,3

Контролер ОТК

(подпись)

Подос ДД.
(расшифровка подписи)



КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.

(Handwritten signature)



АО «Михайловцемент»
р/п Октябрьский, Михайловский район, Рязанская обл, Россия, 391720
тел. +7(4912)407-132
8-800-700-63-63
gulina@cemros.ru
www.cemros.ru



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020
ГОСТ 31108-2020

Сертификат соответствия
№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00096/23
Срок действия с 13.12.2023 по 12.12.2024

Класс прочности	42,5
-----------------	------

Партия № 12/68

Дата отгрузки 06.03.2024 20:36:40
Транспортное средство № К816УМ750

Наименование показателя	Регламентированные значения согласно НД	Фактические значения
Физико-механические и химические показатели цемента		
Прочность цемента на сжатие в возрасте 2 суток, МПа фактическое значение	не менее 10,0	16,8
Прочность цемента на сжатие в возрасте 2 суток, МПа за предыдущий месяц	не менее 10,0	-
Активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут.) как среднее значение за предшествующие 3 мес., МПа	не менее 42,5 не более 62,5	46,2
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес., %	не нормируется	2,8
Группа эффективности цемента при пропаривании	-	-
Начало схватывания, мин.	не ранее 60	144
Нормальная густота цементного теста, %	не нормируется	27,00
Равномерность изменения объема (расширение), мм	не более 10,0	2,0
Наличие признаков ложного схватывания цемента	не нормируется	нет
Вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе, гран. шлак, %	не менее 6 не более 20	9,8
Содержание оксида серы (VI) SO ₃ , %	не более 3,5	3,33
Содержание хлорид-иона, %	не более 0,10	0,040
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	1,59
Массовая доля щелочных оксидов (Na ₂ O и K ₂ O) в пересчете на Na ₂ O, %	не нормируется	0,75
Специальные и технологические добавки - Кратцем Экстра, %	не более 0,2	0,0300
Химико-минералогические показатели клинкера		
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	1,67
Трёхкальциевый силикат (C ₃ S), %	суммарное содержание не менее 2/3 массы клинкера	66,8
Двухкальциевый силикат (C ₂ S), %	суммарное содержание не менее 2/3 массы клинкера	8,2
Трёхкальциевый алюминат (C ₃ A), %	не нормируется	9,1
Четырёхкальциевый алюмоферрит (C ₄ AF), %	не нормируется	12,2
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния, %	не менее 2,0	3,23
Гарантия - изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения 60 сут. с даты отгрузки		
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в цементе Аэфф по результатам периодических испытаний, Бк/кг	не более 370	95,4
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020 производства АО «Михайловцемент» пожаро- и взрывобезопасен		
Дополнительная информация:		



КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.

Шевчук К.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПромИнвест»

ИНН 5050156588 КПП 505001001

ОГРН 1225000110290

141133, Московская обл., Красный д. Первая Алексеевка, проезд, стр. 8, к.1, помещ. А

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПЕСКА

Дата поставки: 02.09.2023

Карьер: Аксиньино, Щелковский р-н.

Продукция: Песок природный 2 класса, средний.

Покупатель: ООО «АЛЬФА»

1. Качественные характеристики по ГОСТу 8736-2014

Модуль крупности	2.0-2.2
Полный остаток на сите № 0,63 мм, %	31.09
Наличие зерен размером свыше 5 мм, %	0.2
Наличие зерен размером свыше 10 мм, %	0
Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, %	0.3
Содержание глины в комках	Не обнаружено
Содержание органических примесей	Отсут-т
Коэффициент фильтрации песка, м/сут	4.0
Группа песка по ГОСТу	средний, 2 класс
Плотность песка природного (ГОСТ 8736-2014), г/см ³	1.75
Насыпная плотность	1.54 кг/м ³

Генеральный директор

А.Е. Дунаева



КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H21337

Срок действия с 10.11.2022

по 09.11.2025

№ 0020601

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул. дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Песок природный . Серийный выпуск.

КОД ОК
08.12.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8736-2014.Песок для строительных работ. Технические условия

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест». ОГРН: 1225000110290, ИНН: 5050156588. Адрес: 141138, РОССИЯ, Московская область, г. Щелково, д. Первая Алексеевка, проезд Красный, к. 1, стр. 8, помещ. А., телефон: +7(915)-335-28-68, адрес электронной почты: ezsa-lawyer@yandex.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест». ОГРН: 1225000110290, ИНН: 5050156588. Адрес: 141138, РОССИЯ, Московская область, г. Щелково, д. Первая Алексеевка, проезд Красный, к. 1, стр. 8, помещ. А., телефон: +7(915)-335-28-68, адрес электронной почты: ezsa-lawyer@yandex.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/F-10/11/22 от 10.11.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



**КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА**

М.А.Щершук К.А.

Инициалы, Фамилия

А.А.Белянин

Инициалы, Фамилия

Руководитель органа

Эксперт

М.П.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации
