


План производства работ с разбивкой на участки и мероприятиями со стороны Заказчика при реализации проекта
«ЖД ПУТИ ОТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДО ОБКАТОЧНОЙ ЛИНИИ С УДЛИНЕНИЕМ ТРАНСБОРДЕРА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4»

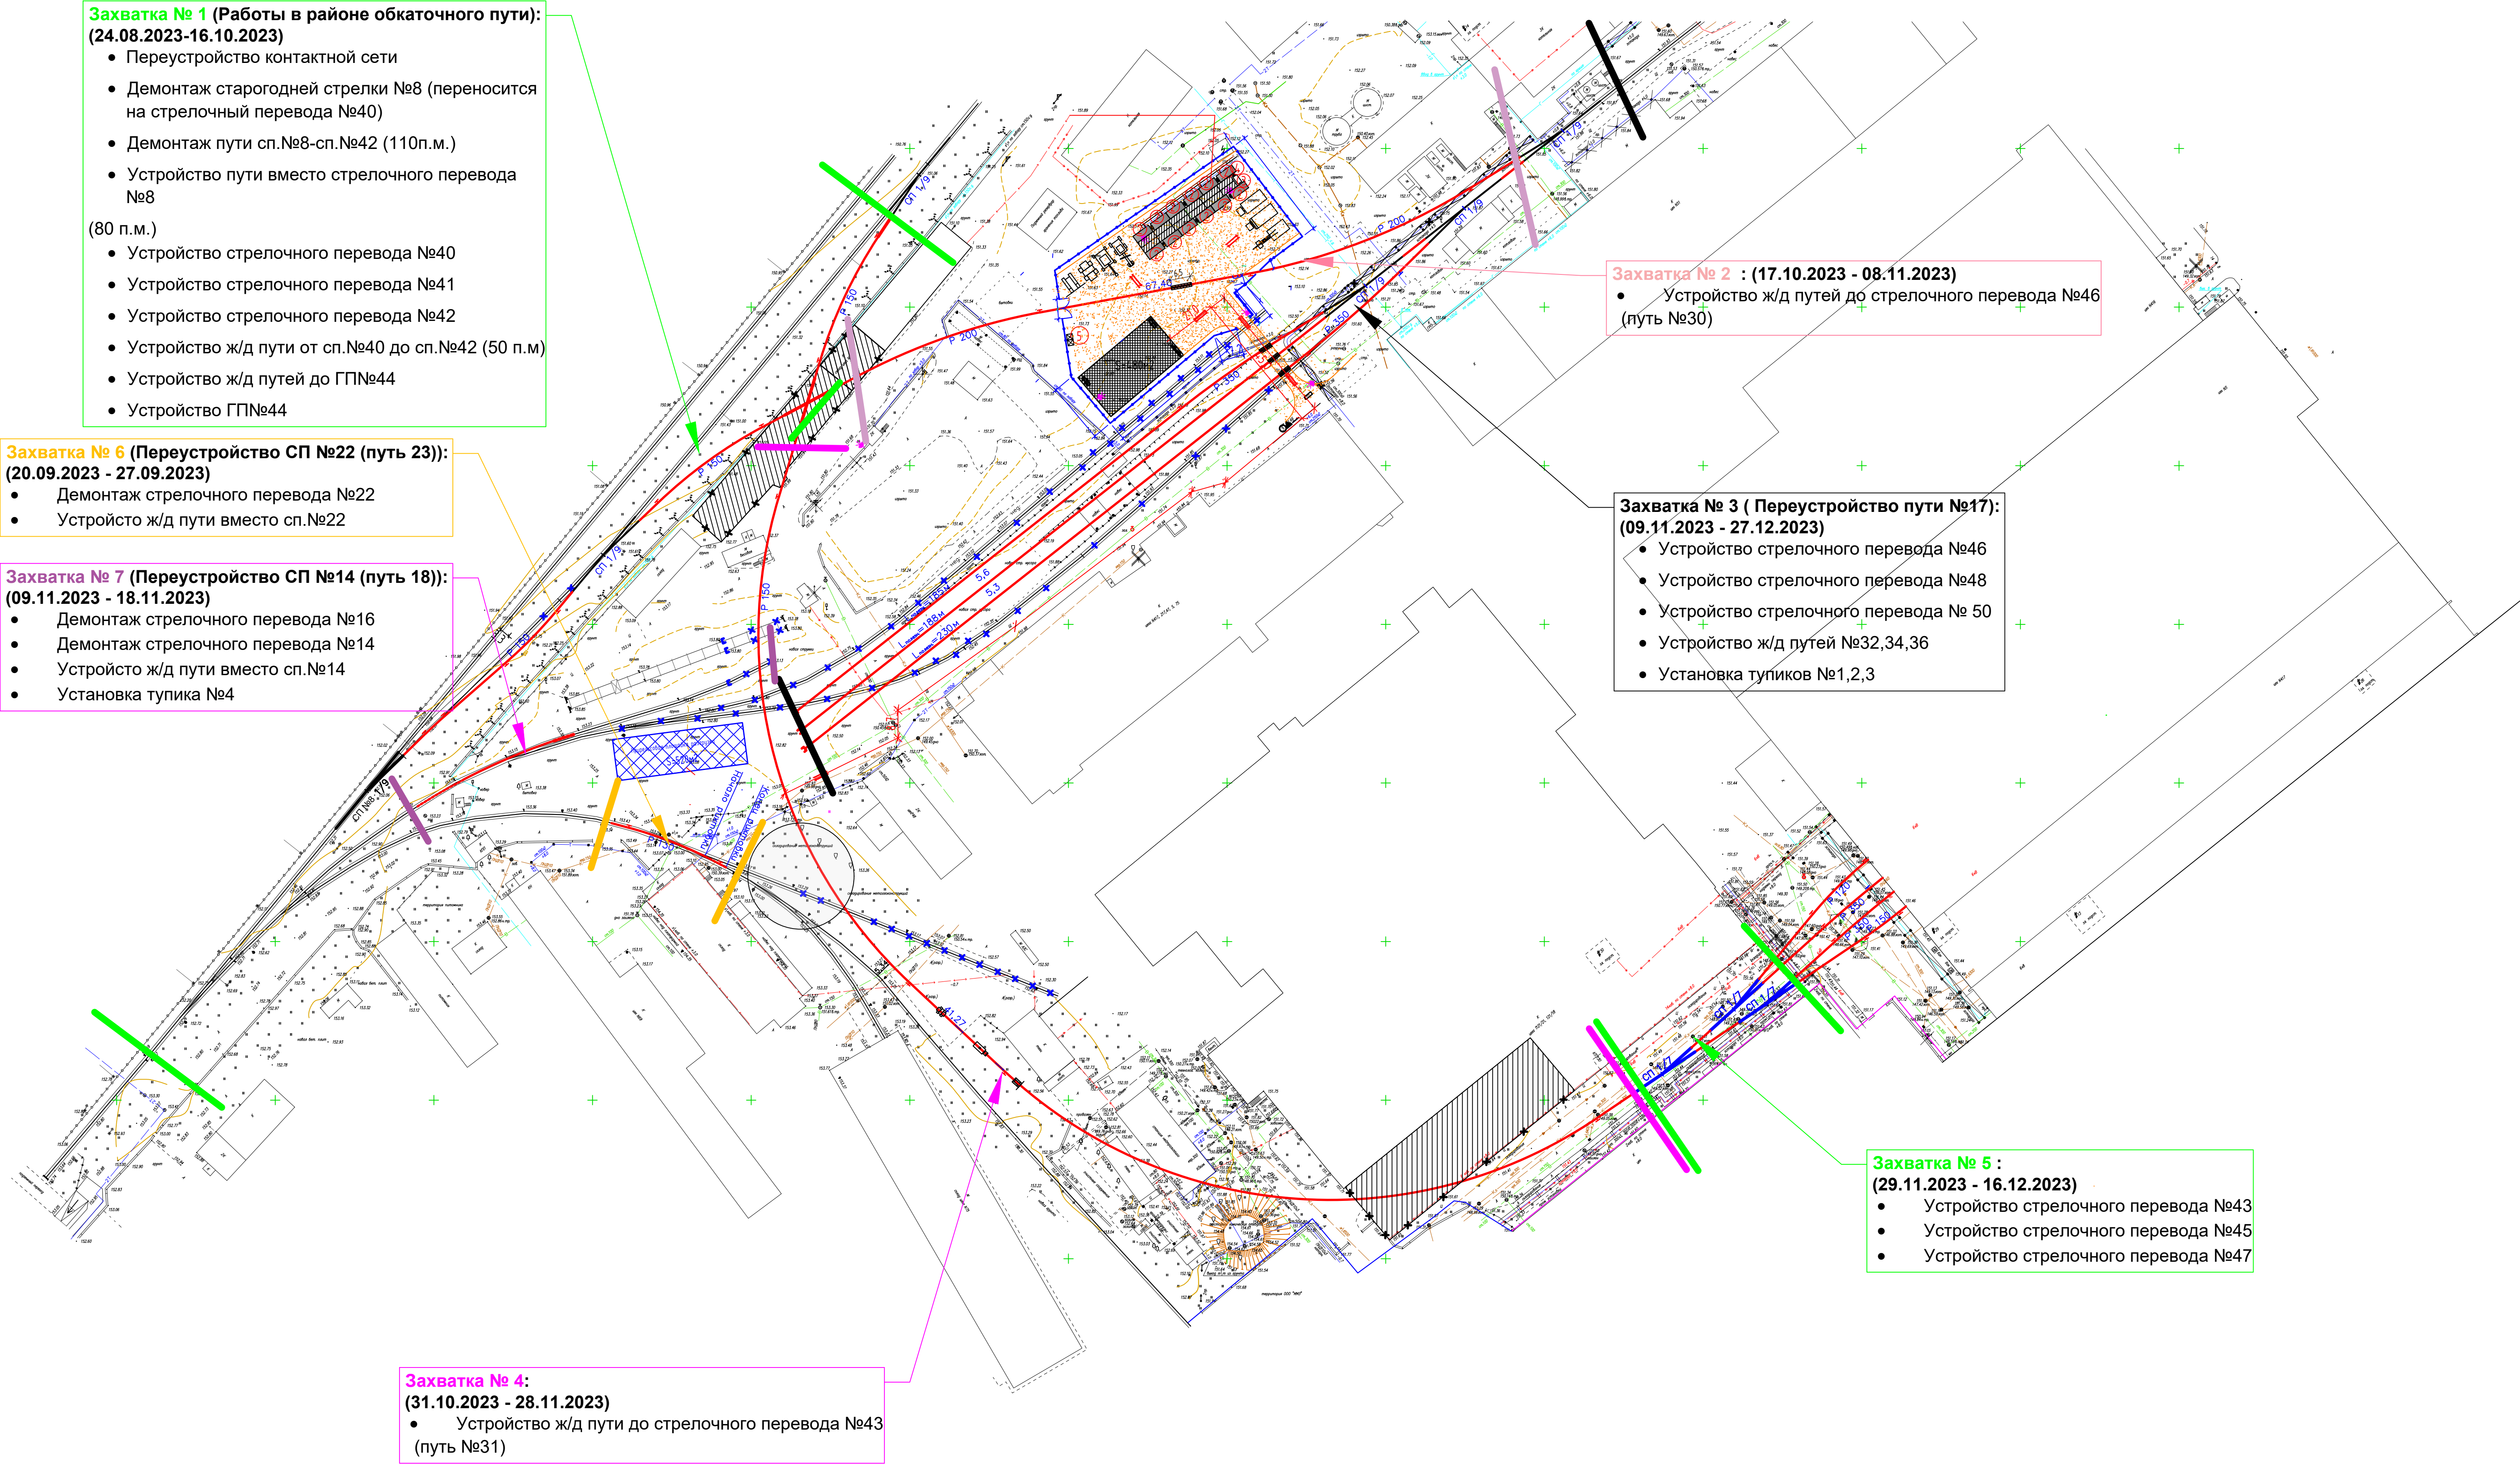

Захватка № 1 (Работы в районе обкаточного пути):
(24.08.2023-16.10.2023)

- Переустройство контактной сети
- Демонтаж старогодней стрелки №8 (переносится на стрелочный перевод №40)
- Демонтаж пути сп.№8-сп.№42 (110п.м.)
- Устройство пути вместо стрелочного перевода №8

(80 п.м.)

- Устройство стрелочного перевода №40
- Устройство стрелочного перевода №41
- Устройство стрелочного перевода №42
- Устройство ж/д пути от сп.№40 до сп.№42 (50 п.м)
- Устройство ж/д путей до ГП№44
- Устройство ГП№44

Захватка № 6 (Переустройство СП №22 (путь 23)):
(20.09.2023 - 27.09.2023)

- Демонтаж стрелочного перевода №22
- Устройсто ж/д пути вместо сп.№22

Захватка № 7 (Переустройство СП №14 (путь 18)):
(09.11.2023 - 18.11.2023)

- Демонтаж стрелочного перевода №16
- Демонтаж стрелочного перевода №14
- Устройсто ж/д пути вместо сп.№14
- Установка тупика №4

Захватка № 2 : (17.10.2023 - 08.11.2023)

- Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30)

Захватка № 3 (Переустройство пути №17):
(09.11.2023 - 27.12.2023)

- Устройство стрелочного перевода №46
- Устройство стрелочного перевода №48
- Устройство стрелочного перевода № 50
- Устройство ж/д путей №32,34,36
- Установка тупиков №1,2,3

Захватка № 5 :
(29.11.2023 - 16.12.2023)

- Устройство стрелочного перевода №43
- Устройство стрелочного перевода №45
- Устройство стрелочного перевода №47

Захватка № 4:

(31.10.2023 - 28.11.2023)

- Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31)

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.						План производства работ по захваткам			
ГИП									
Н.контр.									
						Стадия	Лист	Листов	
