


План производства работ по замене стрелочных переводов №6, №9, №10, №11.

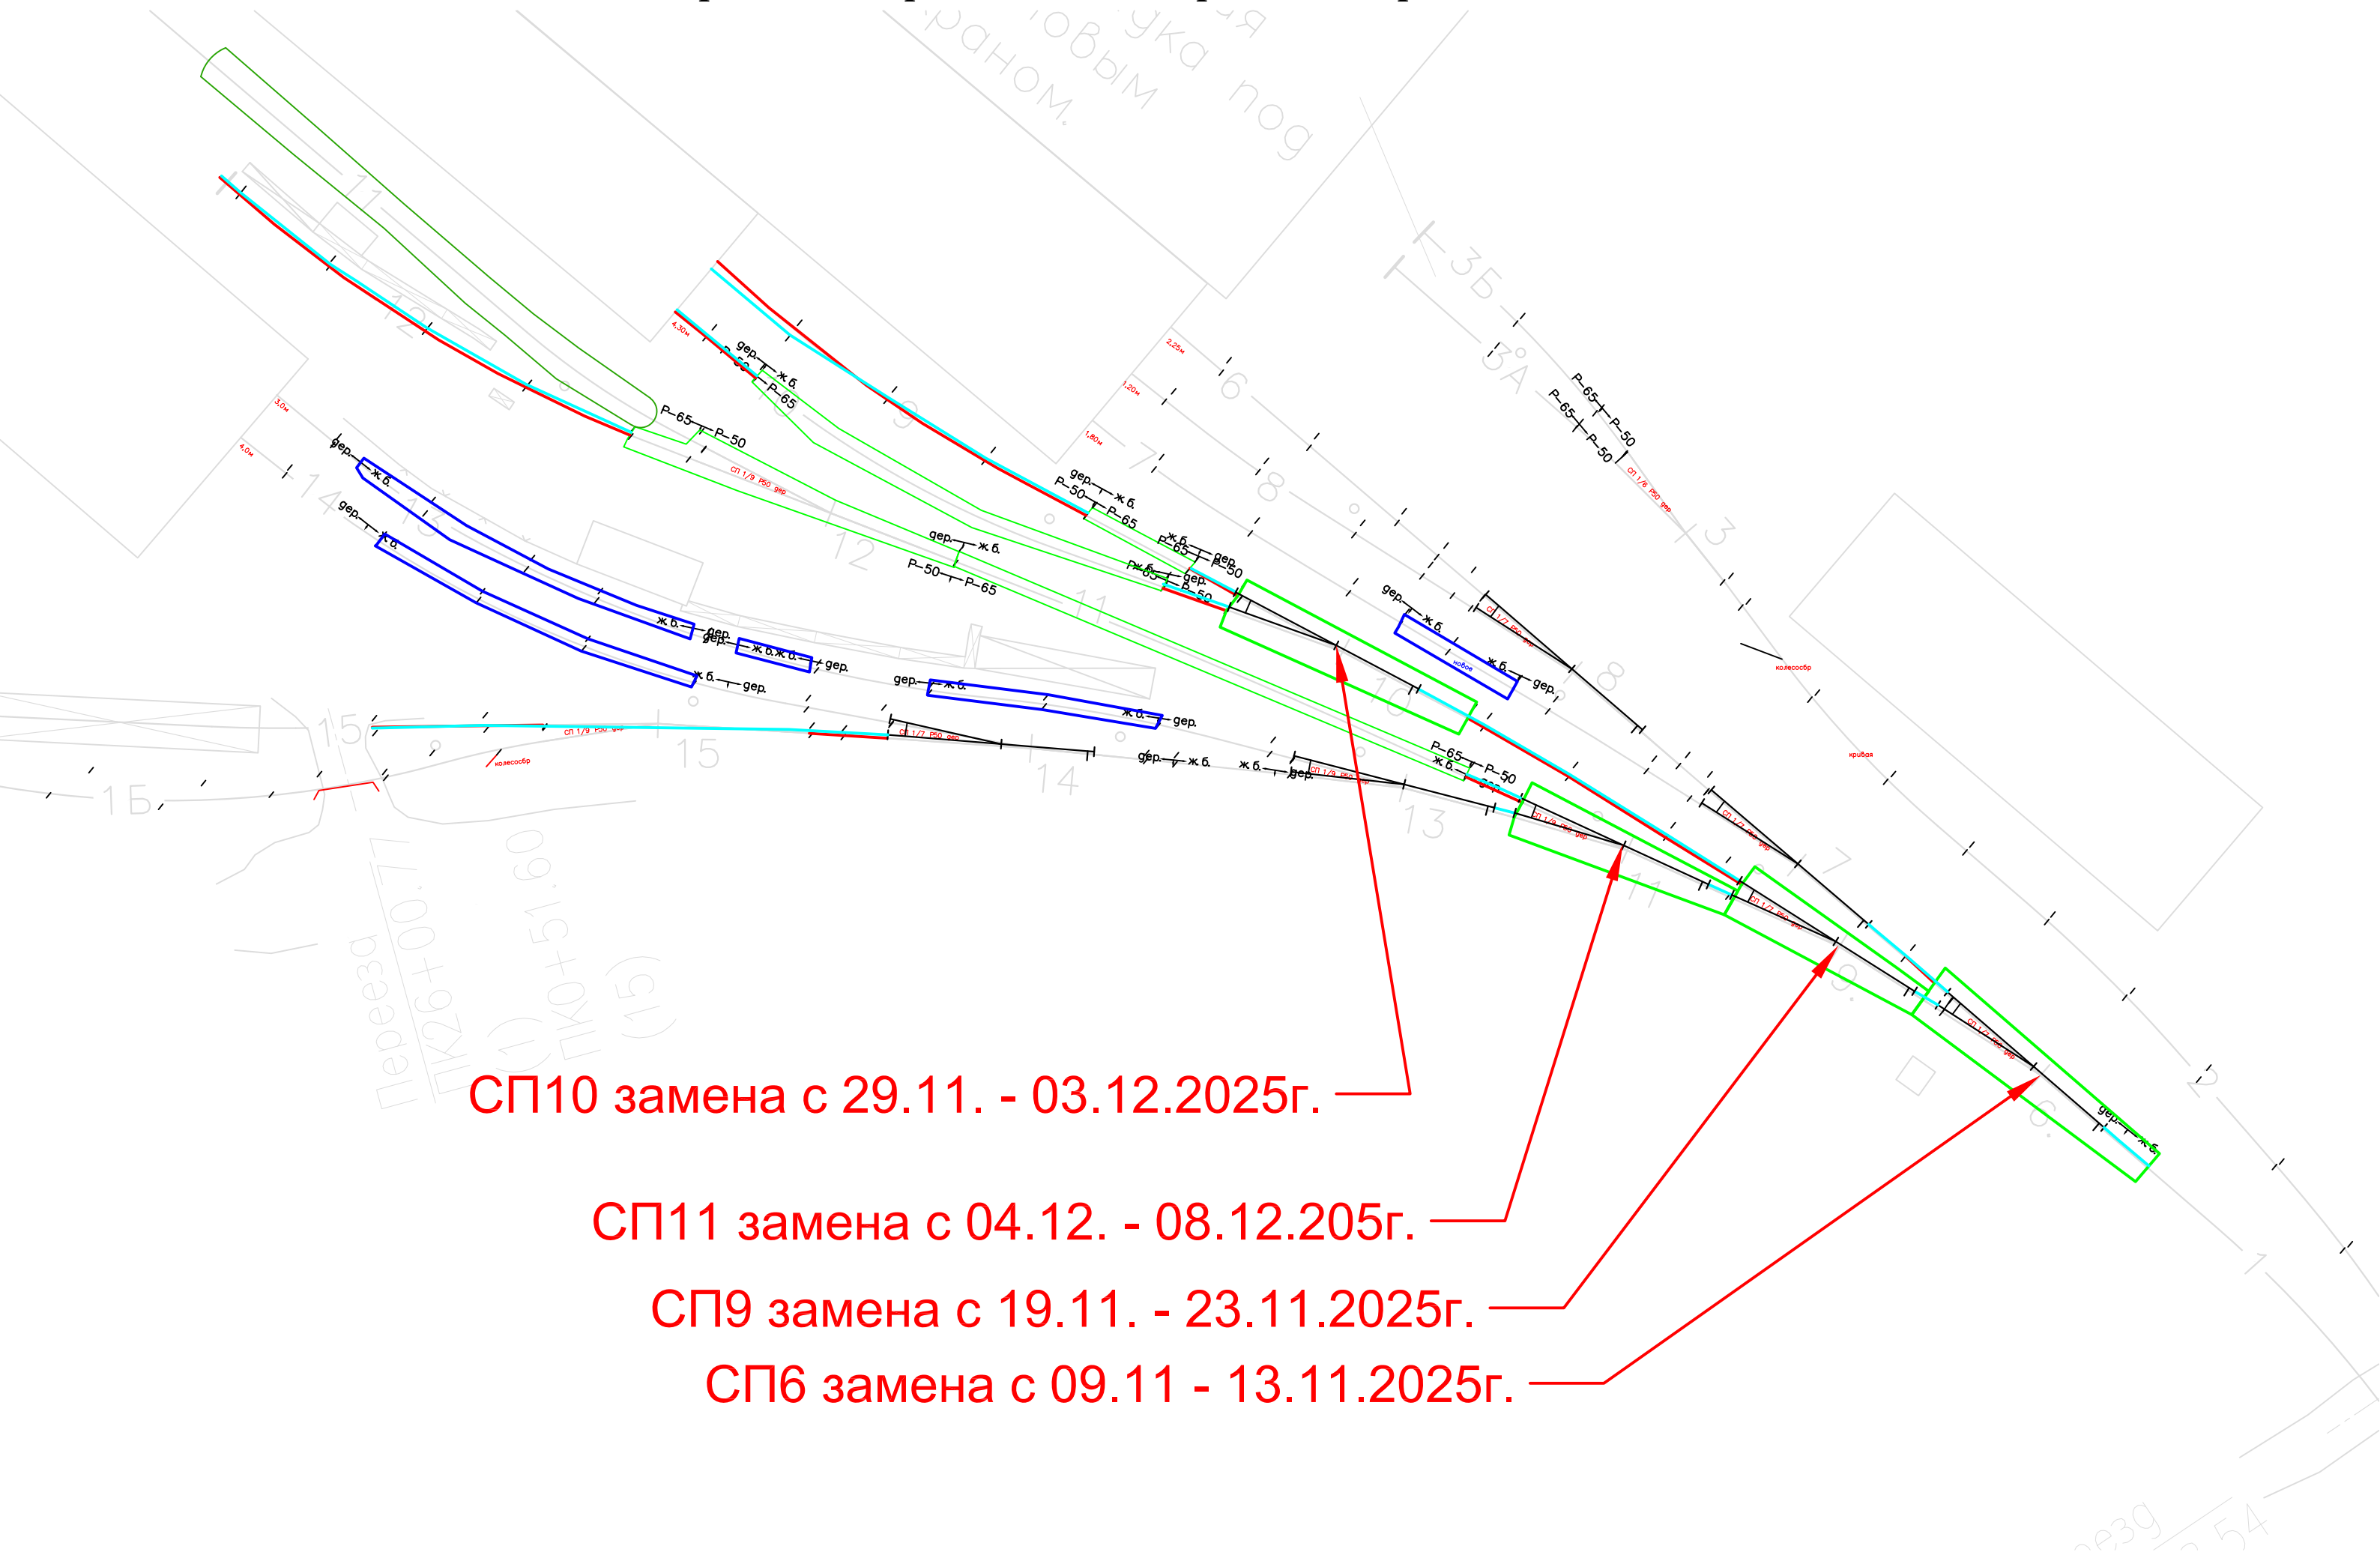

СП10 замена с 29.11. - 03.12.2025г.

СП11 замена с 04.12. - 08.12.205г.

СП9 замена с 19.11. - 23.11.2025г.

СП6 замена с 09.11 - 13.11.2025г.

Выполнение работ по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"									
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание					
1	Ж/д пути, расположенные по адресу: Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные	76 дней	Вт 14.10.25	Вс 28.12.25					
2	Оформление БГ	0 дней	Вт 14.10.25	Вт 14.10.25					
3	Получение аванса	0 дней	Чт 16.10.25	Чт 16.10.25					
4	Закупка материалов	22 дней	Пт 17.10.25	Пт 07.11.25					
5	Композитный брус	22 дней	Пт 17.10.25	Пт 07.11.25					
6	Ж/Б шпалы	10 дней	Ср 29.10.25	Пт 07.11.25					
7	Рельсы	10 дней	Ср 29.10.25	Пт 07.11.25					
8	Накладки и крепёж	10 дней	Ср 29.10.25	Пт 07.11.25					
9	Стрелочные переводы	10 дней	Ср 29.10.25	Пт 07.11.25					
10	Мобилизация	5 дней	Пт 31.10.25	Вт 04.11.25					
11	Мобилизация	5 дней	Пт 31.10.25	Вт 04.11.25					
12	График окон для выполнения работ	30 дней	Вс 09.11.25	Пн 08.12.25					
13	Полное закрытие движения от СП2 по пути №1 - СП6	5 дней	Вс 09.11.25	Чт 13.11.25					
14	Открытие движения от СП2 по пути №1	5 дней	Пт 14.11.25	Вт 18.11.25					
15	Полное закрытие движения от СП2 по пути №1 - СП9	5 дней	Ср 19.11.25	Вс 23.11.25					
16	Открытие движения от СП2 по пути №1	5 дней	Пн 24.11.25	Пт 28.11.25					
17	Закрытие движения от СП9 по направлению к путям №9,10 - СП10	5 дней	Сб 29.11.25	Ср 03.12.25					
18	Закрытие движения от СП9 по направлению к путям № 1,11,12,13,14 - СП11	5 дней	Чт 04.12.25	Пн 08.12.25					
19	Работы по замене стрелочных переводов	30 дней	Вс 09.11.25	Пн 08.12.25					
20	Стрелочный перевод №6	5 дней	Вс 09.11.25	Чт 13.11.25					
21	Стрелочный перевод №9	5 дней	Ср 19.11.25	Вс 23.11.25					
22	Стрелочный перевод №10	5 дней	Сб 29.11.25	Ср 03.12.25					
23	Стрелочный перевод №11	5 дней	Чт 04.12.25	Пн 08.12.25					
24	Замена существующего пути	45 дней	Пт 14.11.25	Вс 28.12.25					
25	замена участка пути 25м	5 дней	Пт 14.11.25	Вт 18.11.25					
26	замена участка пути 25м	5 дней	Пн 24.11.25	Пт 28.11.25					
27	замена участка пути 100м	20 дней	Вт 09.12.25	Вс 28.12.25					
