


Календарный график реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском порту
Усть-Луга. Береговые объекты»

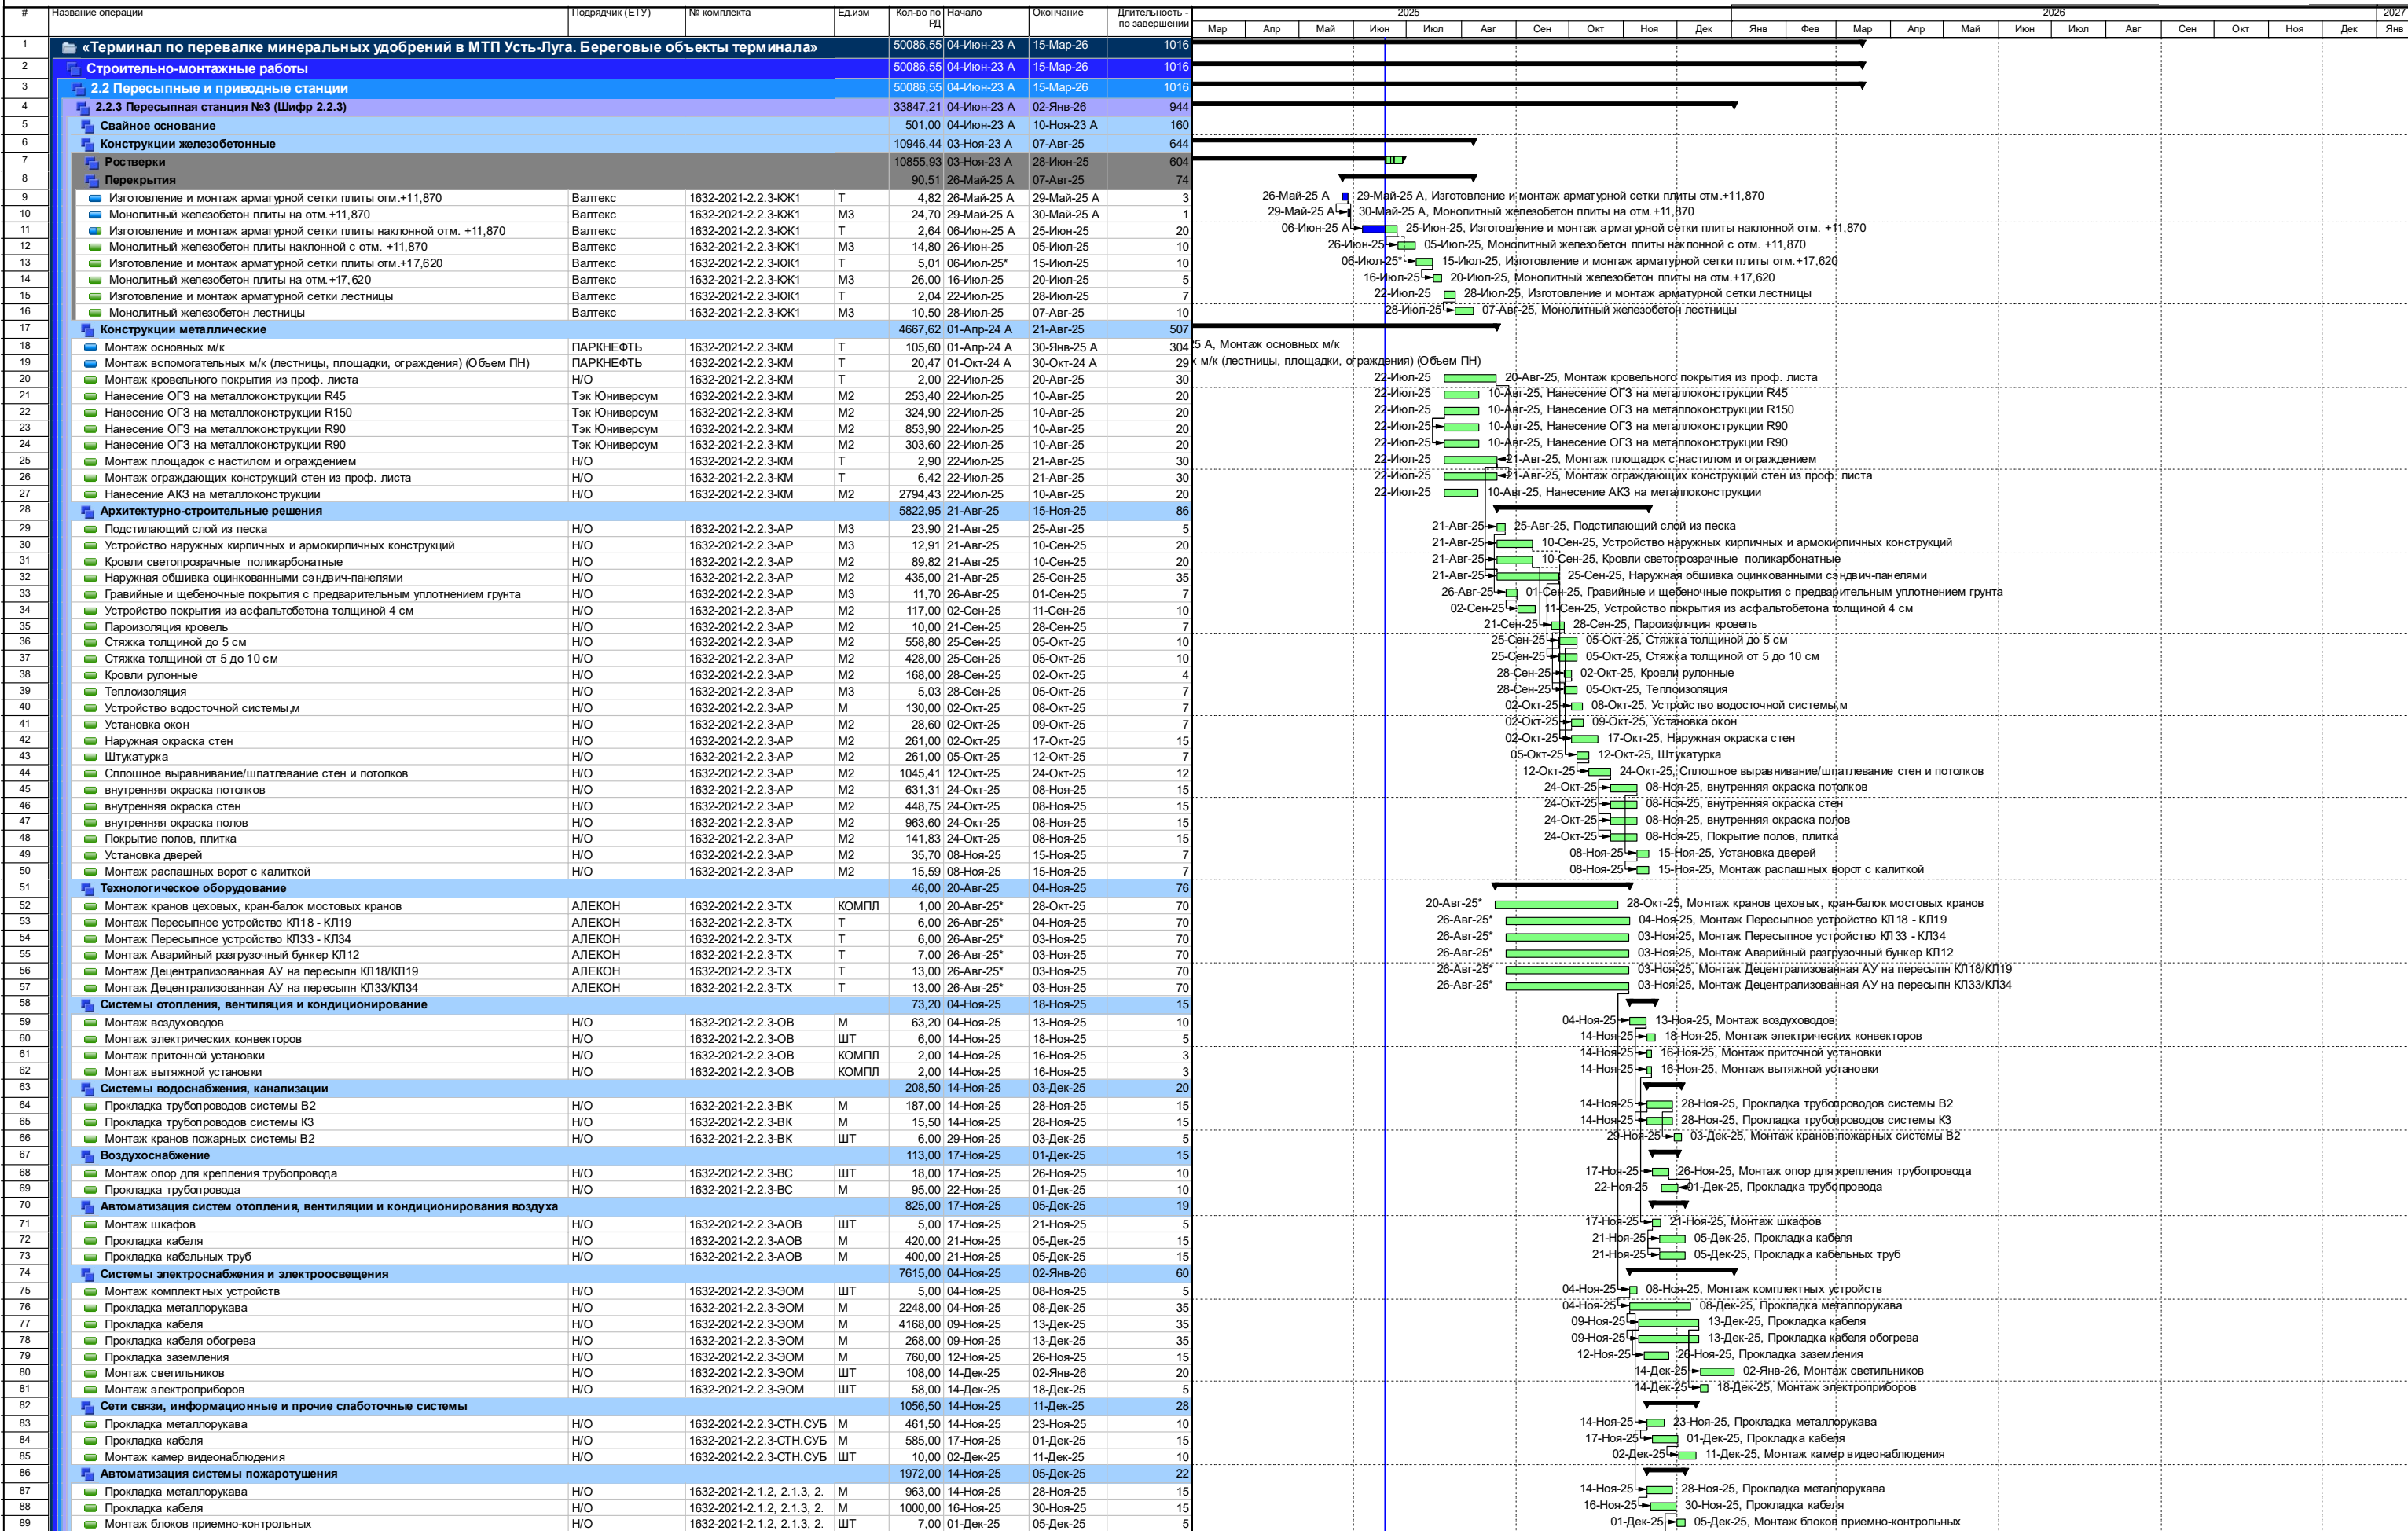

#	Название операции	Подрядчик (ЕТУ)	№ комплекта	Едизм	Кол-во по ПД	Начало	Окончание	Длительность - по завершению	2025												2026												2027
									Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв		
90	■ Монтаж шкафов пожарных	Н/О	1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.	ШТ	2,00	01-Дек-25	04-Дек-25	4																									
91	■ 2.2.7 Приводная станция (ПрС) (Шифр 2.2.7)				16239,34	30-Окт-24 А	15-Мар-26	502																									
92	■ Свайное основание				269,80	30-Окт-24 А	30-Апр-25 А	182																									
93	■ Конструкции железобетонные				2999,08	04-Мар-25 А	09-Окт-25	220																									
94	■ Фундаменты, ростверки				2976,88	04-Мар-25 А	23-Июн-25	112																									
95	■ Механизированные работы по выемке грунта	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	757,60	04-Мар-25 А	09-Мар-25 А	5																									
96	■ Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	Т	1393,90	09-Мар-25 А	14-Мар-25 А	5																									
97	■ Бетонная подготовка/Тощий бетон	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	10,67	15-Мар-25 А	19-Мар-25 А	4																									
98	■ Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00)	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	Т	2,98	19-Мар-25 А	22-Мар-25 А	3																									
99	■ Монолитный железобетон ростверки	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	54,10	23-Мар-25 А	25-Апр-25 А	33																									
100	■ Бетонная подготовка плиты на отм. - 0,050	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	23,70	01-Апр-25 А	15-Апр-25 А	14																									
101	■ Изготовление и монтаж арматурных каркасов плиты на отм. - 0,050	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	8,09	01-Апр-25 А	22-Апр-25 А	21																									
102	■ Монолитный железобетон плиты на отм. - 0,050	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	104,89	14-Апр-25 А	25-Май-25 А	41																									
103	■ Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	545,20	28-Апр-25 А	15-Май-25 А	17																									
104	■ Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	60,60	28-Апр-25 А	23-Июн-25	57																									
105	■ Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен цоколя	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	0,37	19-Июн-25	19-Июн-25	1																									
106	■ Монолитный железобетон стен цоколя	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	6,30	20-Июн-25	20-Июн-25	1																									
107	■ Изготовление и монтаж арматурных каркасов плиты вход. площадки и пандусов	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	0,45	21-Июн-25*	21-Июн-25	1																									
108	■ Бетонная подготовка плиты вход. площадки и пандусов	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	2,60	22-Июн-25	22-Июн-25	1																									
109	■ Монолитный железобетон плиты вход. площадки и пандусов	Эра Констракшн	1632-2021-2.2.7-ЮК02	М3	5,43	23-Июн-25	23-Июн-25	1																									
110	■ Перекрытия				22,20	23-Сен-25	09-Окт-25	17																									
111	■ Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00)	Н/О	1632-2021-2.2.7-ЮК1	Т	4,00	23-Сен-25	29-Сен-25	7																									
112	■ Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий	Н/О	1632-2021-2.2.7-ЮК1	М3	18,20	30-Сен-25	09-Окт-25	10																									
113	■ Конструкции металлические				1342,10	25-Июл-25	22-Сен-25	60																									
114	■ Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте	Н/О	1632-2021-2.2.7-КМ	Т	69,40	25-Июл-25*	07-Сен-25	45																									
115	■ Монтаж сплошного настила	Н/О	1632-2021-2.2.7-КМ	Т	2,20	08-Сен-25	22-Сен-25	15																									
116	■ Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45	Н/О	1632-2021-2.2.7-КМ-ПОЗ	М2	1259,80	08-Сен-25	22-Сен-25	15																									
117	■ Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения)	Н/О	1632-2021-2.2.7-КМ	Т	10,70	08-Сен-25	22-Сен-25	15																									
118	■ Архитектурно-строительные решения				2814,56	08-Сен-25	16-Ноя-25	70																									
119	■ Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными	Н/О	1632-2021-2.2.7-АР	М2	445,90	08-Сен-25	02-Окт-25	25																									
120	■ Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями	Н/О	1632-2021-2.2.7-АР	М2	278,00	08-Сен-25	02-Окт-25	25																									
121	■ Кровли светопрозрачные поликарбонатные	Н/О	1632-2021-2.2.7-АР	М2	30,20	03-Окт-25	27-Окт-25	25																									
122	■ Кровельное покрытие профлистом	Н/О	1632-2021-2.2.7-АР	М2	132,00	03-Окт-25	27-Окт																										
