

Исх № 149-К от 21.03.2024г.

Руководителю проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагину И.Н.

КОПИЯ:
Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»
Колдашову С.А.

О письмах по дополнительным работам пути 417 цеха

Уважаемый Илья Николаевич!

В рамках пункта 2.5 протокола рабочего совещания №240315 от 15.03.2024г. направляем пакет писем о согласовании выполнения работ в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Приложения:

1. №027-К от 01.08.2023 о доп. работах цех 121
2. №046-К от 28.08.2023 о доп. работах водопровод В1 на участке В1-1-В1-1А и В1-30-В1-31
3. №047-К от 28.08.2023 о замене материалов ТС2, ТС3
4. №056-К от 01.09.2023 об устройстве подпорной стены в зоне трансбордера
5. №049-К от 29.08.2023 о согласовании RAL сэндвич-панелей цех 121/18
6. №054-К от 01.09.2023 о реконструкции узла водопровода на участке В1-30-В1-31
7. №051-К от 30.08.2023 о доп. работах по восстановлению пути №19
8. №060-К от 05.09.2023 об опорах контактной сети
9. №058-К от 04.09.2023 о продлении подпорной стены трансбордера
10. №025-К от 31.07.2023 о согласовании замены марки светильников 8 цеха
11. №028-К от 02.08.2023 о изменении трассы по разделу 131-21-ЭС2

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

Исх. № 027-К от 01.08.2023г.

**Заместителю директора
по эксплуатации БПД и АУ
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"**

Суханову Я. И.

Копия

Техническому директору

АО «Метровагонмаш»

Гафурову А.А.

О дополнительных работах ц. 121

Уважаемый Ярослав Игоревич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы рамках договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

В связи с производственной необходимостью и по инициативе Заказчика просим согласовать выполнение работ по переустройству трассы электроснабжения в цеху №121 путем прокладки кабеля по внутренней стороне соседнего цеха (Приложение №1.Схема прокладки).

Так же просим согласовать выполнение следующих работ, не предусмотренных договором:

- Снятие люминесцентных ламп перед началом демонтажа здания;
- Переустройство хозяйственного водопровода (В1) по временной схеме (Приложение №2.);
- Прокладка кабельной трассы питания кран-балки цеха 121/18.

Согласовано
З.А.Д.

[Подпись]
03.08.2023г.


Я.И. Суханов

Руководитель проекта

[Подпись]

Шевчук К.А.

По указанию Заказчика
[Подпись]
Игоревич М.

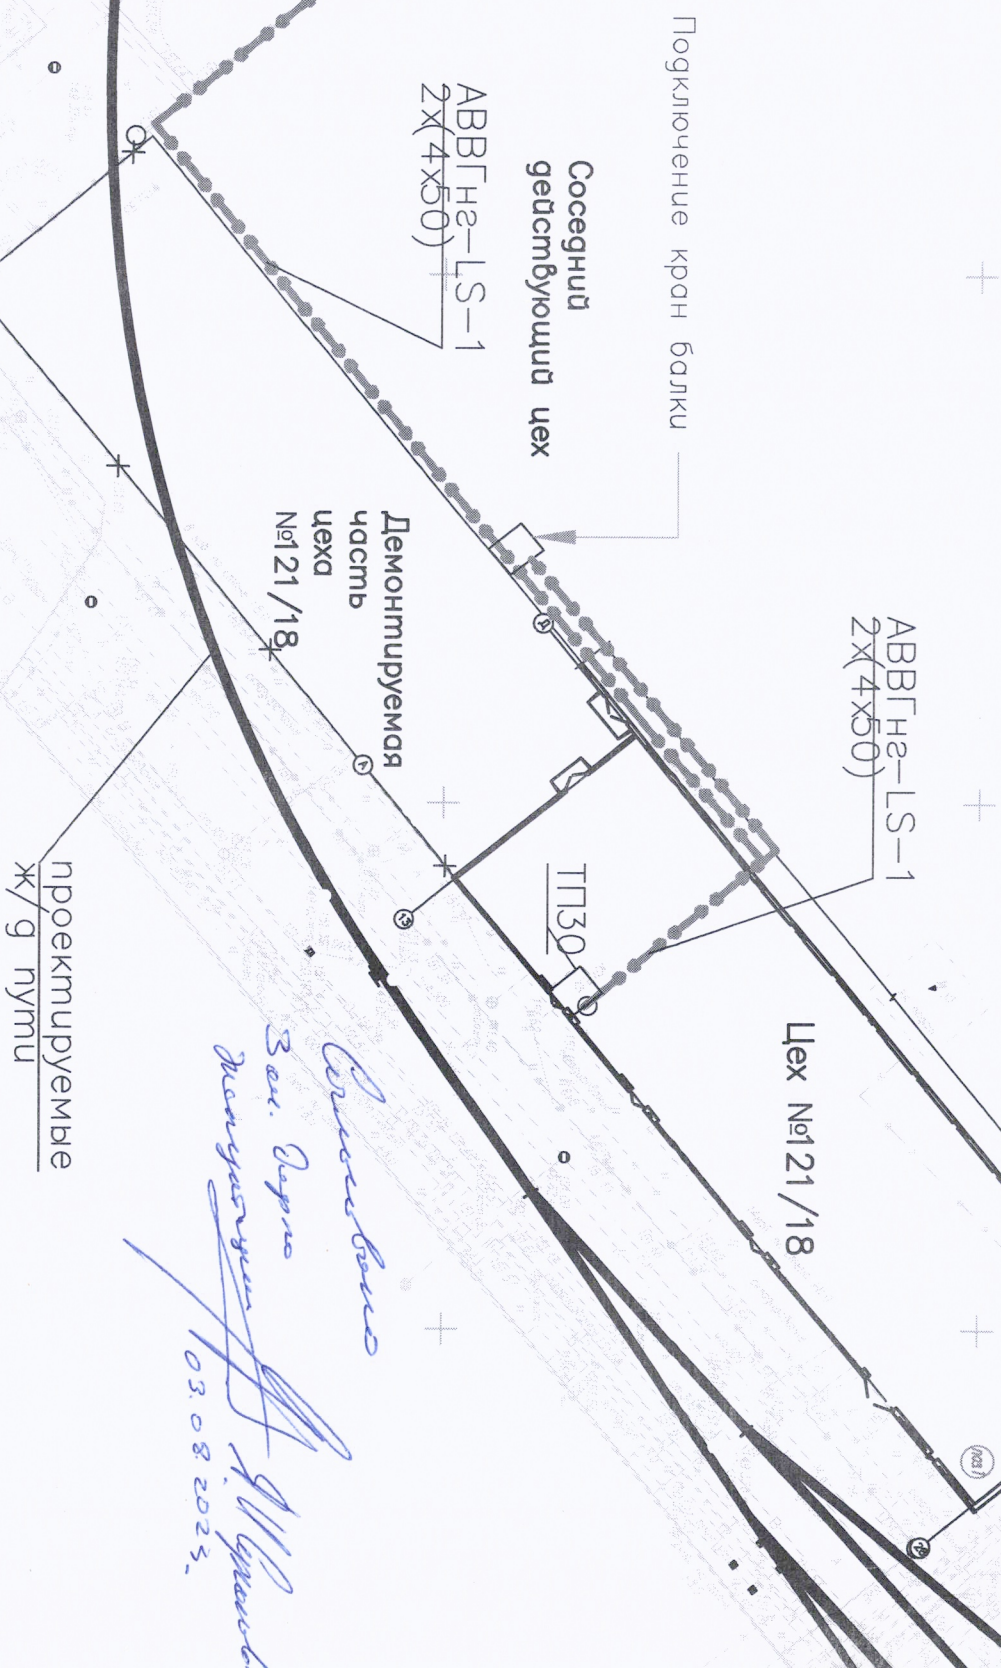

См. чертёж

Исполнитель

10.08.2023.

Исх № 046-К от 28.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О дополнительных работах водопровод (В1) на участке В1-1 – В1-1А


Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

При переустройстве хозяйственного водопровода (В1) на участках В1-1 – В1-1А и В1-30 – В1-31 в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ» просим согласовать следующие отступления от проектного решения не предусмотренные Договором:


1. Переустройство колодцев В1-1 и В1-30 путем устройства камеры из блока ФБС 9-3-6 (схема приложение №1);
2. Трассировку прохождения участка В1-1 – В1-1А в районе подвального помещения склада по просьбе Заказчика выполнить по потолку с креплением в ребра жесткости плит хомутом из оцинкованной стали на анкерные болты. (схема Приложение №2);
3. По просьбе Заказчика дополнительно выполнить переустройство участка водопровода от колодца В1-1 до здания гаража с заводом в здание на стену ввиду ненадлежащего состояния существующей трубы.


С уважением,

Руководитель проекта






Шевчук К.А.

Гл. инженер  Г.И. Беляев

Согласовано  А.Р. Воронин

1-1

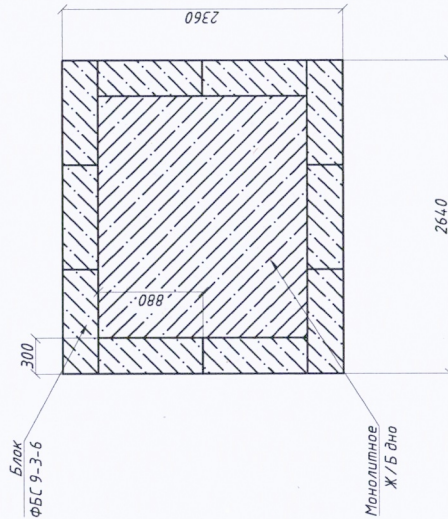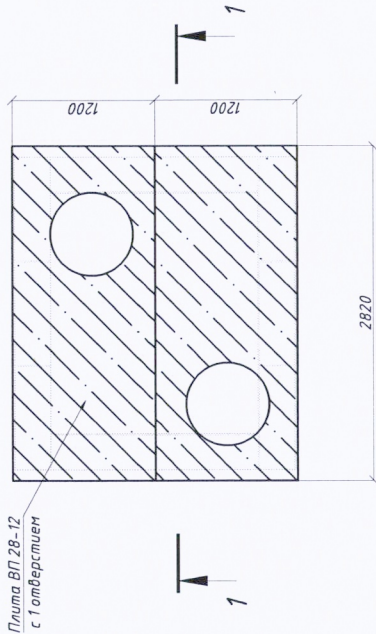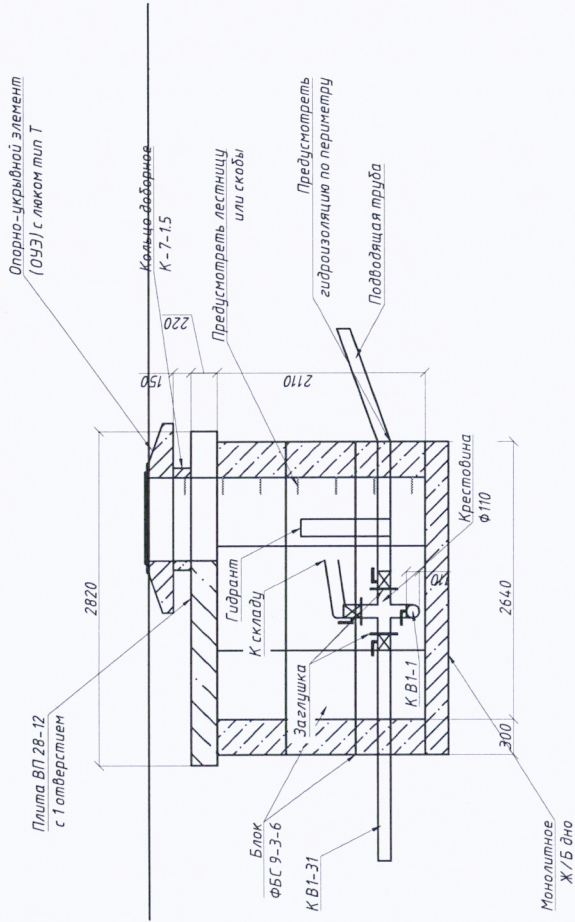

Согласовано
Гл. инженером

Лист	
1	

Приложение №1

Формат А4

Согласовано	Инв. № подл		Подпись и дата		Взам инв №	

Исх № 047-К от 28.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О замене материалов ТС2, ТС3

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

В целях сокращения сроков строительства и сроков перекрытия дорог на участках строительства тепловой сети от т.1 до т.2 (Рабочая документация. Переустройство трубопровода. Шифр 131-23-ТС2) и на участках строительства тепловой сети от т.1 до т.2, от 5 до т.6 (Рабочая документация. Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. Шифр 131-23-ТС3) в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ» прошу Вас согласовать замену устройства монолитных ЖБ каналов на устройство каналов из сборных ЖБ изделий по серии 3.006.1-2.87.

Для исключения возможных просадок каналов от вибрации железнодорожного и автомобильного транспорта, предлагаем применить ЖБ плиту основания толщиной 200мм, аналогично принятому решению на участках с бесканальной прокладкой трубопроводов.

Ведомость изменений прилагается

Приложения:

1. Ведомость предлагаемых изменений проектных решений по ТС-2
2. Ведомость предлагаемых изменений проектных решений по ТС-3

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.

Согласовано *Сергей* *А.А.*
Зам. дир *по эксплуатации* *Суханов Я.И.*
Согласовано *Гл. инженер* *Белозер С.Н.*
30.08.2023

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 056-К от 01.09.2023г.

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

Об устройстве подпорной стены в зоне трансбордера

Уважаемый Ярослав Игоревич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Настоящим сообщаем, что при разработке грунта для переустройства трансбордера был обнаружен коллектор, попадающий в зону производства работ. Просим согласовать узел прохождения подпорной стены трансбордера по обнаруженному коллектору и выполнение данных работ, не предусмотренных договором.

Приложение №1. Схема устройства подпорной стены в зоне коллектора.

Согласовано
Зам. Директора
по эксплуатации



С уважением,

Руководитель проекта

[Подпись] *Я.И. Суханов.*
[Подпись]

Шевчук К.А.

Согласовано
[Подпись] *А.В. Вершинин*

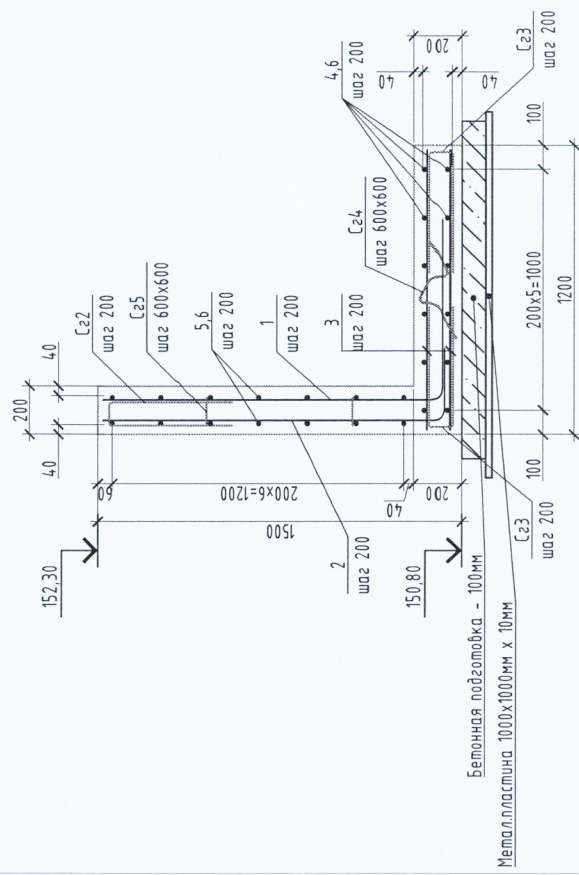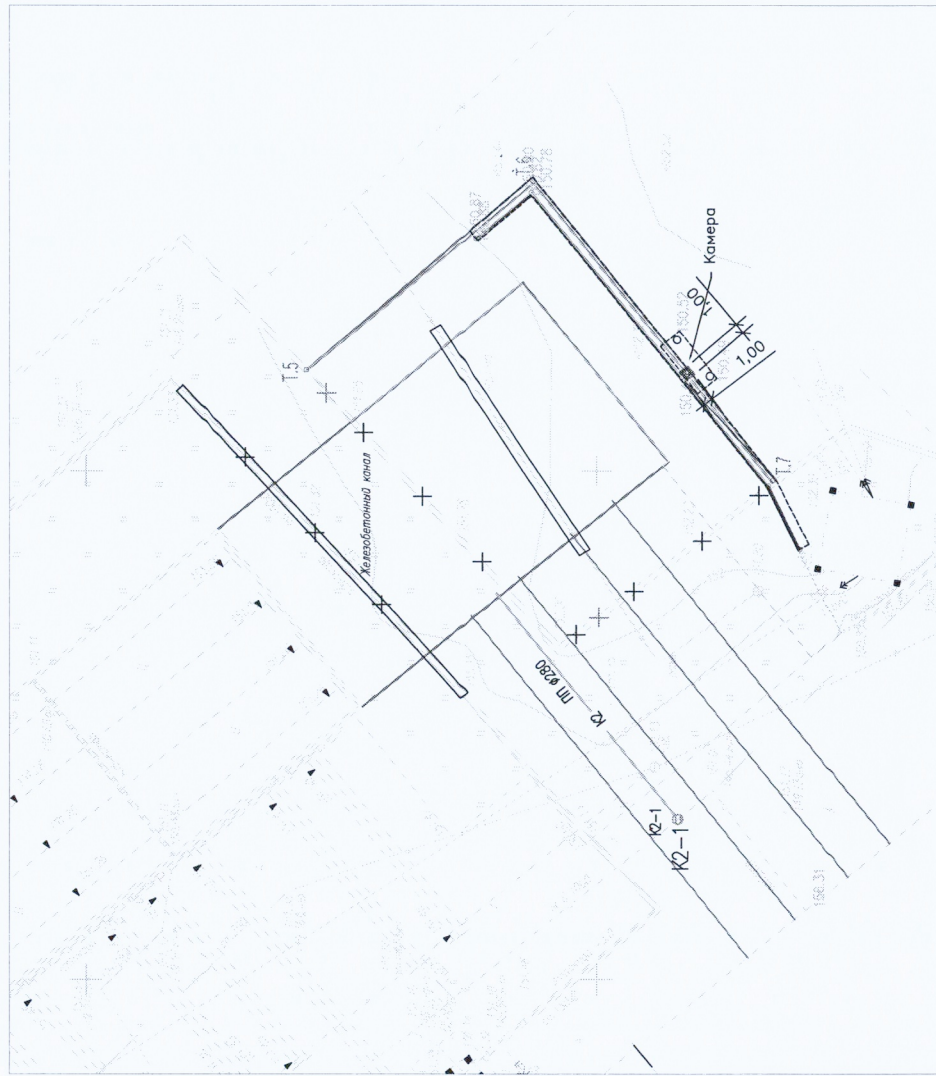

Власовано

Сергеев АС

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 049-К от 29.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О согласовании RAL сэндвич - панелей цех 121/18

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим согласовать RAL 9003 белый сэндвич-панелей, используемых при устройстве стены цеха 121/18 после демонтажных работ.

Согласовано

*Зам. Дир.
по эксплуатации*

Суванов Я.И.
30.08.2023

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 054-К от 01.09.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О реконструкции узла водопровода на участке В1-30 – В1-31

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по переустройству хозяйственного водопровода (В1) на участках В1-1 – В1-1А и В1-30 – В1-31 в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Ввиду неудовлетворительного состояния узла водопровода (В1) в колодцах В1-1А и В1-30 в связи с большим сроком эксплуатации и старостью материалов невозможно выполнить врезку новых укладываемых труб без реконструкции внутренних элементов. Просим согласовать проведение дополнительных работ по данному узлу согласно приложенной схемы (приложение №1. Схема переустройства узла колодцев В1-1А и В1-30).

Согласовано
Зам. Директора
по эксплуатации

С уважением,

Руководитель проекта



Суханов Я.И.
Шевчук К.А.

Шевчук К.А.

Необходимость доп. работ
подтверждена

Вержбицкий АС

Камера

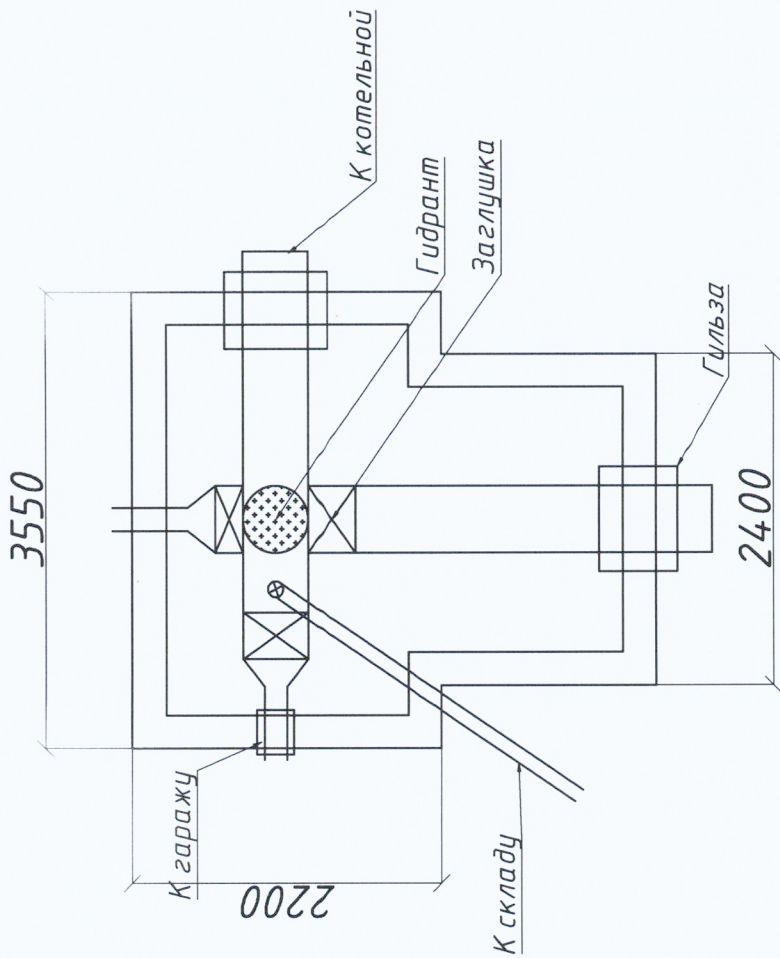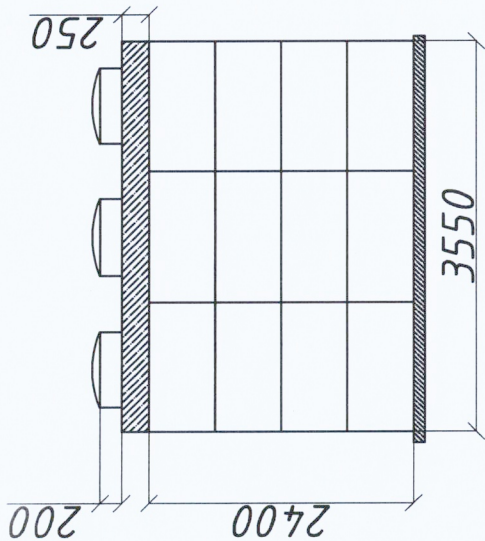

Согласовано:
Г.А. Мухоморов

Приложение №1				Лист	
				1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Формат А4

Согласовано	Инв. № подл		Подпись и дата		Взам инв №	

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 051-К от 30.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О дополнительных работах по восстановлению пути №19

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Согласно рабочей документации раздел 131-23-ПЖ Железнодорожные пути были выполнены работы по демонтажу пути №19. В ходе производства работ со стороны Заказчика поступила просьба восстановить участок демонтированного пути для осуществления производственных процессов АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим согласовать выполнение работ по восстановлению участка пути №19 в районе пересечения с путем №31 ПК 3 так как данные работы не предусмотрены договором.

Приложение №1. Схема участка восстановления пути.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

Сотников


*Зам. Директора
по эксплуатации*



Сурянов Л.Ч.

*По указанию Заказчика
Вертайко АС*

Участок восстановления пути после демонтажа

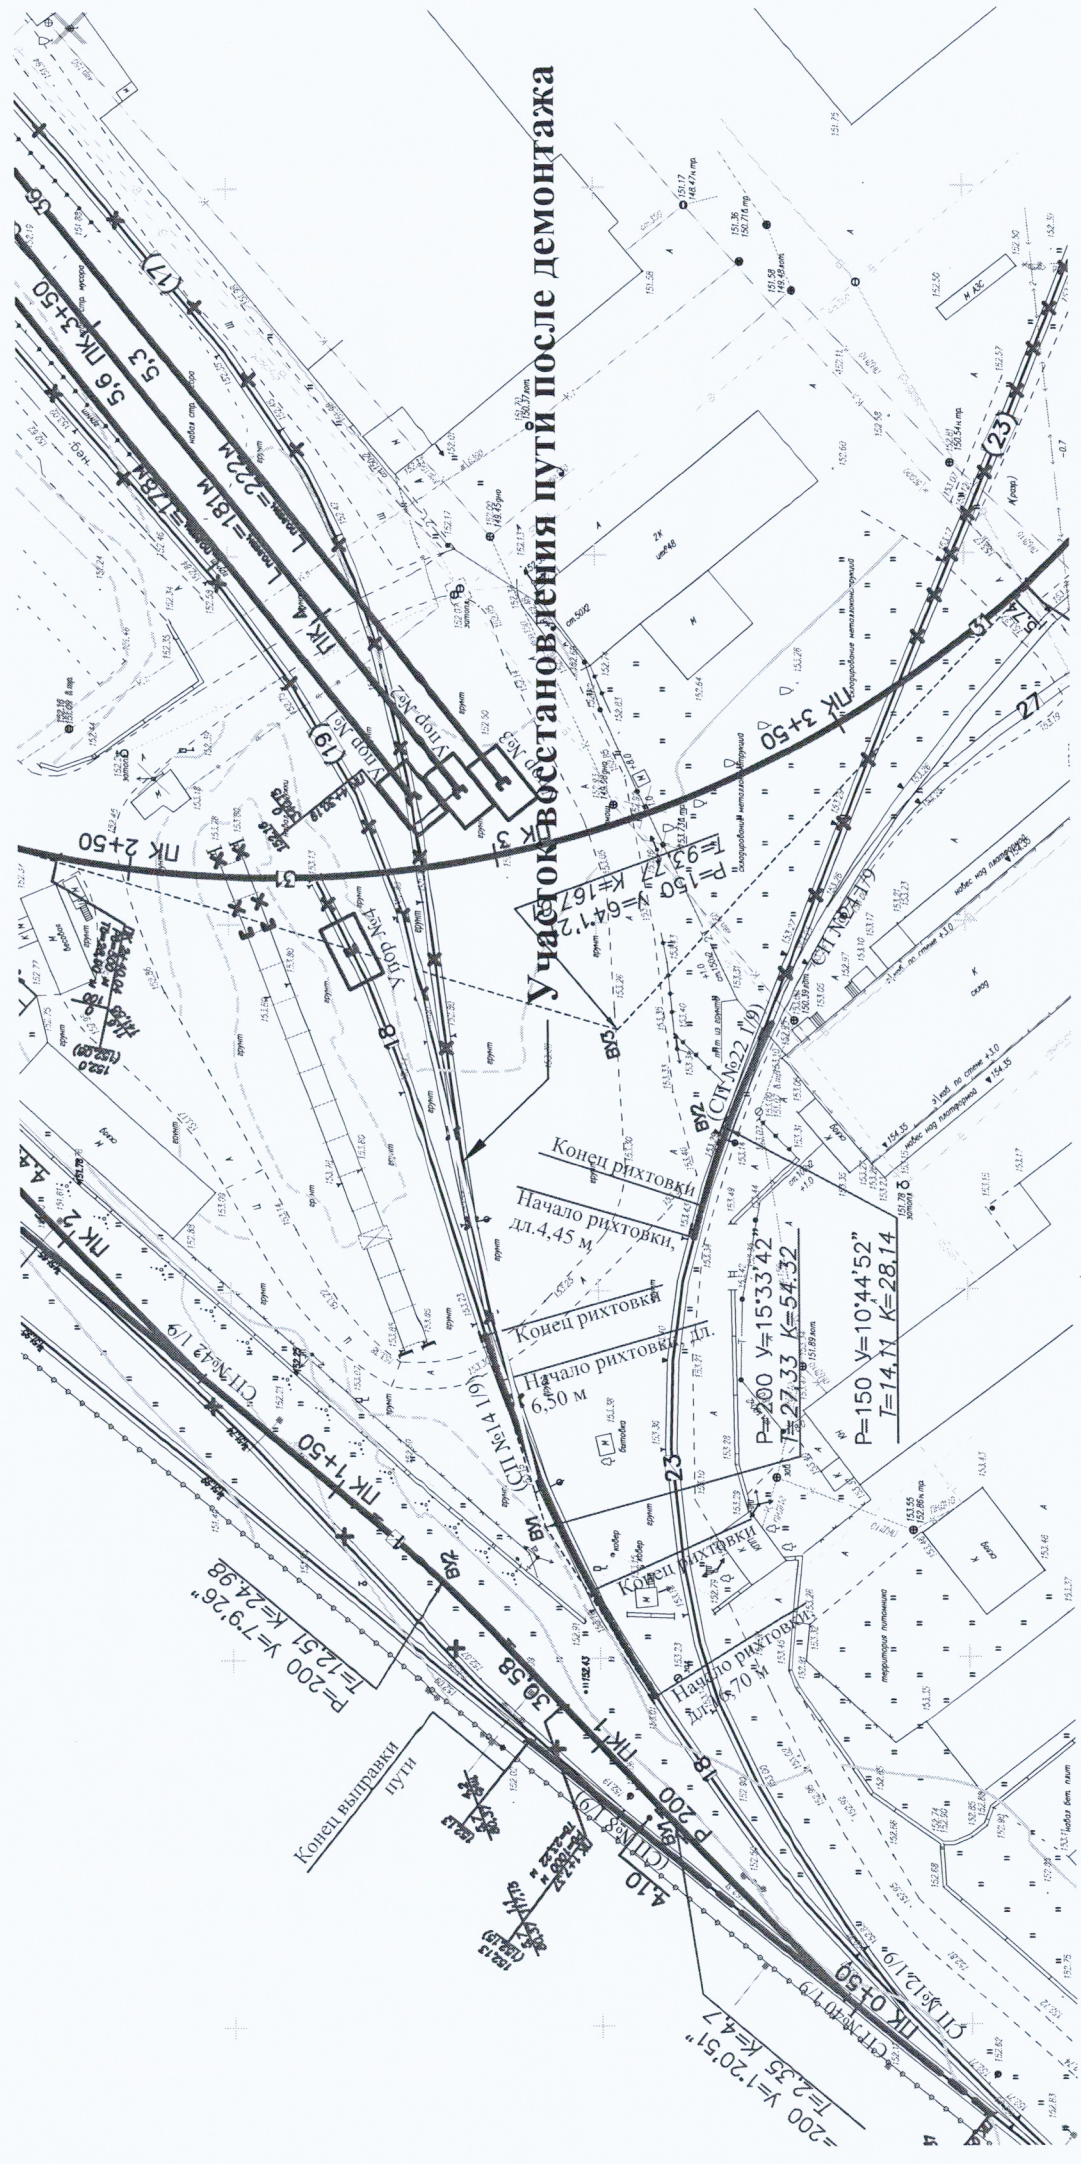

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 060-К от 05.09.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

Об опорах контактной сети

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

В связи с загруженностью профильных заводов и долгим сроком производства опор контактной сети в рамках проекта «шифр 132-23-КС» по переустройству контактной сети прошу, в целях ускорения производства работ, допустить использование стоек МШП-12-150 и МШК1-12-100 со складов ОАО «РЖД» выпуска 2017-2020 гг. с сохранением гарантии и предоставлением всех необходимых сертификатов.

Согласовано
Зам. Директора
по эксплуатации

С уважением,

Руководитель проекта

[Подписи]

Шевчук К.А.

Согласовано
Верный АР

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 058-К от 04.09.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О продлении подпорной стены трансбордера

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим согласовать выполнение работ по удлинению подпорной стены переустройства трансбордера трансбордера согласно схеме (Приложение №1). Данные работы не входят в состав проекта 131-23-АС2 и не предусмотрены договором.

Приложения:

1. Приложение №1. Схема устройства подпорной стены трансбордера.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх № 025-К от 31.07.2023г.

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О согласовании замены марки светильников 8 цеха

Уважаемый Ярослав Игоревич


В рамках подготовки к поставке материалов и строительно-монтажным работам по титулу «цех №8 расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. капитальный ремонт», в целях улучшения эксплуатационных показателей оборудования, просим Вас согласовать замену светильников марки «Vartop» на марку «TERRA».

К настоящему письму прилагаем сравнительную таблицу характеристик вышеуказанного оборудования.

Приложение 1 - Технические характеристики с отличиями систем на 1 л.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

Суханов Я.И.

*Зам. Директора
по эксплуатации*



КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65
Тел.: (495) 915-24-71
Факс: (495) 915-24-71

Исх. № 028-К от «02» августа 2023г.

Заместителю директора
по эксплуатации БПД и АУ
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
Суханову Я. И.
Копия
Техническому директору
АО «Метровагонмаш»
Гафурову А.А.

О изменении трассы по разделу 131-21-ЭС2

Уважаемый Ярослав Игоревич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы рамках договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

В связи с производственной необходимостью и по инициативе Заказчика просим согласовать выполнение работ по переустройству кабельных линий участка точек 9-10-11-12 в рамках раздела рабочей документации 131-23-ЭС2 по измененной схеме (Приложение №1.Схема прокладки).

*Трассы согласно приложенной схеме
согласованы. Кабель применить АВББШВ 4х95
в две нити.*

*Зам. Директора
по эксплуатации*

Я. И. Суханов
03.08.2023г.

Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Шевчук К.А.

По указанию Заказчика
Сергей Ю

2 x AB55WB 4x95.

Справ. А.У.

