

Исх № 140-К от 11.03.2024г.

Начальнику отдела
технологической подготовки производства
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Кирильченко Е.С.

КОПИЯ

Руководителю проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагину И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

О согласовании раздвижных ворот цех 8

Уважаемый Евгений Сергеевич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Просим согласовать конструктив и габаритные размеры планируемых к монтажу раздвижных ворот в перегородке из сэндвич-панелей (приложение №1. Схемы раздвижных ворот) в осях 7-9 согласно разделу 130-23-АС2 рабочей документации.


С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.


Приложение №1. Схема раздвижных ворот в осях 7-9.

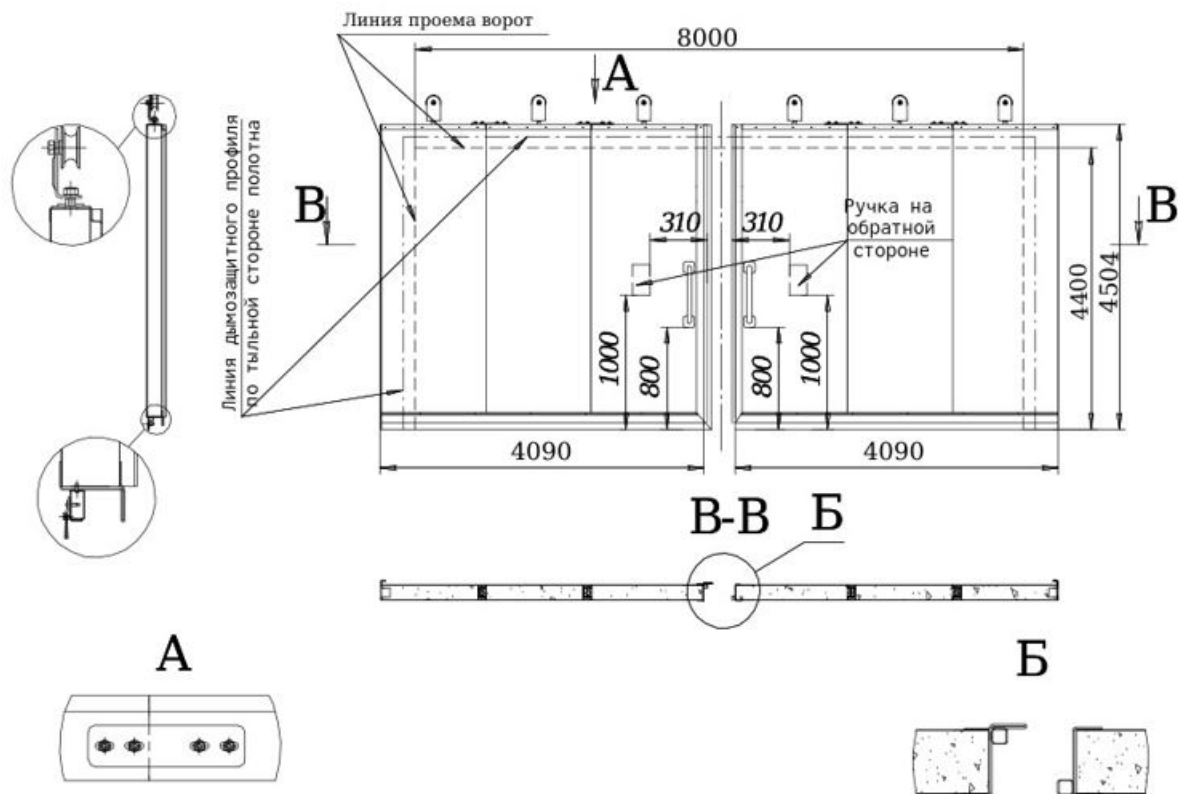

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI60


Цвет снаружи	RAL 7004
Цвет внутри	RAL 7004
Цвет окантовки	RAL 7004
Тип краски окантовки	ГЛЯНЦЕВАЯ
Тип поверхности окантовки	ШАГРЕНЬ

Основные монтажные размеры

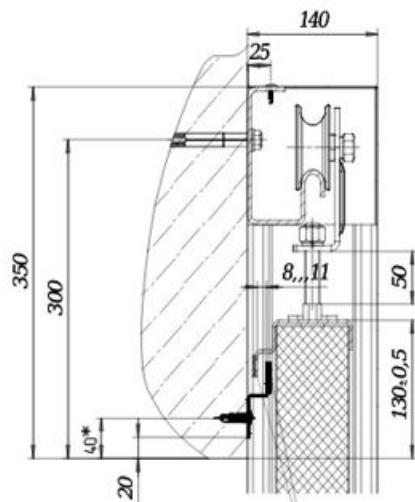

Лента терморасширяющаяся
30x20x1,5


Схема расположения
нижних роликов

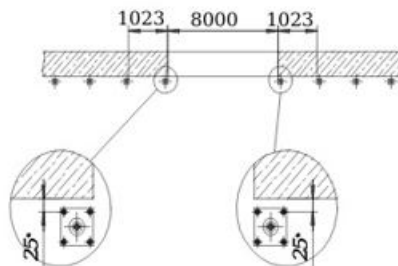

Зацепление панелей




Установка вертикального
ДЗ профиля

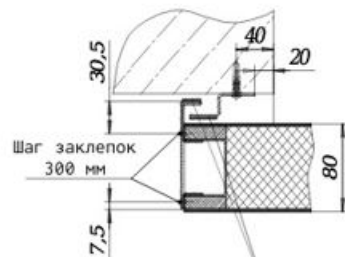

Лента терморасширяющаяся 30x20x1,5

Крепление
нижних роликов



Лента терморасширяющаяся
30x20x1,5



Лента терморасширяющаяся
30x20x1,5



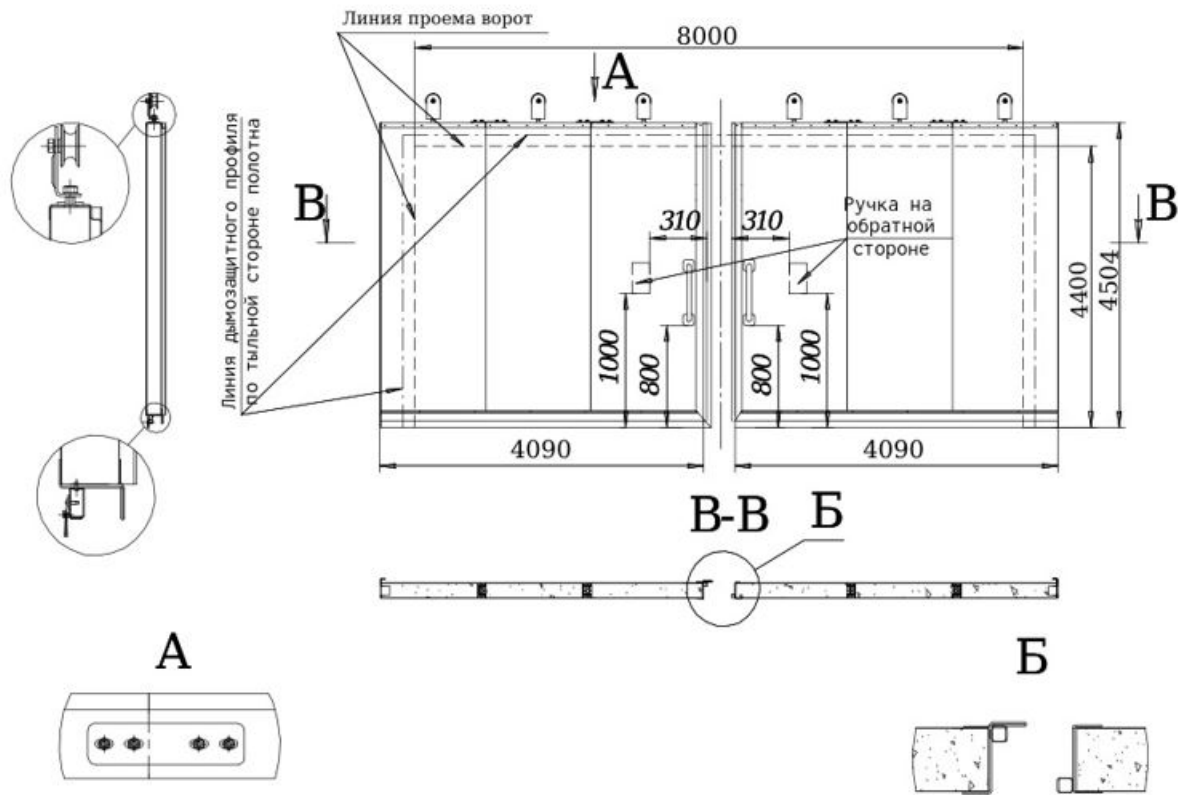


Схема установки балки направляющей (прямой)
на проем



Установка привода

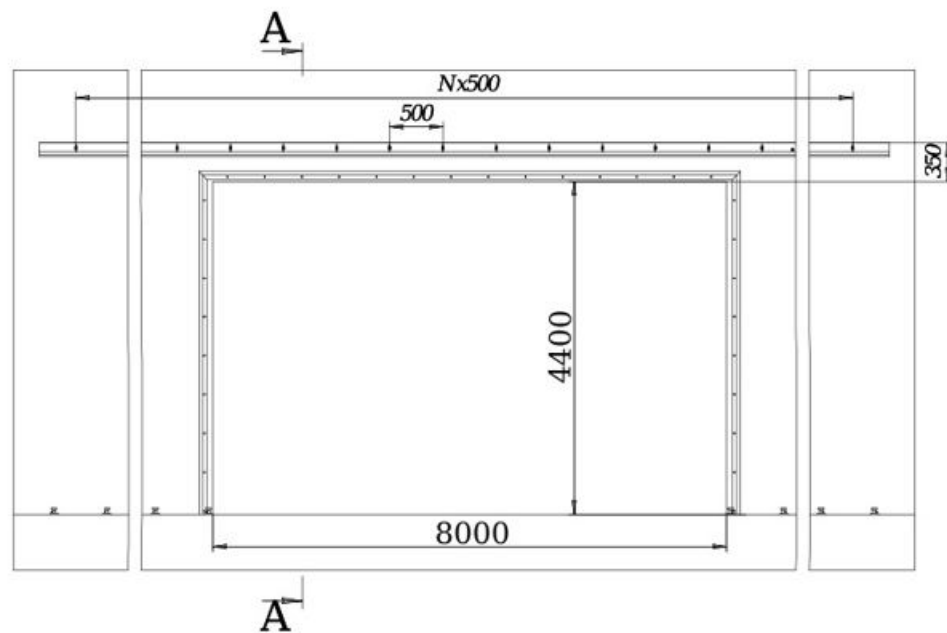
