

Модульное здание из двух блок-контейнеров МБК

1. Габаритные (внешние) размеры (4,885х2,43х5,34м)

2. Крыша МБК

3. Каркас

Оцинкованный лист фальц, 0,45 мм

Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм

Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм

Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм

Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 8 шт.

Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 9 шт.

Сэндвич-панель 100мм рал 5005(синий)

Сэндвич-панель рал 9003

4. Внешняя отделка:

5. Внутренняя отделка:

6. Утеплитель:

Утепление 100 мм УРСА (пол, потолок) плотностью 15 кг/м3

7. Потолок:

ЛДСП 16 мм белого цвета

8. Дно:

Оцинкованный лист 0,45 мм

9. Пол:

ОСБ 22 мм +линолеум коммерческий

10. Окно:

3 шт. – ПВХ (0,8х2,0) глухое

2шт – ПВХ (0,8х2,0) откидное

1шт – ПВХ (0,8х1,4) глухое

3шт – ПВХ (0,8х1,4) откидное

11. Дверь


2 шт. - входная металлическая утепленная (0,86х2,01)


12. Электропроводка:

Электропроводка в Кабель - канале ЕВРО (автоматы на 16А и 10А, щиток распределительный 1 шт., розетка 4 шт., выключатель 1 шт., Светильник светодиодный 36 Вт, 1200х600 4 шт. на один блок-контейнер

13.

Лестница металлическая с площадкой – 2,45х1,25 – 1шт

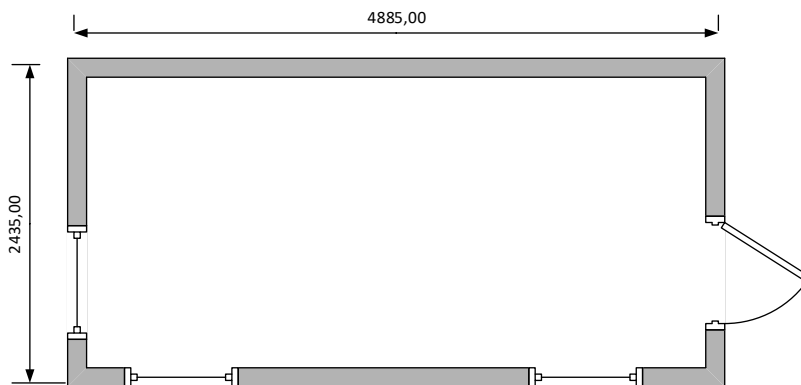

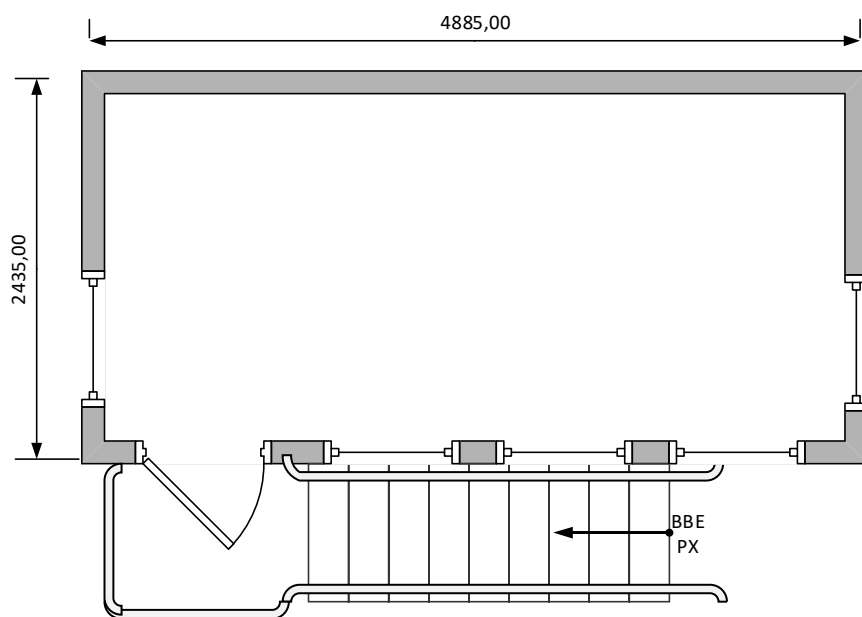

Стоимость модульного здания с монтажом – 1 390 000 руб.

Стоимость доставки (г. Москва)

-25 000 руб.

Срок изготовления – 14 дней после оплаты.
