



ООО «СП ВАНДА»
Юр. адрес: 141351, Московская область, Сергиево
Посадский р-н, д.Жучки, дом 72, комната 40
Почт. адрес: 141301, Московская область, Сергиево
Посадский р-н, г.Сергиев Посад, ул.Посадская, д.96
ИНН 5042153618, КПП 504201001, ОГРН 1205000027759
Тел. 8-495-481-33-83, 8-925-500-80-78

Исх. №750 от 26 июня 2023 г.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Григорий Королев
grigoriy-korolev06@mail.ru
8-903-297-84-83

Компания «СП Ванда» благодарит Вас за проявленный интерес к нашей продукции.

Технико - коммерческое предложение.

Группа компаний «СП ВАНДА» готова изготовить и поставить продукцию, согласно Вашего технического задания:

Адрес доставки: МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

№	Наименование	Цена за штуку	Кол-во	Цена всего
1.	Блок контейнер металлический, 5850х2400 с тамбуром, отделка ДВП, согласно ТЗ	115 500	2	231 000
2.	Линолеум бытовой	8 000	2	16 000
3.	Электрика в гофре	8 000	2	16 000
4.	Утепление 100 мм минеральная вата	6 000	2	12 000
5.	Доставка манипулятором	9 000	2	18 000
6.	Итого			293 000

Цена указана в рублях РФ с НДС 20%. Оплата: 100% предоплата.

Срок поставки в течении 5-7 рабочих дней после оплаты.

Цены действительны в течении 5-ти дней!

Назначение и основные технико – экономические показатели

Вариант исполнения	Одиночного типа согласно ТЗ
Вид строительства	Новое
Тип здания	Временное
Местоположение объекта	МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
Характеристика района строительства	Климатический регион - 3 Температура +38 / - 40 Ветровой район – 1 Снеговой район – 3 Зона влажности - 1
Степень огнестойкости	4
Срок эксплуатации	10 лет
Размеры здания	5850x2400x2400(h) мм. (+/- 5 см допуск)
Количество	2 шт.

Конструктивные решения и материалы блок контейнера

Каркас блок-модуля	Металлоконструкции блок-модулей представляют собой изделия, выполненные из профилей Основание каркаса (верхняя и нижняя обвязка) - швеллер 100x50x3 мм. Вертикальные угловые стойки – сложно – гнутый угол 90x90x3 мм. Обработан грунт эмалью. Цвет синий.
Ограждающие конструкции здания	Сэндвич-панель поэлементной сборки (СППП); Каркас – брус 40x75; Наружная стеновая отделка – профилированный оцинкованный лист 0,35 – 0,4 мм. (С 10); Парогидроизоляция – пленка ПВХ; Теплоизоляция – 100 мм минеральная. вата; Внутренняя стеновая отделка – ДВП;
Панель покрытия (крыша)	Металл сварной 1,0 мм., крашеный; Лаги – брус 40x100;

	Теплоизоляция – 100 мм минеральная вата; Пароизоляция – пленка ПВХ; Потолок – ДВП;
Панель основания (пол)	Обрезная доска 22 мм.; Лаги – брус 40х100; Теплоизоляция – 100 мм минеральная вата; Пароизоляция – пленка ПВХ; ДСП строительное 16 мм. Линолеум бытовой.
Внутренние перегородки	Каркас – брус 40х50; Стеновая отделка – ДВП.
Оконные блоки	Окно деревянное 800х1000 двойное остекление – 1 шт.;
Внешние двери	ДГ 21-8 снаружи обшита оцинкованным листом – 1 шт.
Внутренние двери	ДГ 21-8 – 1 шт.
Лестница	
Общая крыша	
Инженерное обеспечение и технологическое оборудование	
Электрообеспечение	Электрика в гофре: Провод ВВГ 2х2,5. Розетка одинарная – 2 шт., Выключатель – 2 шт. Светильник светодиодный – 1 шт., Светильник шар – 1 шт. Автомат 25А – 1 шт. Мощность до 5-ти кВт. Подключение к внешним коммуникациям силами Заказчика.
Сантехническое и инженерное оборудование	Отсутствует
Мебель	
Вентиляция	Естественная, путем проветривания
Пожарная безопасность	
Содержание комплекса выполняемых работ:	
Доставка	Осуществляет Заказчик

Погрузочная техника	Осуществляет Поставщик
Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства начинаются после выполнения всех обязательств по договору. На выполненные работы не менее 6-ти месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Возможность заключения отдельного договора по обслуживанию, разборке и сборке после проведения указанных работ.
Адрес доставки	МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4


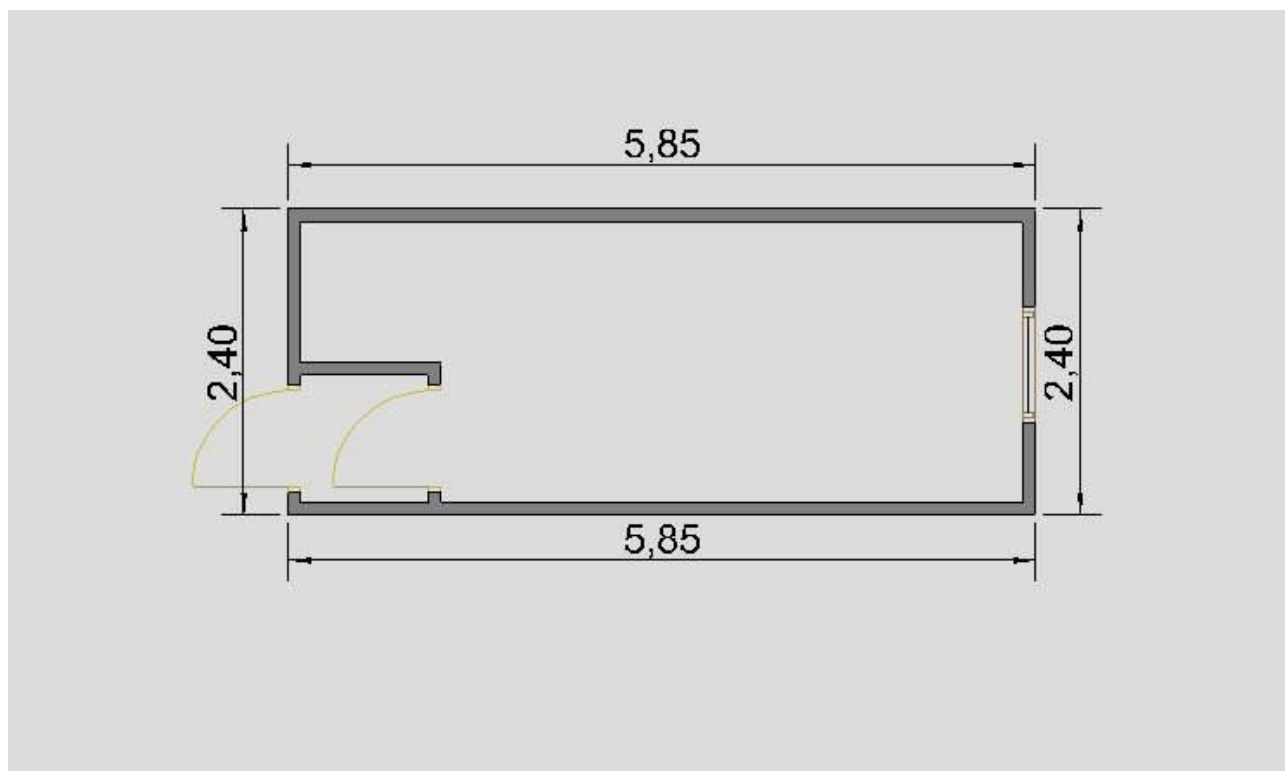


Фото выполненных работ.



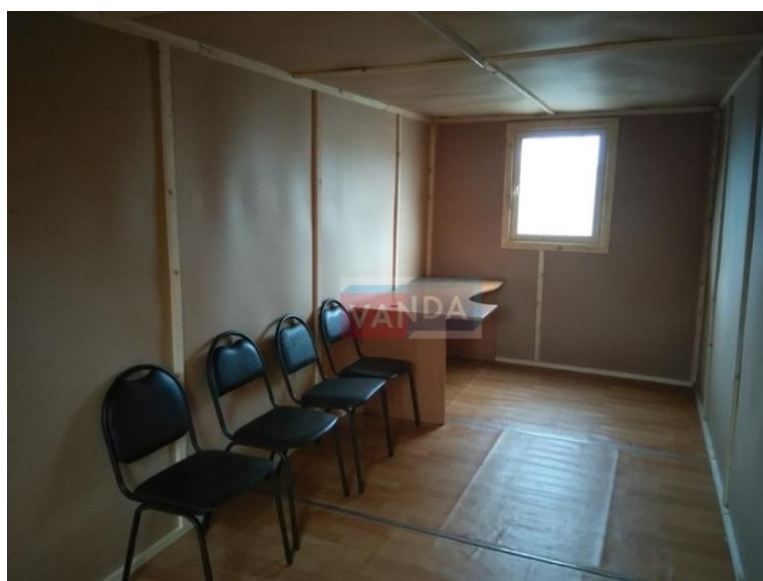

Дополнительная комплектация:

Электрические конвекторы, масляные обогреватели;

Постельное белье (матрас, подушка, одеяло, наволочка, пододеяльник, простынь);

Вешалки для переодевания;

Датчики пожарной сигнализации, огнетушители;

Счетчики электроэнергии;

Стол, стулья, спальные места, шкафы;

Бытовая техника (холодильник, микроволновая печь, морозильная камера, электроплиты и т.д.);

Сантехническое оборудование (унитаз, душевая кабина, раковина и т.д.)

Резервуар для воды из пластика;

Рольставни

Почему именно мы?:

ООО «СП ВАНДА» занимается изготовлением бытовок, блок-контейнеров, зданий модульного типа, а также загородным строительством на рынке уже более 10 лет.

Наша задача. Поддерживать существующую добрую репутацию нашей компании, делая упор на качество исполнения работы, а не завышать цену объектов, удовлетворить спрос потребителей. Именно поэтому цены на всю продукцию достаточно умеренные.

Наша отличительная черта - оперативность. Она объясняется большим опытом работы и профессионализмом рабочих.

Производство. Мы имеем собственную производственную базу. В производстве используется только качественная - сосна и ель, привезённые из Новгородской и Вологодской области, поэтому наша компания занимается только экологически чистым строительством.

Индивидуальный подход. Строительство производится по типовым и индивидуальным проектам. По Вашему желанию мы произведём внутреннюю перепланировку дома или изменим наружный вид и фасад дома. Если же ни одна из наших вариантов планировок Вас не устроит, то мы создадим планировку по Вашему плану, которая бы полностью соответствовала Вашим запросам.

Доставка. Нашу продукцию Вы можете купить не только в Москве, но и других городах РФ: Ярославль, Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Санкт-Петербург, Казань и т.д. Мы осуществляем доставку нашей продукции в любые города и регионы РФ. Мы искренне надеемся, что Вы сделаете наиболее выгодный для Вас выбор, и поэтому ждем Вашего звонка или заказа.

С уважением Менеджер по продажам Смирнов А.А.
