

ШТАЛЬБЕРГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСНЫХ СИСТЕМ



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№24-1160

Центральный офис: г. Москва, ул. Речников 21.

Специалист отдела продаж - Лисяной Евгений

Тел.: 8-800-350-50-75, доб. 3002.

8-903-004-36-78

e-mail: sd@stahl-berg.ru

График работы:

Пн - пт: 10:00 - 18:00

Дата: 02.09.2024

Шифр: КО.11,8.11,8.28,5.59.

Организация: ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Контактное лицо: Григорий Королев

Телефон для связи: 7-903-297-84-83

e-mail: grigoriy-korolev06@mail.ru

WhatsApp

Место строительства: МО, Москва

Назначение здания: АБК



ОСЕВЫЕ РАЗМЕРЫ [мм]

Ширина: 11800

Длина: 11800

Высота: 2850

Шаг рам: 5900

Примечание:

Высота дана от отм. 0.000 до нижнего пояса фермы.

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Тип: Двускатная

Угол наклона: 11

Снеговой район: 3

Норматив. нагрузка: 150

Ветровой район: 1

Норматив. нагрузка: 23

Сейсмичность: 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во пролётов: 1

Этажность: 1

Площадь м2: 139



Комментарий:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма
1	Металлокаркас (гарантия 6 лет): сталь ст350, ст345 09Г2С-15 и ст245 пс3/пс5, ГОСТ 380-05 оцинкованная, 1 класс покрытия; проекты стадий КМ и КМД				1 706 102 Р
	Сталь оцинкованная ст350 (Zn275 г/м2): колонны рядовые, фахверковые, фермы покрытия, прогоны стеновые, кровельные, связи вертикальные, горизонтальные.	Комп.	1	1 355 695 Р	1 355 695 Р
	Сталь сортовая ст345 09Г2С-15: элементы крепления, фасонные детали. (дробеструйная обработка , грунт-эмаль ГФ-021)	Комп.	1	235 150 Р	235 150 Р
	Разработка проекта рабочей документации (КМ, КМД, ОК, КЖ)- без НДС. Стоимость включена в металлокаркас	Комп.	1	1 Р	1 Р
	Геология и геодезия участка строительства Уточнение по точному адресу и или кадастровому номеру.	Комп.	1	1 Р	1 Р
	Метизы (болты, гайки, шайбы).	Комп.	1	115 255 Р	115 255 Р
2	Ограждающие конструкции; проект стадии ОК.				1 592 893 Р
	Панель стеновая 100мм ; утеплитель МВП, плотность 100 кг/м3, толщина 0,5 мм.	м2	163	3 755 Р	611 971 Р
	Панель кровельная 120мм ; утеплитель МВП, плотность 100 кг/м3, толщина 0,5 мм.	м2	171	4 311 Р	737 935 Р
	Комплект фасонных и доборных элементов: угол наружный, свес кровли, торцевые кровельные, цокольные элементы; комплект крепежей.	Комп.	1	242 986 Р	242 986 Р
3	Строительно-монтажные работы; проекты стадий КМ, КМД, ОК, КЖ.				3 470 763 Р
	Устройство фундаментов; тип: ПЛИТА 120мм. С утолщением по периметру до 700х300мм. Фундамент армир., гидроизол. Работы включают разработку грунта, подсыпку из песка и щебня, устройство опалубки, фундамента, обратн. засыпку. Материалы учтены.	м3	27	70 305 Р	1 898 235 Р
	Анкеры; тип: блок анкерный.	шт	8	12 850 Р	102 800 Р
	Устройство фундаментной балки 200х500(н)мм. Балка армир., гидроизол, утепление экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс 50 мм. Работы включают разработку грунта, подсыпку из песка и щебня, устройство опалубки, балки, обратн. засыпку. Материалы учтены.	м3	4,7	84 832 Р	400 407 Р
	Дверь метал. с монтажом; проём:1х2,1(н); тип: одностворчатая.	шт	1	1 Р	1 Р
	Остекление с монтажом; проём:4х1,19(н); тип: глухое однокамерное; 4шт.	м2	19	1 Р	1 Р

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма
	Монтаж металлокаркаса.	т	5,6	90 000 Р	501 264 Р
	Монтаж сэндвич панелей.	м2	334	1 700 Р	568 055 Р
Итого без доставки, включая НДС (20%)					6 769 758 Р
Доставка по адресу: МО, Москва.					111 110 Р
	Доставка металлоконструкций.	Фура	1	55 555 Р	55 555 Р
	Доставка ограждающих конструкций.	Фура	1	55 555 Р	55 555 Р
ВСЕГО С ДОСТАВКОЙ					6 880 868 Р
руб/м2.					49417,32

Ворота, двери, остекление - уточнение стоимости по ТЗ заказчика.

- * Расчёт стоимости выполнен с учётом стоимости материалов по состоянию на дату направления коммерческого предложения.
- * Точная стоимость только по результатам проекта и составления сметы.
- * Срок возведения коробки здания, включая разработку проекта рабочей документации, составляет 3-5 мес.
- * ЛЮБОЙ ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕТЕ ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИБО ПРИВЛЕЧЬ 3-их ЛИЦ.

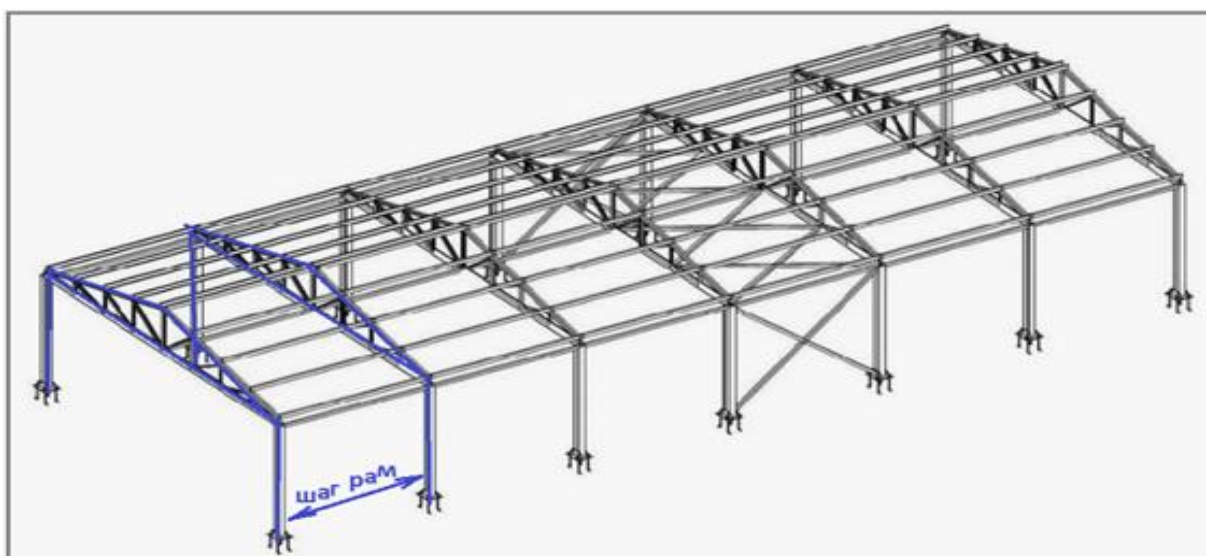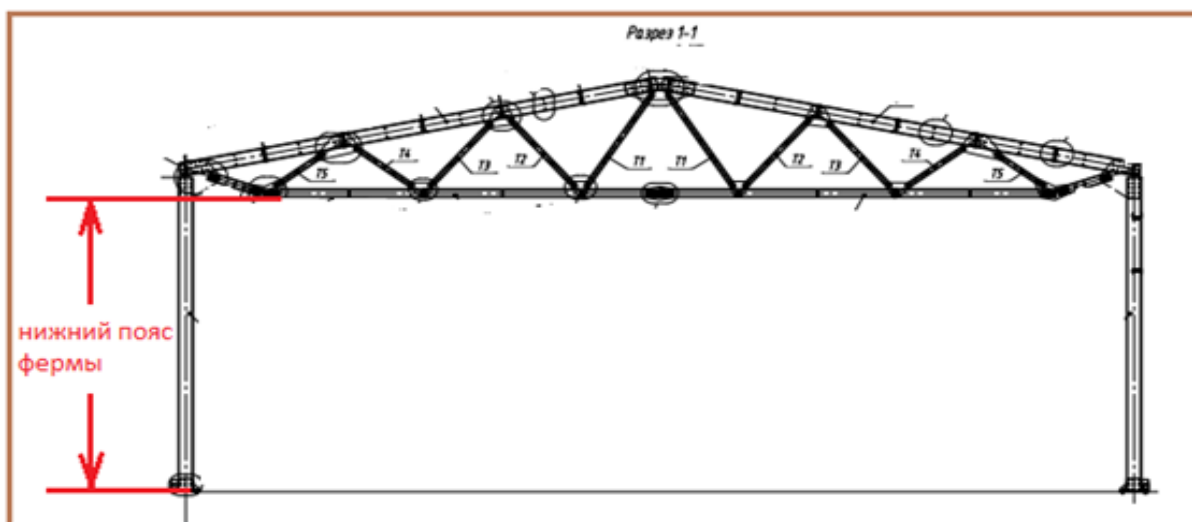

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Сумма
---	--------------------	----------	--------	------------------	-------



Каркасная система:

Комплект поставляется с проектами КЖ, КМ, ОК, расчетами несущей способности, а так же гарантийным сертификатом на 6 лет.

Все применяемые профили соответствуют нормам СНиП и ГОСТ, градостроительному кодексу РФ.

Преимущества наших зданий:

Применение в рядовых рамах колонн и ферм покрытия - профилей С310, С350, С370 из высококачественной конструкционной стали с пределом текучести от 350 Мпа и первым классом двустороннего оцинкованного покрытия, превращает Ваш несущий каркас в надежное и долговечное строение. Точность и скорость выполнения болтовых соединений обеспечивается современной линией проката с ЧПУ и автоматической переналадкой проката профилей, что даёт возможность снизить стоимость продукции, а так же качественно и в короткий срок выполнить Ваш заказ.

Объекты от компании Штальберг.



ВЫЕЗД ПРОРАБА НА
ПЛОЩАДКУ



Расчёт стоимости выполнен с учётом стоимости материалов по состоянию на дату направления коммерческого предложения, без учета стоимости размещения(проживания) строительного городка (бригады). Точная стоимость только по итогам проекта и составления сметы.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА STAHLBERG-LUNCH

Компания Stahlberg

Приглашает Вас на деловой ланч с участием архитектора, инженера-проектировщика и менеджера по Вашему проекту

Вы сможете обсудить все самые важные вопросы и нюансы, касающиеся проектирования и дальнейшего строительства.

Для полного собрания участников встречу предлагаем предварительно согласовать.

Будем рады видеть Вас в нашем офисе!



Не рискуйте возводить здание Вашей жизни на фундаменте, сделанном в течении одного дня.
Лао-Цзи, китайский философ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По вопросам обсуждения настоящего КП

Специалист отдела продаж - Лисяной Евгений
Тел.: 8-903-004-36-78
e-mail: sd@stahl-berg.ru
