


Прочнее на 30% =  швеллер +  уголок

Модульное здание из 4 шт. МБК 1 шт.


1. Габаритные размеры (ДхШхВ): 6,055х4,86х5,34м
2. Каркас цвет РАЛ 7004: Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм
Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм
Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм
Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм
Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм
1. Крыша каждого МБК оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
2. Дно: оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
3. Пол: ОСБ 22 мм
4. Покрытие пола линолеум коммерческий цвет серая крошка
5. Потолок: ЛДСП 16 мм цвет белый
6. Пароизоляция: мембрана Изоспан (пол, потолок)
7. Утепление: 100 мм УРСА (пол, потолок)
8. Внешняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9002 (100 мм)
9. Внутренняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9002 (100 мм)
10. Окно1: ПВХ (0,8х1,4) поворотнo откиднoе 2 шт. - откиднoе
11. Окно2: ПВХ (0,8х1,4) поворотнo откиднoе 5 шт.-глухое
12. Окно3: ПВХ (0,8х2,0) поворотнo откиднoе 2 шт.-откиднoе
13. Окно4: ПВХ (0,8х2,0) поворотнo откиднoе 6 шт.-глухое
14. Дверь входная: металлическая утепленная (0,8х2,0) 2 шт.
15. Электрика: щиток вводной 1 шт., кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки и 3х2,5 на освещение, из расчёта на каждый МБК (двойные розетки 4 шт., Светодиодный светильник 2700Лм, 1200мм, IP40 2 шт., выключатель 1 шт.)
16. Лестница металлическая с площадкой 2,45х1,25 и перилами – 1шт.

Схема планировки модульного здания

1 эт:

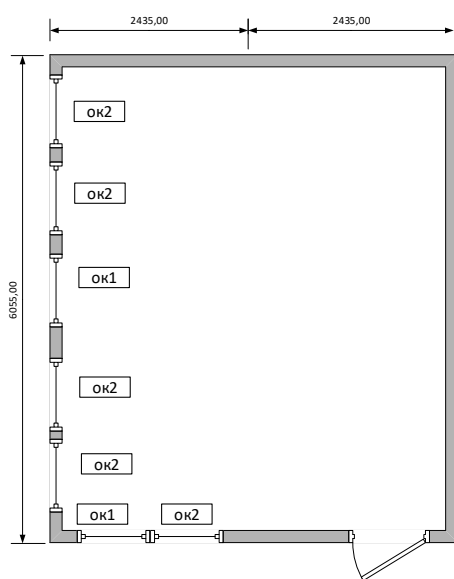

2 эт:

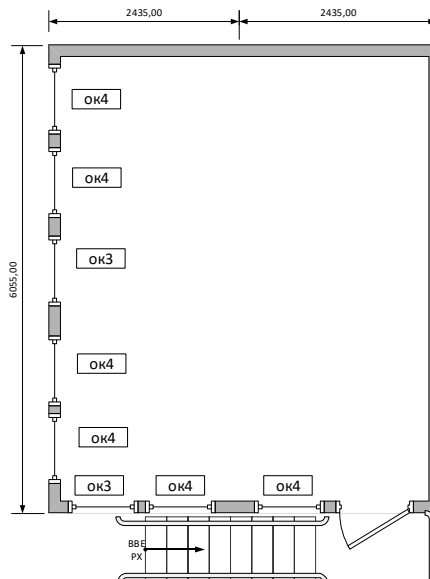

Стоимость модульного здания, включая монтаж– 2 672 000 руб.

Стоимость доставки (г. Москва) – 32 500 руб.

***НДС 20% входит в стоимость.**

Срок изготовления – 14-16 дней после оплаты.

С уважением, начальник отдела продаж ООО СТК «Краус»,
Озерина Людмила, 89251310045.
