Схема железных дор
АО "Коломе

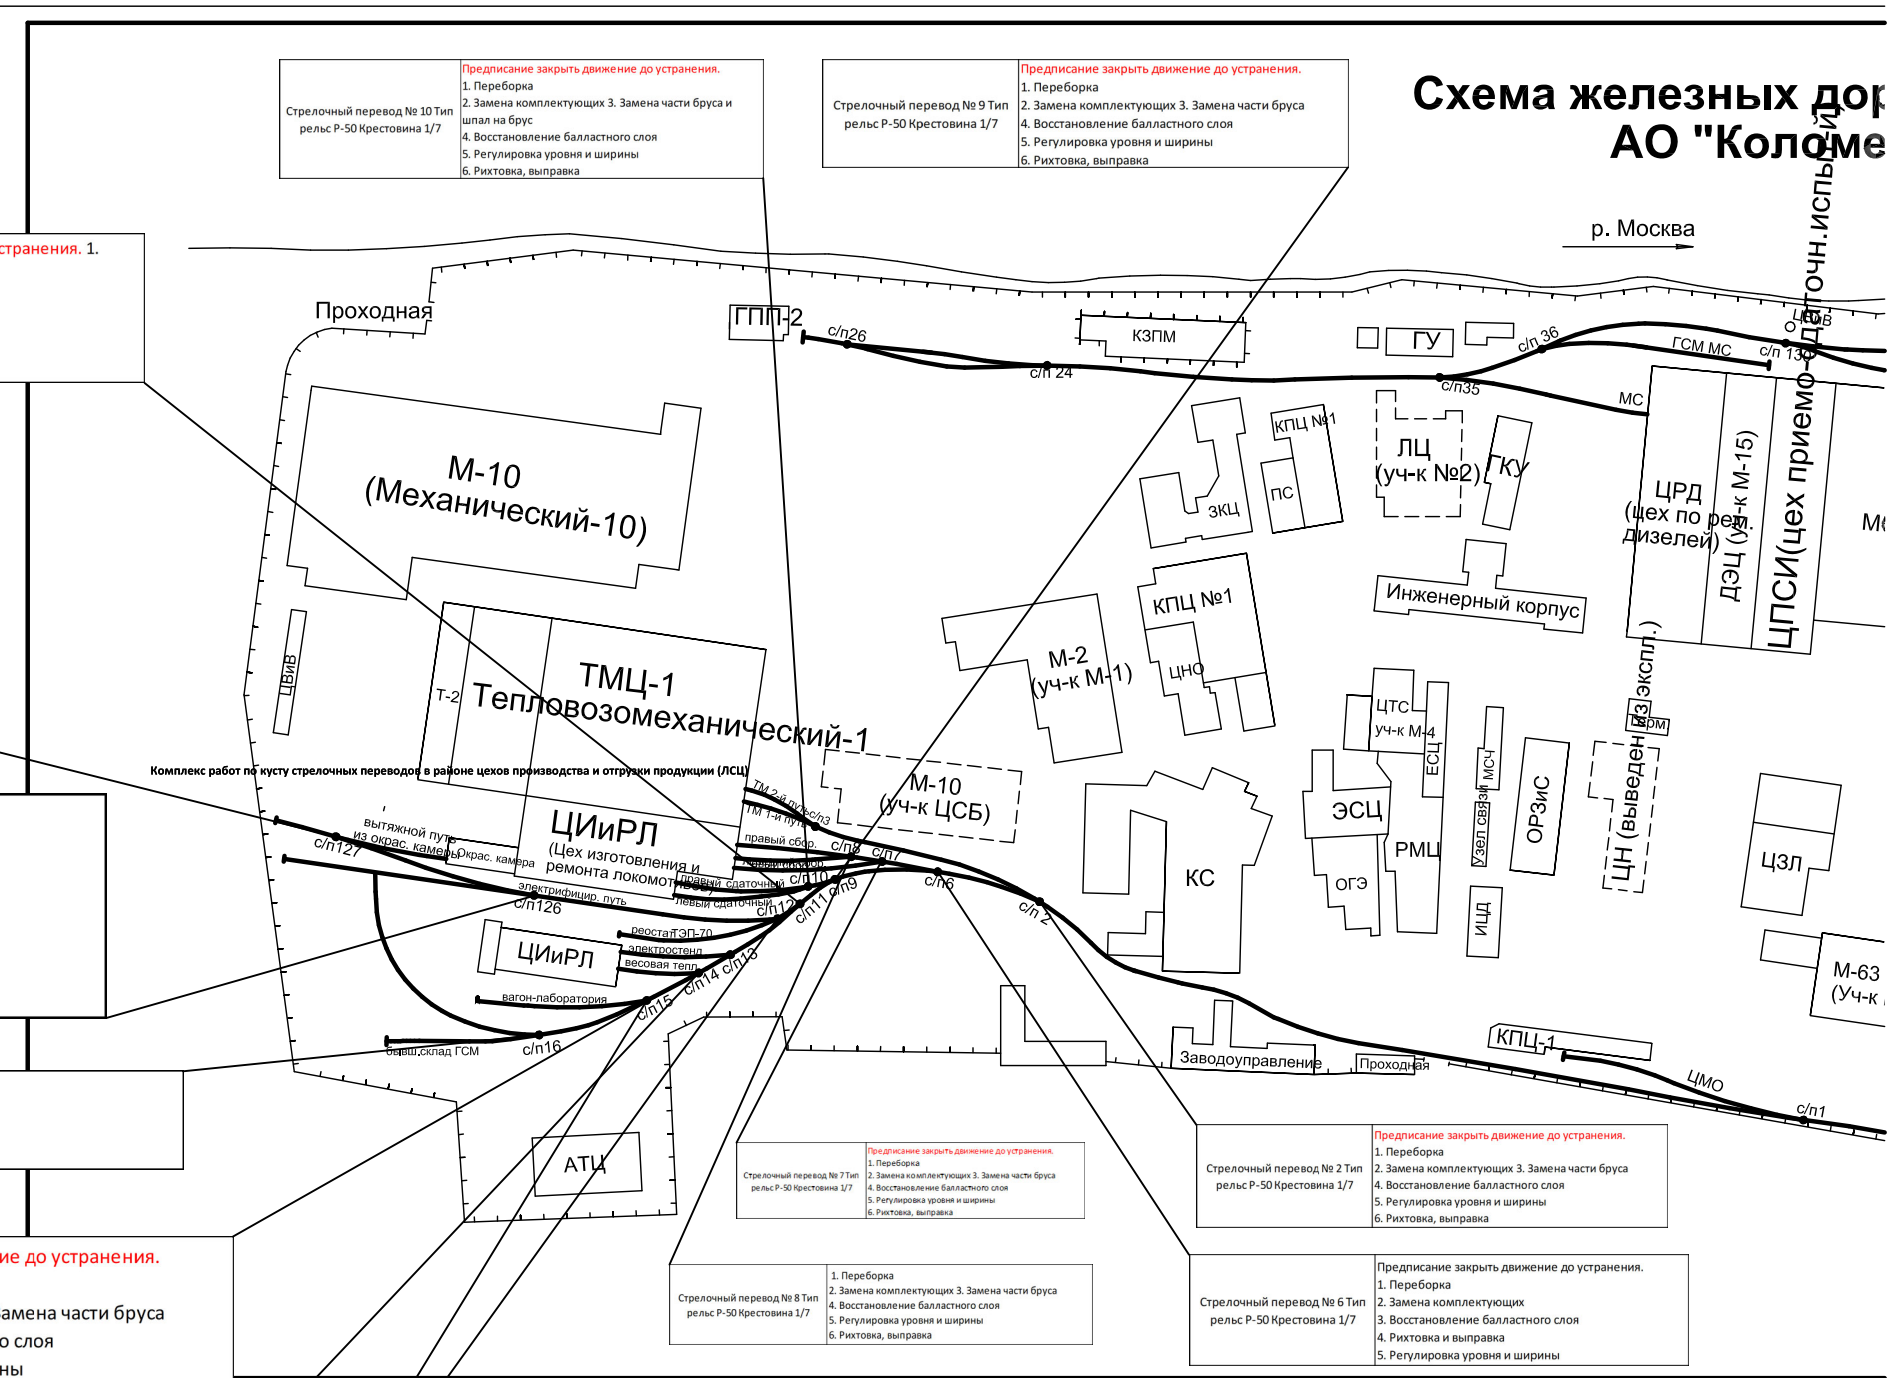

Стрелочный перевод № 10 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса и шпал на брус 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 9 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 11 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Восстановление балластного слоя 4. Регулировка уровня и ширины 5. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 127 Тип рельс Р-65 Крестовина 1/6	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Комплекс работ по кусту стрелочных переводов в районе цехов производства и отгрузки продукции (ЛСЦ)

Стрелочный перевод № 126 Тип рельс Р-65 Крестовина 1/9	Плановое обслуживание

Стрелочный перевод № 16. Данная стрелка отсутствует в паспорте.	1. Замена коплектующих 2. Регулировка уровня и ширины

Стрелочный перевод № 13 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 14 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 15 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Регулировка уровня и ширины 5. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 12 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/9	Плановое обслуживание

Стрелочный перевод № 7 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 2 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 8 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Замена части бруса 4. Восстановление балластного слоя 5. Регулировка уровня и ширины 6. Рихтовка, выправка

Стрелочный перевод № 6 Тип рельс Р-50 Крестовина 1/7	Предписание закрыть движение до устранения. 1. Переборка 2. Замена комплектующих 3. Восстановление балластного слоя 4. Рихтовка и выправка 5. Регулировка уровня и ширины
