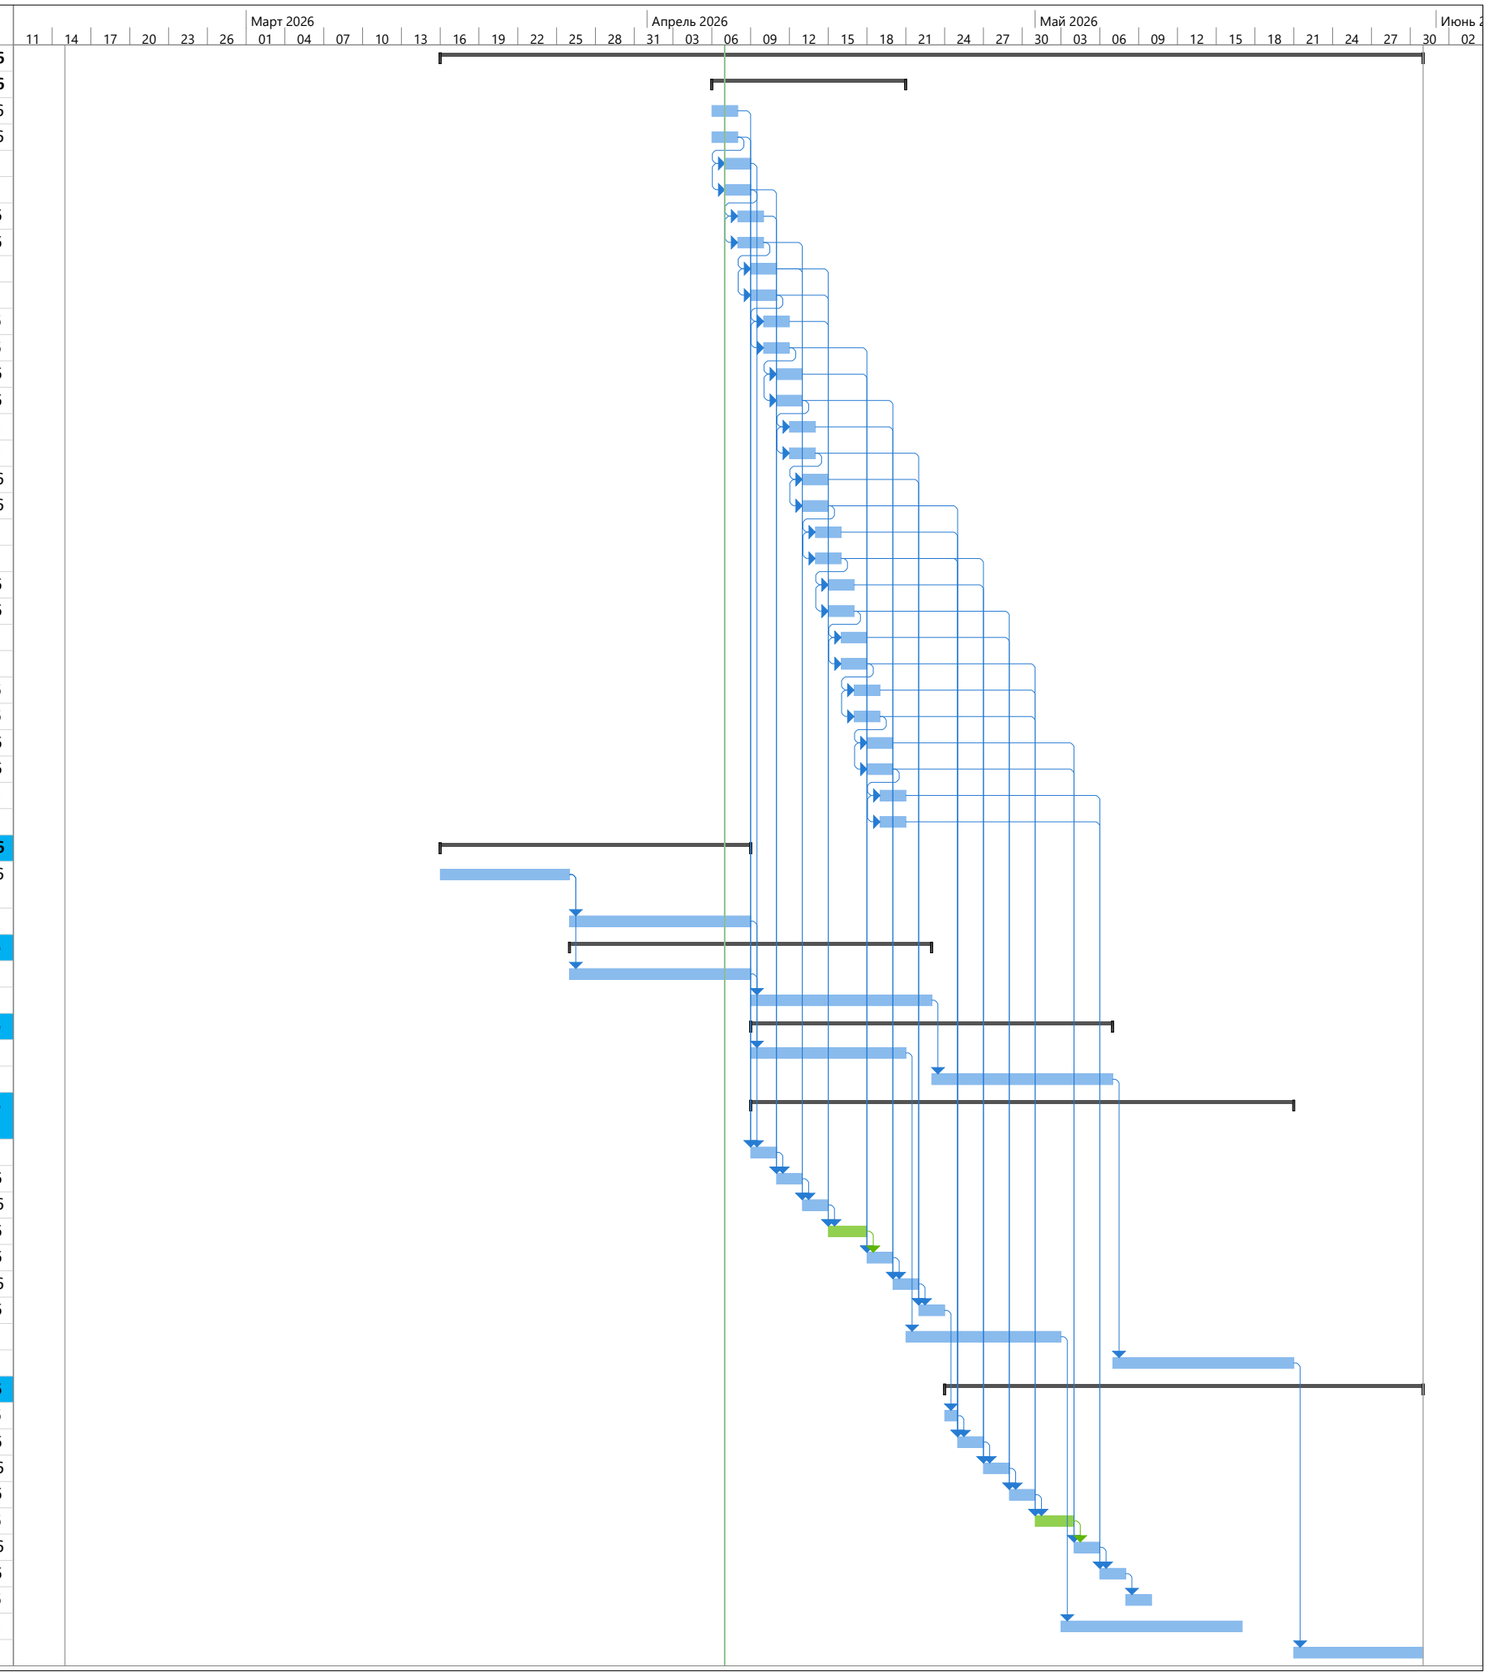Ид.	Название задачи	Длительность	Начало
1	**Конвейерная галерея №3**	**76 дней**	**Пн 16.03.26**
2	**Укрупнительная сборка (6 сварщиков и 6 слесарей, кран 100т.)**	**15 дней**	**Пн 06.04.26**
3	Ось 26	2 дней	Пн 06.04.26
4	Ось 26,5	2 дней	Пн 06.04.26
5	Ось 27	2 дней	Вт 07.04.26
6	Ось 27,5	2 дней	Вт 07.04.26
7	Ось 28	2 дней	Ср 08.04.26
8	Ось 28,5	2 дней	Ср 08.04.26
9	Ось 29	2 дней	Чт 09.04.26
10	Ось 29,5	2 дней	Чт 09.04.26
11	Ось 30	2 дней	Пт 10.04.26
12	Ось 30,5	2 дней	Пт 10.04.26
13	Ось 31	2 дней	Сб 11.04.26
14	Ось 31,5	2 дней	Сб 11.04.26
15	Ось 32	2 дней	Вс 12.04.26
16	Ось 32,5	2 дней	Вс 12.04.26
17	Ось 33	2 дней	Пн 13.04.26
18	Ось 34	2 дней	Пн 13.04.26
19	Ось 34,5	2 дней	Вт 14.04.26
20	Ось 35	2 дней	Вт 14.04.26
21	Ось 35,5	2 дней	Ср 15.04.26
22	Ось 36	2 дней	Ср 15.04.26
23	Ось 36,5	2 дней	Чт 16.04.26
24	Ось 37	2 дней	Чт 16.04.26
25	Ось 37,5	2 дней	Пт 17.04.26
26	Ось 38	2 дней	Пт 17.04.26
27	Ось 38,5	2 дней	Сб 18.04.26
28	Ось 39	2 дней	Сб 18.04.26
29	Ось 39,5	2 дней	Вс 19.04.26
30	Ось 40	2 дней	Вс 19.04.26
31	**Захватка №1**	**24 дней**	**Пн 16.03.26**
32	Монтаж связей и прогонов (1 подъемник и 1 кран (30 т.), 2 монтажника, 1 стропольщик)	10 дней	Пн 16.03.26
33	Монтаж настила (2 монтажника, 1 кран (30т.), 2 строполя)	14 дней	Чт 26.03.26
34	**Захватка №2**	**28 дней**	**Чт 26.03.26**
35	Монтаж связей и прогонов	14 дней	Чт 26.03.26
36	Монтаж настила	14 дней	Чт 09.04.26
37	**Захватка №3**	**28 дней**	**Чт 09.04.26**
38	Монтаж связей и прогонов	12 дней	Чт 09.04.26
39	Монтаж настила	14 дней	Чт 23.04.26
40	**Захватка №4 (кран 60т. Гусянка, кран 30т., 2 подъемника, 2 монтажника, 2 строполя)**	**42 дней**	**Чт 09.04.26**
41	Ось 26-27	2 дней	Чт 09.04.26
42	Ось 27-28	2 дней	Сб 11.04.26
43	Ось 28-29	2 дней	Пн 13.04.26
44	Ось 29-30 (жесткий блок)	3 дней	Ср 15.04.26
45	Ось 30-31	2 дней	Сб 18.04.26
46	Ось 31-32	2 дней	Пн 20.04.26
47	Ось 32-33	2 дней	Ср 22.04.26
48	Монтаж связей и прогонов	12 дней	Вт 21.04.26
49	Монтаж настила	14 дней	Чт 07.05.26
50	**Захватка №5**	**37 дней**	**Пт 24.04.26**
51	Ось 33-34 (переход)	1 день	Пт 24.04.26
52	Ось 34-35	2 дней	Сб 25.04.26
53	Ось 35-36	2 дней	Пн 27.04.26
54	Ось 36-37	2 дней	Ср 29.04.26
55	Ось 37-38 (жесткий блок)	3 дней	Пт 01.05.26
56	Ось 38-39	2 дней	Пн 04.05.26
57	Ось 39-40	2 дней	Ср 06.05.26
58	Ось 40-41	2 дней	Пт 08.05.26
59	Монтаж связей и прогонов	14 дней	Вс 03.05.26
60	Монтаж настила	10 дней	Чт 21.05.26
