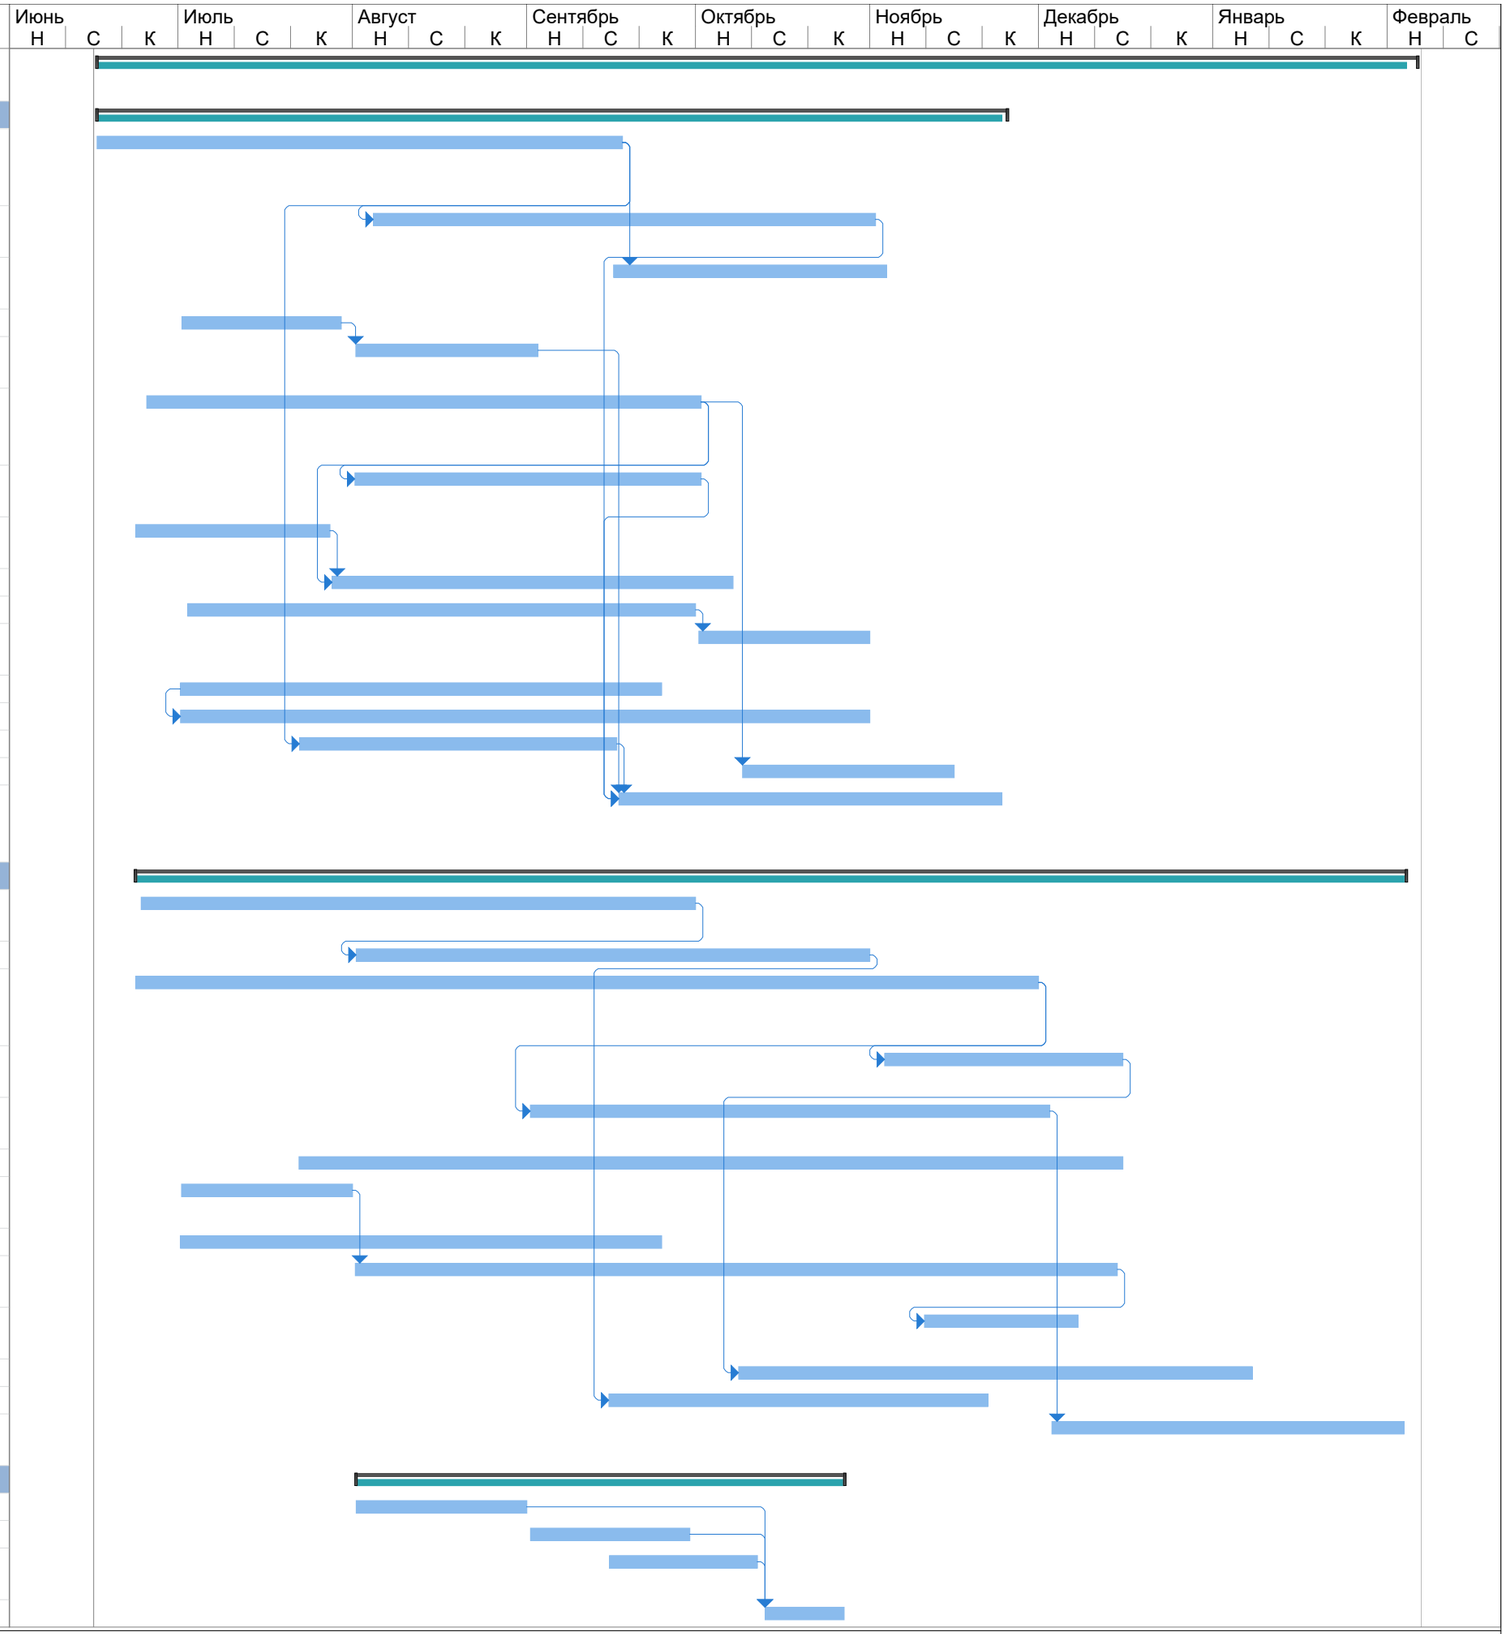Ид.	Название задачи	Длительност	Начало	Окончание
1	**Усть-Луга АБК, РММ, КПП-2 ОВ, ВК, АОВ, ТМ**	**150 дней**	**16.06.25**	**06.02.26**
2	**РММ**	**103 дней**	**16.06.25**	**25.11.25**
3	Монтаж магистральных трубопроводов отопления, теплоснабжения вентиляции, завес	60 дней	16.06.25	17.09.25
4	Монтаж и обвязка радиаторов, тепловентиляторов, завес	57 дней	04.08.25	01.11.25
5	Монтаж смесительных узлов теплоснабжения в венткамерах	31 дней	16.09.25	03.11.25
6	Заказ и поставка дымовых люков	18 дней	01.07.25	29.07.25
7	Монтаж дымовых люков с системой управления	20 дней	01.08.25	02.09.25
8	Монтаж воздуховодов, воздухораспределителей систем вентиляции по помещениям	63 дней	25.06.25	01.10.25
9	Монтаж и обвязка вентоборудования в венткамерах	39 дней	01.08.25	01.10.25
10	Заказ и поставка оборудования кондиционирования	22 дней	23.06.25	27.07.25
11	Монтаж системы кондиционирования	46 дней	28.07.25	07.10.25
12	Монтаж трубопроводов водоснабжения	57 дней	02.07.25	30.09.25
13	Монтаж шкафов противопожарного водопровода	20 дней	01.10.25	31.10.25
14	Монтаж ливневой канализации К2	55 дней	01.07.25	24.09.25
15	Монтаж систем канализации К1, К3, К4	79 дней	01.07.25	31.10.25
16	Монтаж тепломеханики, автоматики ИТП	36 дней	22.07.25	16.09.25
17	Монтаж автоматики вентиляции	24 дней	09.10.25	15.11.25
18	Пуско-наладочные работы отопления, теплоснабжения завес, тепловентиляторов, вентиляции, ИТП	43 дней	17.09.25	24.11.25
19	**АБК**	**144 дней**	**23.06.25**	**04.02.26**
20	Монтаж трубопроводов отопления, теплоснабжения вентиляции	63 дней	24.06.25	30.09.25
21	Монтаж и обвязка радиаторов	58 дней	01.08.25	31.10.25
22	Монтаж воздуховодов, воздухораспределителей систем вентиляции по помещениям	102 дней	23.06.25	30.11.25
23	Монтаж смесительных узлов теплоснабжения в венткамерах	27 дней	03.11.25	15.12.25
24	Монтаж и обвязка вентоборудования в венткамерах	59 дней	01.09.25	02.12.25
25	Монтаж системы кондиционирования	93 дней	22.07.25	15.12.25
26	Заказ и поставка ёмкостей для водоснабжения	20 дней	01.07.25	31.07.25
27	Монтаж ливневой канализации К2	55 дней	01.07.25	24.09.25
28	Монтаж трубопроводов водоснабжения, канализации К1, К3	85 дней	01.08.25	14.12.25
29	Монтаж шкафов противопожарного водопровода	17 дней	10.11.25	07.12.25
30	Монтаж автоматики вентиляции	58 дней	08.10.25	07.01.26
31	Пуско-наладочные работы отопления	44 дней	15.09.25	21.11.25
32	Пуско-наладочные работы вентиляции, теплоснабжения, автоматизации вентиляции	40 дней	03.12.25	03.02.26
33	**КПП-2**	**54 дней**	**01.08.25**	**27.10.25**
34	Монтаж системы отопления	18 дней	01.08.25	31.08.25
35	Монтаж системы вентиляции	18 дней	01.09.25	29.09.25
36	Монтаж систем водоснабжения, водоотведения	17 дней	15.09.25	11.10.25
37	Пуско-наладочные работы	9 дней	13.10.25	27.10.25
