

Исх № 170-К от 02.05.2024г.

Генеральному директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Степнову А.Б.

*О дополнительном соглашении
к договору MBM/19-07 от 19.07.23г*

Уважаемый Андрей Борисович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора генерального строительного подряда № MBM/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».


По состоянию на 02.05.2024г. работы завершены на 95%, ведутся пусконаладочные работы и настройка смонтированного оборудования.

В связи с большим объемом корректировки инженерных систем разделов 130-23-ОВ1 «АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование», 130-23-ОВ2 «Цех №8. Отопление и вентиляция», 130-23-ОВ3 «АБК. Вентиляция и кондиционирование», 130-23-ПС «Пожарная сигнализация», а также разделов 130-23-УА1, 130-23-УА2, 130-23-УА3 «Устройства автоматики» просим рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения к договору №MBM/19-07 от 19.07.2023г. в части продления сроков завершения работ до 17.06.2024г. для выполнения пусконаладочных работ и проведения комплексных испытаний и получения своевременного финансирования для завершения всего комплекса работ.

Приложение:

1. Дополнительное соглашение № 5 от 02.05.2024г. к договору генерального строительного подряда №MBM/19-07 от 19.07.2023г.

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № MBM/19-07 от 19 июля 2023 г.

г. Мытищи

«02» мая 2024 г.

Акционерное общество «Метровагонмаш» (сокращенное наименование АО «Метровагонмаш»), в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», в лице генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 5 (далее – Соглашение) к Договору генерального строительного подряда № MBM/19-07 от 19 июля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору График выполнения Работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. Изложить реквизиты Сторон в разделе 17 Договора «АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» в следующей редакции:

Заказчик:

АО «Метровагонмаш»
Адрес 141009, Московская
местонахождения: обл., г. о. Мытищи, г.
Мытищи,
Адрес для ул. Колонцова, 4
корреспонденции: 141009, Московская
обл., г. о. Мытищи, г.
Мытищи,
ул. Колонцова, 4
ОГРН 1025003520310
ИНН 5029006702
КПП 997450001
Р/с 40702810940260102025
в: Акционерном
коммерческом
Сберегательном банке
Российской Федерации
(Публичное
акционерное общество)
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Телефон: 8 (498) 687-45-55
Адрес электронной почты:
info@metrowagonmash.ru

Генеральный подрядчик:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Адрес 109004, г. Москва, ул.
местонахождения: Земляной Вал, д.65, кв.59
Адрес для 109004, г. Москва, ул.
корреспонденции: Земляной Вал, д.65, кв.59
ОГРН 1127747247704
ИНН 7709918820
КПП 770901001
Р/с 40702810812010584815
в: Филиал
«Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк»
БИК 044525360
К/с 30101810445250000360
Телефон: +7 (495) 915-24-71
Адрес электронной почты: kikgeo.fin@gmail.com

3. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - График выполнения Работ.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

_____ А.Б. Степнов

Генеральный подрядчик:


Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



_____ Ю.Ф. Кесслер

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Авг 04 Сен 25 Сен 16 Окт 06 Ноя 27 Ноя 18 Дек 08 Янв 29 Янв 19 Фев 11 Мар 01 Апр 22 Апр 13 Май 03 Июн 24 Июн
-----	-----------------	--------------	--------	-----------	---

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Авг П	04 С	Сен П	25 С	16 О	06 Н	27 Н	18 Д	08 Я	29 Я	19 Ф	11 М	01 А	22 А	13 М	03 И	24 И
112	Оборудование	14 дней	13.05.24	28.05.24																	
113	Кабельные линии	15 дней	13.05.24	29.05.24																	
114	Цех №8. Устройства автоматики (130-23-УА2)	100 дней	15.11.23	09.03.24																	
115	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24																	
116	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24																	
117	Здание АБК. Устройства автоматики (130-23-УА3)	100 дней	15.11.23	09.03.24																	
118	Оборудование	100 дней	15.11.23	09.03.24																	
119	Кабельные линии	100 дней	15.11.23	09.03.24																	
120	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ1)	10 дней	25.05.24	05.06.24																	
121	Низковольтное оборудование	10 дней	25.05.24	05.06.24																	
122	Кабельные линии	10 дней	25.05.24	05.06.24																	
123	Цех №8. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ2)	124 дней	18.10.23	09.03.24																	
124	Земляные работы	10 дней	18.10.23	28.10.23																	
125	Ввод кабельных линий в здание	15 дней	30.10.23	15.11.23																	
126	Кабельные линии	80 дней	08.12.23	09.03.24																	
127	Низковольтное оборудование	80 дней	08.12.23	09.03.24																	
128	АБК. Силовое электрооборудование (130-23-ЭМ3)	105 дней	21.11.23	21.03.24																	
129	Низковольтное оборудование	80 дней	21.11.23	21.02.24																	
130	Кабельные линии	80 дней	21.11.23	21.02.24																	
131	Заземление	80 дней	20.12.23	21.03.24																	
132	Цех №8. Наружное освещение (130-23-ЭН)	45 дней	23.10.23	13.12.23																	
133	Низковольтное оборудование	30 дней	23.10.23	25.11.23																	
134	Кабельные линии	30 дней	23.10.23	25.11.23																	
135	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																	
136	Светотехническое оборудование	30 дней	09.11.23	13.12.23																	
137	Цех №8. Электрическое освещение (130-23-ЭО1)	85 дней	09.11.23	15.02.24																	
138	Низковольтное оборудование	60 дней	08.12.23	15.02.24																	
139	Кабельные линии	60 дней	08.12.23	15.02.24																	
140	Поставка светильников	0 дней	09.11.23	09.11.23																	
141	Светотехническое оборудование	60 дней	09.11.23	17.01.24																	
142	АБК. Электрическое освещение (130-23-ЭО2)	60 дней	21.11.23	29.01.24																	
143	Низковольтное оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																	
144	Кабельные линии	60 дней	21.11.23	29.01.24																	
145	Светотехническое оборудование	60 дней	21.11.23	29.01.24																	
146	Пуско-наладочные работы	16 дней	30.05.24	17.06.24																	
147	Комплексная наладка смонтированного оборудования	16 дней	30.05.24	17.06.24																	

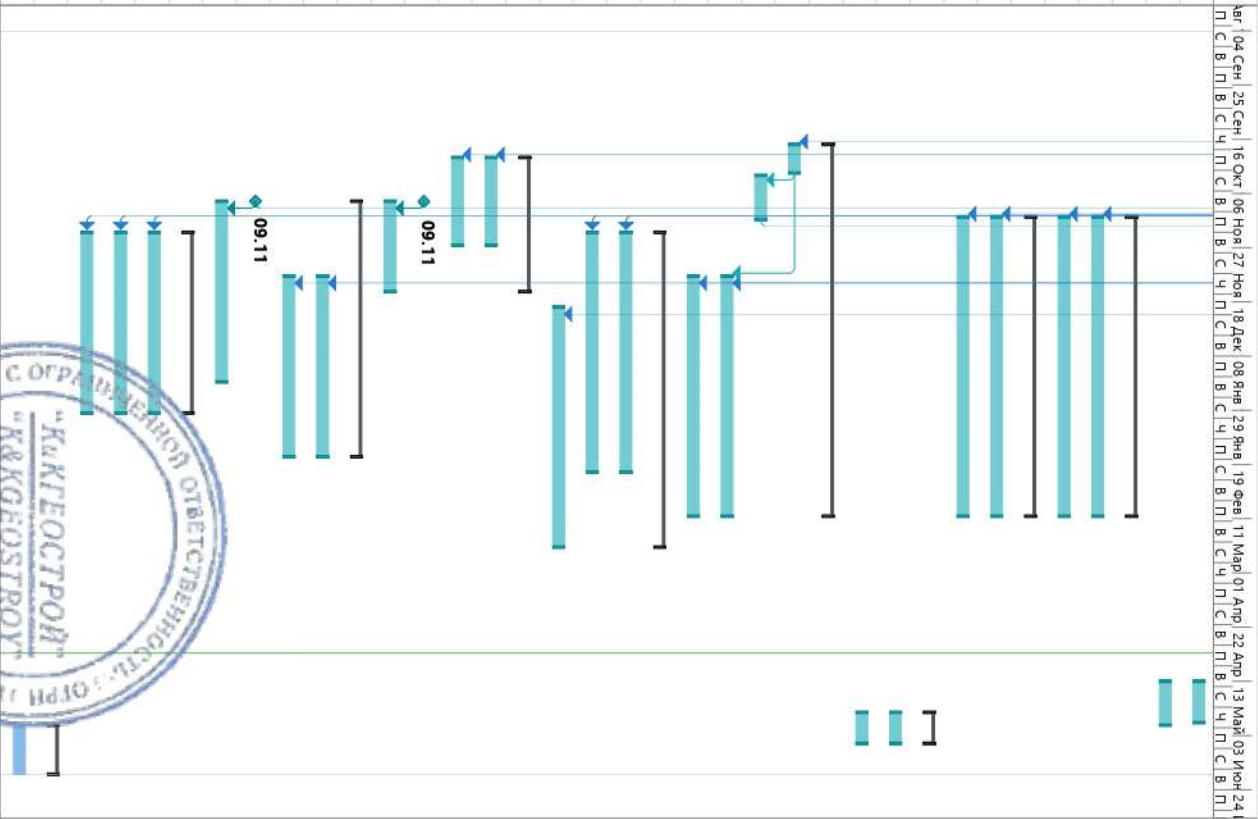

Заказчик: Генеральный директор АО «Метровагонмаш» _____ /А.Б. Степнов/ М.П.

Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «КИГЕОСТРОЙ» _____ /Ю.Ф. Кеслер/ М.П.

