

АКТ №4
о необходимости выполнения работ
03.04.2026г.

03.04.2026г.

Объект капитального строительства

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

(наименование объекта)

Договор подряда на СМР

№ 314-25/104 от 22.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся

Представитель заказчика

Руководитель проектного офиса

ООО «ЕТУ»

Гуляев Е.В.

Главный инженер проектов

ООО "ЕТУ"

Егоров Л.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель руководителя направления по строительству

объектов минеральных грузов

ООО "ЕТУ"

Боровков А.Ю

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель подрядной строительной организации

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие в проекте 1632-2021-2.1.3-КМ данных о работах по укрупнению колонн

(кратко указывается наименование работ)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Выявлено отсутствие в РД шифр 1632-2021-2.1.3-КМ работ по укрупнённой сборке опорных колонн в осях А-Б/2—41: колонны — 80 шт., надколонники — 80 шт., общей массой 117 794,4 кг.

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Подготовка кромок под стыковые сварные швы (шириной 0,3м) типа С25 в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п./м2	0,00	152,96/45,89	152,96/45,89	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Выполнение стыковой сварки колонн с надколонниками в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	т	0,00	117,79	117,79	К увеличению
3	1632-2021-2.1.3-КМ	Визуально-инструментальный контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	152,96	152,96	К увеличению
4	1632-2021-2.1.3-КМ	Ультразвуковой контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	152,96	152,96	К увеличению

Представитель заказчика

Руководитель проектного офиса

ООО «ЕТУ»

Гуляев Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Главный инженер проектов

ООО "ЕТУ"

Егоров Л.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Заместитель руководителя направления по строительству

объектов минеральных грузов

ООО "ЕТУ"

Боровков А.Ю

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель подрядной строительной организации

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

АКТ №4
о необходимости выполнения работ
03.04.2026г.

03.04.2026г.

Объект капитального строительства

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

(наименование объекта)

Договор подряда на СМР

№ 314-25/104 от 22.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся

Представитель заказчика

Руководитель проектного офиса

ООО «ЕТУ»

Гуляев Е.В.

Главный инженер проектов

ООО "ЕТУ"

Егоров Л.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель руководителя направления по строительству

объектов минеральных грузов

ООО "ЕТУ"

Боровков А.Ю

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель подрядной строительной организации

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие в проекте 1632-2021-2.1.3-КМ данных о работах по укрупнению колонн

(кратко указывается наименование работ)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Выявлено отсутствие в РД шифр 1632-2021-2.1.3-КМ работ по укрупнённой сборке опорных колонн в осях А-Б/2-41: колонны — 80 шт., надколонники — 80 шт., общей массой 117 794,4 кг.

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Подготовка кромок под стыковые сварные швы (шириной 0,3м) типа С25 в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п./м2	0,00	152,96/45,89	152,96/45,89	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Выполнение стыковой сварки колонн с надколонниками в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	т	0,00	117,79	117,79	К увеличению
3	1632-2021-2.1.3-КМ	Визуально-инструментальный контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	152,96	152,96	К увеличению
4	1632-2021-2.1.3-КМ	Ультразвуковой контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	152,96	152,96	К увеличению

Представитель заказчика

Руководитель проектного офиса

ООО «ЕТУ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Гуляев Е.В.

Главный инженер проектов

ООО "ЕТУ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Егоров Л.В.

Заместитель руководителя направления по строительству

объектов минеральных грузов

ООО "ЕТУ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Боровков А.Ю

Представитель подрядной строительной организации



Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Шевчук К.А.

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Подготовка кромок под стыковые сварные швы (шириной 0,3м) типа С25 в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п./м2	0,00	152,96/45,89	152,96/45,89	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Выполнение стыковой сварки колонн с надколонниками в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	т	0,00	117,79	117,79	К увеличению
3	1632-2021-2.1.3-КМ	Визуально-инструментальный контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	152,96	152,96	К увеличению
4	1632-2021-2.1.3-КМ	Ультразвуковой контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	152,96	152,96	К увеличению

стенка 358мм+ полки 299мм
 $((0,358*2)+(0,299*4))*80$
 152,96*0,3

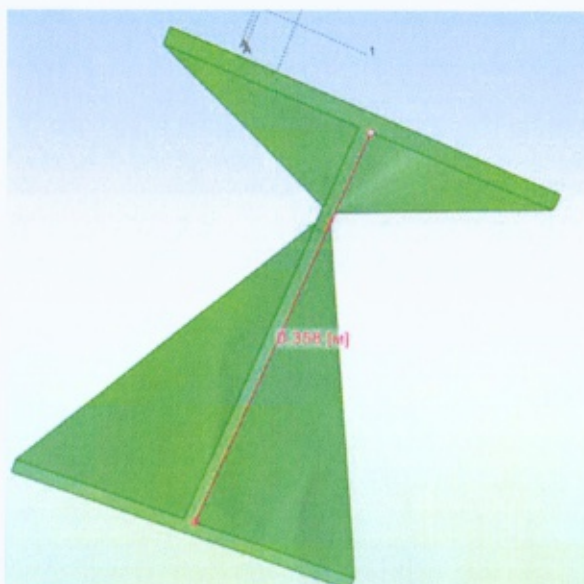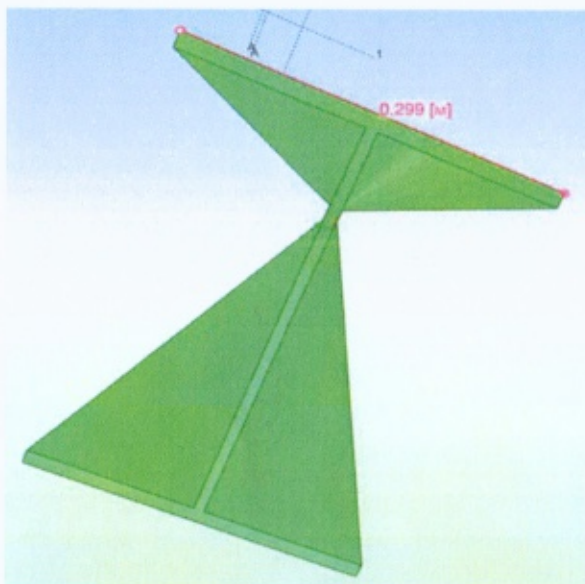

№ п/п	Лист	Марка	Наименование марки	Кол-во, шт.	Вес 1-ой, кг	Общий вес с привесом, кг	Выполнено всего с начала работ, кг	Остаток, кг	июн.26	фев.26	мар.26	апр.26	май.26	Примечание
1688	1687	108	401-3	1	1 181,60	1 181,60	1 181,60	-						раздел 1
1689	1688	149	401-4	2	325,60	651,20	651,20	-						раздел 1
1690	1689	150	401-5	6	1 190,40	7 142,40	7 142,40	-						раздел 1
1691	1690	151	401-6	6	747,00	4 482,00	4 482,00	-						раздел 1
1692	1691	152	401-7	1	1 215,00	1 215,00	1 215,00	-						раздел 1
1693	1692	153	401-8	1	258,10	258,10	258,10	-						раздел 1
1694	1693	154	401-9	1	1 220,10	1 220,10	1 220,10	-						раздел 1
1695	1694	155	401-10	1	319,30	319,30	319,30	-						раздел 1
1696	1695	156	401-11	1	1 198,70	1 198,70	1 198,70	-						раздел 1
1697	1696	157	401-12	1	258,10	258,10	258,10	-						раздел 1
1698	1697	158	401-13	1	1 215,00	1 215,00	1 215,00	-						раздел 1
1699	1698	159	401-14	1	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-						раздел 1
1700	1699	160	401-15	1	232,40	232,40	232,40	-						раздел 1
1701	1700	161	401-16	1	1 575,50	1 575,50	1 575,50	-						раздел 1
1702	1701	162	401-17	1	215,80	215,80	215,80	-						раздел 1
1703	1702	163	401-18	1	1 202,70	1 202,70	1 202,70	-						раздел 1
1704	1703	164	401-19	1	243,50	243,50	243,50	-						раздел 1
1705	1704	165	401-20	1	1 202,70	1 202,70	1 202,70	-						раздел 1
1706	1705	166	401-21	1	247,50	247,50	247,50	-						раздел 1
1707	1706	167	402-1	1	1 753,20	1 753,20	1 753,20	-						раздел 1
1708	1707	168	402-2	10	1 764,70	17 647,00	17 647,00	-						раздел 1
1709	1708	169	402-3	1	1 796,10	1 796,10	1 796,10	-						раздел 1
1710	1709	170	402-4	1	1 779,20	1 779,20	1 779,20	-						раздел 1
1711	1710	171	403-1	1	1 476,30	1 476,30	1 476,30	-						раздел 1

Протоколы ВК и УЗК на колонны с надколонниками

[illegible]

[illegible]
