

Ид.	Режим задачи	Название	Длительность	Начало	Окончание	Мар	Кв. 2, 2023 Апр Май
1		Разработка проектной документации	1 день?	Пн 03.04.23	Пн 03.04.23		
2		Архитектурно-строительные решения*	12 дней	Сб 15.04.23	Пн 01.05.23		
3		Согласование	10 дней	Вт 02.05.23	Пн 15.05.23		
4		Водоснабжение, канализация, тепломеханические решения*	12 дней	Сб 15.04.23	Пн 01.05.23		
5		Согласование	10 дней	Вт 02.05.23	Пн 15.05.23		
6		Внутренний противопожарный водопровод*	12 дней	Сб 15.04.23	Пн 01.05.23		
7		Согласование	10 дней	Вт 02.05.23	Пн 15.05.23		
8		Отопление, вентиляция и кондиционирование*	12 дней	Сб 15.04.23	Пн 01.05.23		
9		Согласование	10 дней	Вт 02.05.23	Пн 15.05.23		
10		Электротехнические решения*	12 дней	Сб 15.04.23	Пн 01.05.23		
11		Согласование	10 дней	Вт 02.05.23	Пн 15.05.23		
12		Слаботочные системы*	12 дней	Сб 15.04.23	Пн 01.05.23		
13		Согласование	10 дней	Вт 02.05.23	Пн 15.05.23		
14		Сметная документация*	16 дней	Пн 01.05.23	Сб 20.05.23		
15		Согласование	10 дней	Пн 22.05.23	Пт 02.06.23		
16		Тендерные процедуры	0 дней	Пт 07.04.23	Пт 07.04.23		
17		Выбор подрядчика	0 дней	Пт 07.04.23	Пт 07.04.23		

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	

Ид.	Режим задачи	Название	Длительность	Начало	Окончание	Мар	Кв. 2, 2023	Апр	Май
18		Заключение договора	0 дней	Пт 07.04.23	Пт 07.04.23				
19		Получение БГ	0 дней	Пт 07.04.23	Пт 07.04.23				
20		Авансовый платеж	0 дней	Пт 07.04.23	Пт 07.04.23				
21		Поставка оборудования и материалов	120 дней	Ср 10.05.23	Вт 24.10.23				
22		Изготовление поставка компрессоров	120 дней	Ср 10.05.23	Вт 24.10.23				
23		Изготовление и поставка вент. Оборудования	75 дней	Ср 10.05.23	Вт 22.08.23				
24		Поставка шинпровода	60 дней	Ср 10.05.23	Вт 01.08.23				
25		Автоматические ворота	45 дней	Ср 10.05.23	Вт 11.07.23				
26		Распред шкафы (сборные)	30 дней	Ср 10.05.23	Вт 20.06.23				
27		Поставка РШП	30 дней	Ср 10.05.23	Вт 20.06.23				
28		АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	158 дней	Пт 07.04.23	Вт 14.11.23				
29		Начало работ АР	0 дней	Пт 07.04.23	Пт 07.04.23				
30		ЖД пути цеха №8	90 дней	Ср 10.05.23	Вт 12.09.23				
31		Перегородка цеха №8	60 дней	Пн 05.06.23	Пт 25.08.23				
32		Ворота, двери перегородки цеха	30 дней	Пн 28.08.23	Пт 06.10.23				
33		Ворота цеха автоматические выездные 4 шт	30 дней	Пн 28.08.23	Пт 06.10.23				
34		Устройство полов 8000 м2 (огнестойкие и повышенного износа)	45 дней	Ср 13.09.23	Вт 14.11.23				

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	

Ид.	Режим задачи	Название	Длительность	Начало	Окончание	Мар	Кв. 2, 2023	Апр	Май
35		АБК	100 дней	Вт 20.06.23	Вт 07.11.23				
36		Начало работ АБК	0 дней	Вт 20.06.23	Вт 20.06.23				
37		Полы, отделка полов	90 дней	Ср 21.06.23	Вт 24.10.23				
38		Перегородки, отделка	60 дней	Ср 21.06.23	Вт 12.09.23				
39		Подвесные потолки	15 дней	Ср 13.09.23	Вт 03.10.23				
40		Двери, окна	30 дней	Ср 13.09.23	Вт 24.10.23				
41		Устройство отделки мокрых зон	30 дней	Ср 13.09.23	Вт 24.10.23				
42		Водопровод, канализация	60 дней	Ср 21.06.23	Вт 12.09.23				
43		Освещение, электропитание	70 дней	Ср 02.08.23	Вт 07.11.23				
44		Отопление	60 дней	Ср 21.06.23	Вт 12.09.23				
45		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	90 дней	Чт 01.06.23	Ср 04.10.23				
46		Начало работ Электроснабжение	0 дней	Чт 01.06.23	Чт 01.06.23				
47		Монтаж кабеля от шинопровода до сварочной розетки 380В в щитке на 31 сварочный пост	60 дней	Чт 01.06.23	Ср 23.08.23				
48		Монтаж кабелей питания кранов мостовых 3 шт.	60 дней	Чт 01.06.23	Ср 23.08.23				
49		Монтаж распред шкафов (сборные)	60 дней	Чт 13.07.23	Ср 04.10.23				

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	


Ид.	Режим задачи	Название	Длительность	Начало	Окончание	Мар	Кв. 2, 2023	Апр	Май
50		Монтаж сети внутреннего освещения (общее+аварийное – светильники диодные без замены питающей сети)	60 дней	Чт 01.06.23	Ср 23.08.23				
51		Монтаж светильников уличные наружного освещения	30 дней	Чт 24.08.23	Ср 04.10.23				
52		Монтаж шинпровода	60 дней	Чт 13.07.23	Ср 04.10.23				
53		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	105 дней	Пн 05.06.23	Пт 27.10.23				
54		Начало работ по отплению и вентиляции	0 дней	Пн 05.06.23	Пн 05.06.23				
55		Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции	40 дней	Пн 05.06.23	Пт 28.07.23				
56		Монтаж приточно-вытяжной установки и ситемы фильтрации	15 дней	Ср 23.08.23	Вт 12.09.23				
57		Монтаж водяных тепловых завес над воротами	15 дней	Пн 09.10.23	Пт 27.10.23				
58		Установка кондиционеров для АБК	30 дней	Ср 13.09.23	Вт 24.10.23				
59		Пусконаладочные работы	15 дней	Ср 13.09.23	Вт 03.10.23				
60		СИСТЕМА ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА	140 дней	Чт 01.06.23	Ср 13.12.23				
61		Подготовительные работы	7 дней	Чт 01.06.23	Пт 09.06.23				
62		Дополнительные трубопроводы для подачи воздуха	30 дней	Пн 12.06.23	Пт 21.07.23				
63		Монтаж компрессоров	21 дней	Ср 25.10.23	Ср 22.11.23				
64		Пусконаладка	15 дней	Чт 23.11.23	Ср 13.12.23				

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	

Ид.	Режим задачи	Название	Длительность	Начало	Окончание	Мар	Кв. 2, 2023	Апр	Май
65		АПС пожарная сигнализация	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
66		Начало работ ПЖ	0 дней	Пт 01.09.23	Пт 01.09.23				
67		- пульт АПС С200-М	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
68		- извещатели пожарные автоматические и ручные	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
69		- ИБП	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
70		СОУЭ (оповещение и эвакуация)	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
71		Начало работ СОУЭ	0 дней	Пт 01.09.23	Пт 01.09.23				
72		- звуковые оповещатели	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
73		- световые оповещатели	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
74		СКС	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
75		Начало работ СКС	0 дней	Пт 01.09.23	Пт 01.09.23				
76		- ВОЛС кабель	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
77		- медный кабель (витая пара)	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
78		- патч корды	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
79		- оптические кроссы	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
80		- патч панели	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
81		- Ethernet коммутаторы	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
82		- ИБП	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				


Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	


Ид.	Режим задачи	Название	Длительность	Начало	Окончание	Мар	Кв. 2, 2023	Апр	Май
83		- кабельные органайзеры	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
84		- универсальные розетки типа RJ45	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
85		- кабельные лотки	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
86		СОТ (охранное телевидение)	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
87		Начало работ СОТ							
88		- IP-камеры Hikvision с поддержкой PoE	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
89		- розетки, репитеры, кабель	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				
90		- коммутаторы	45 дней	Пт 01.09.23	Чт 02.11.23				

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	




Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	

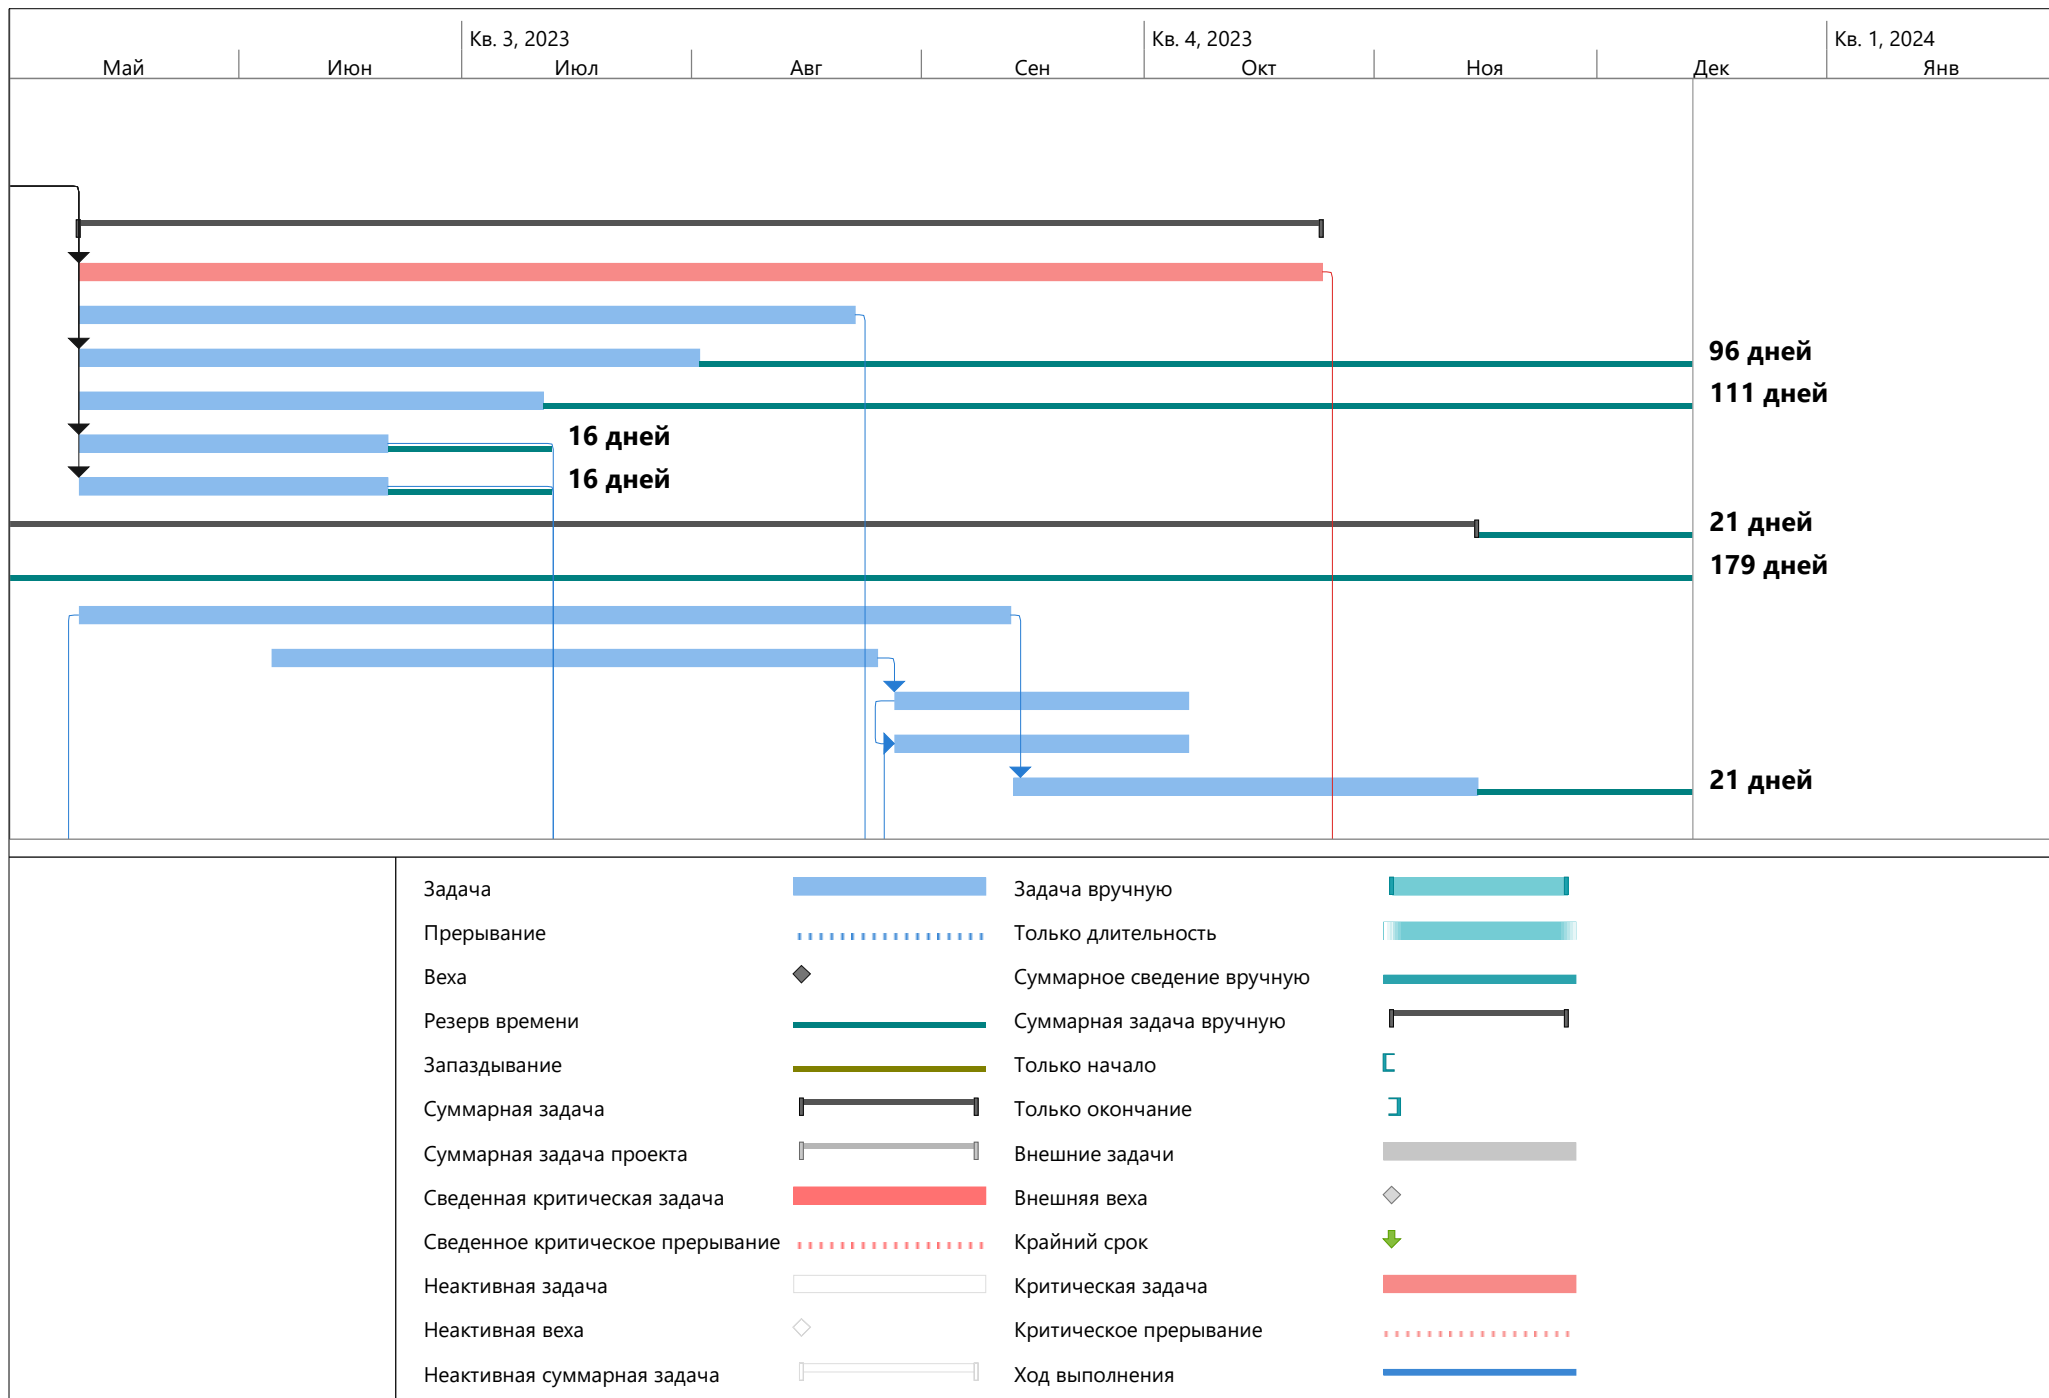

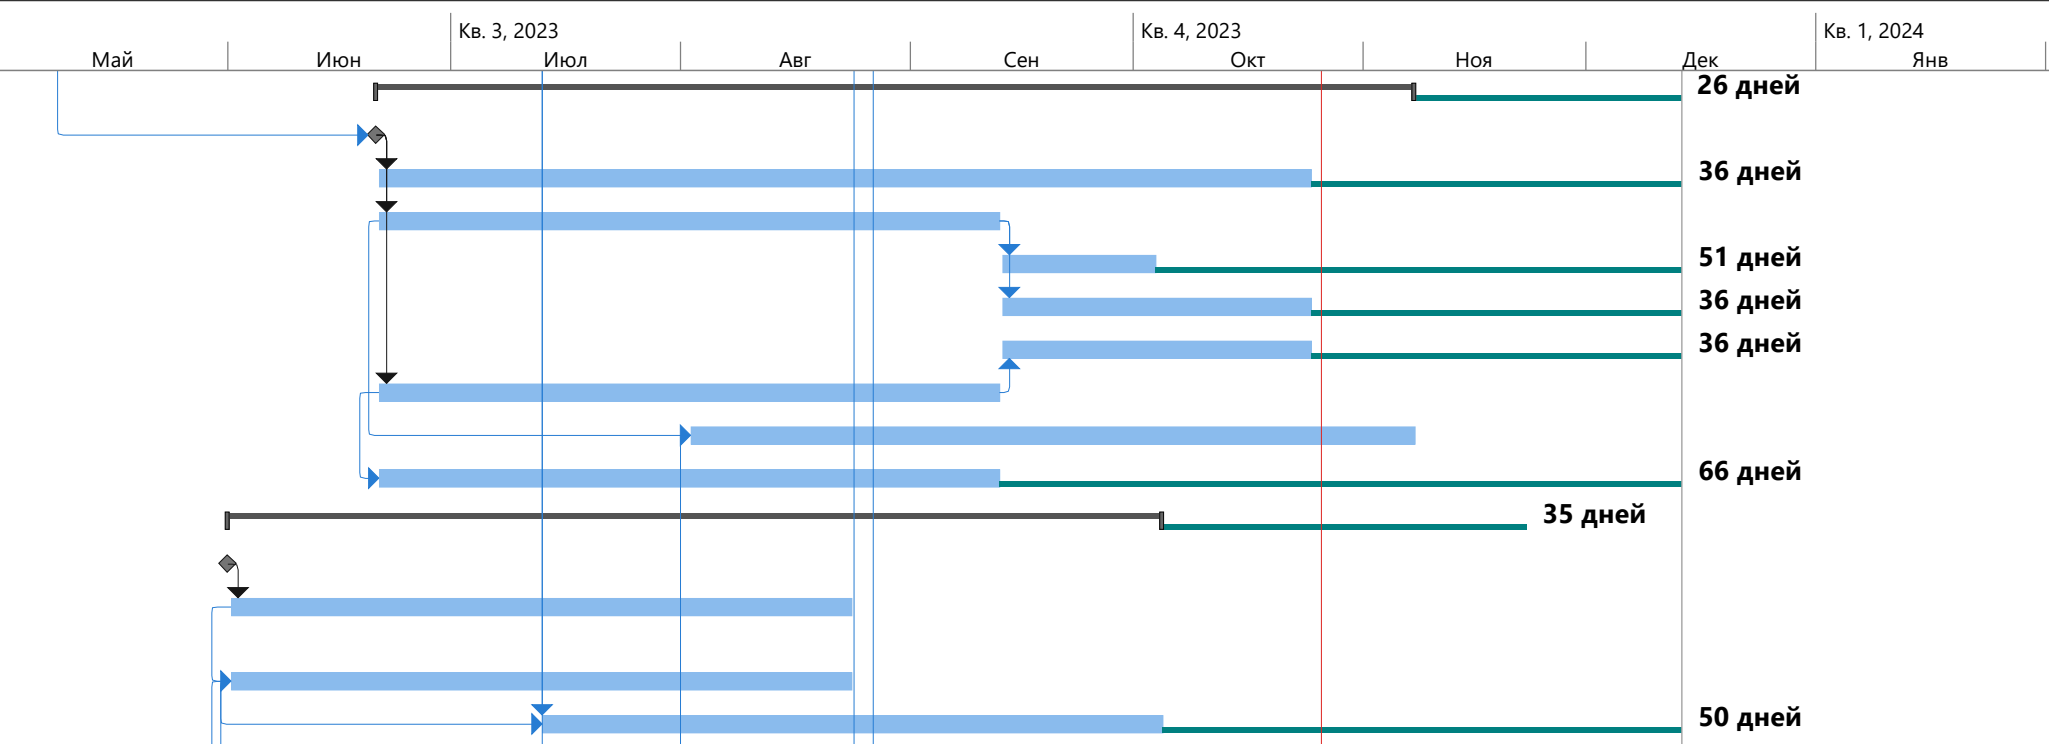

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	

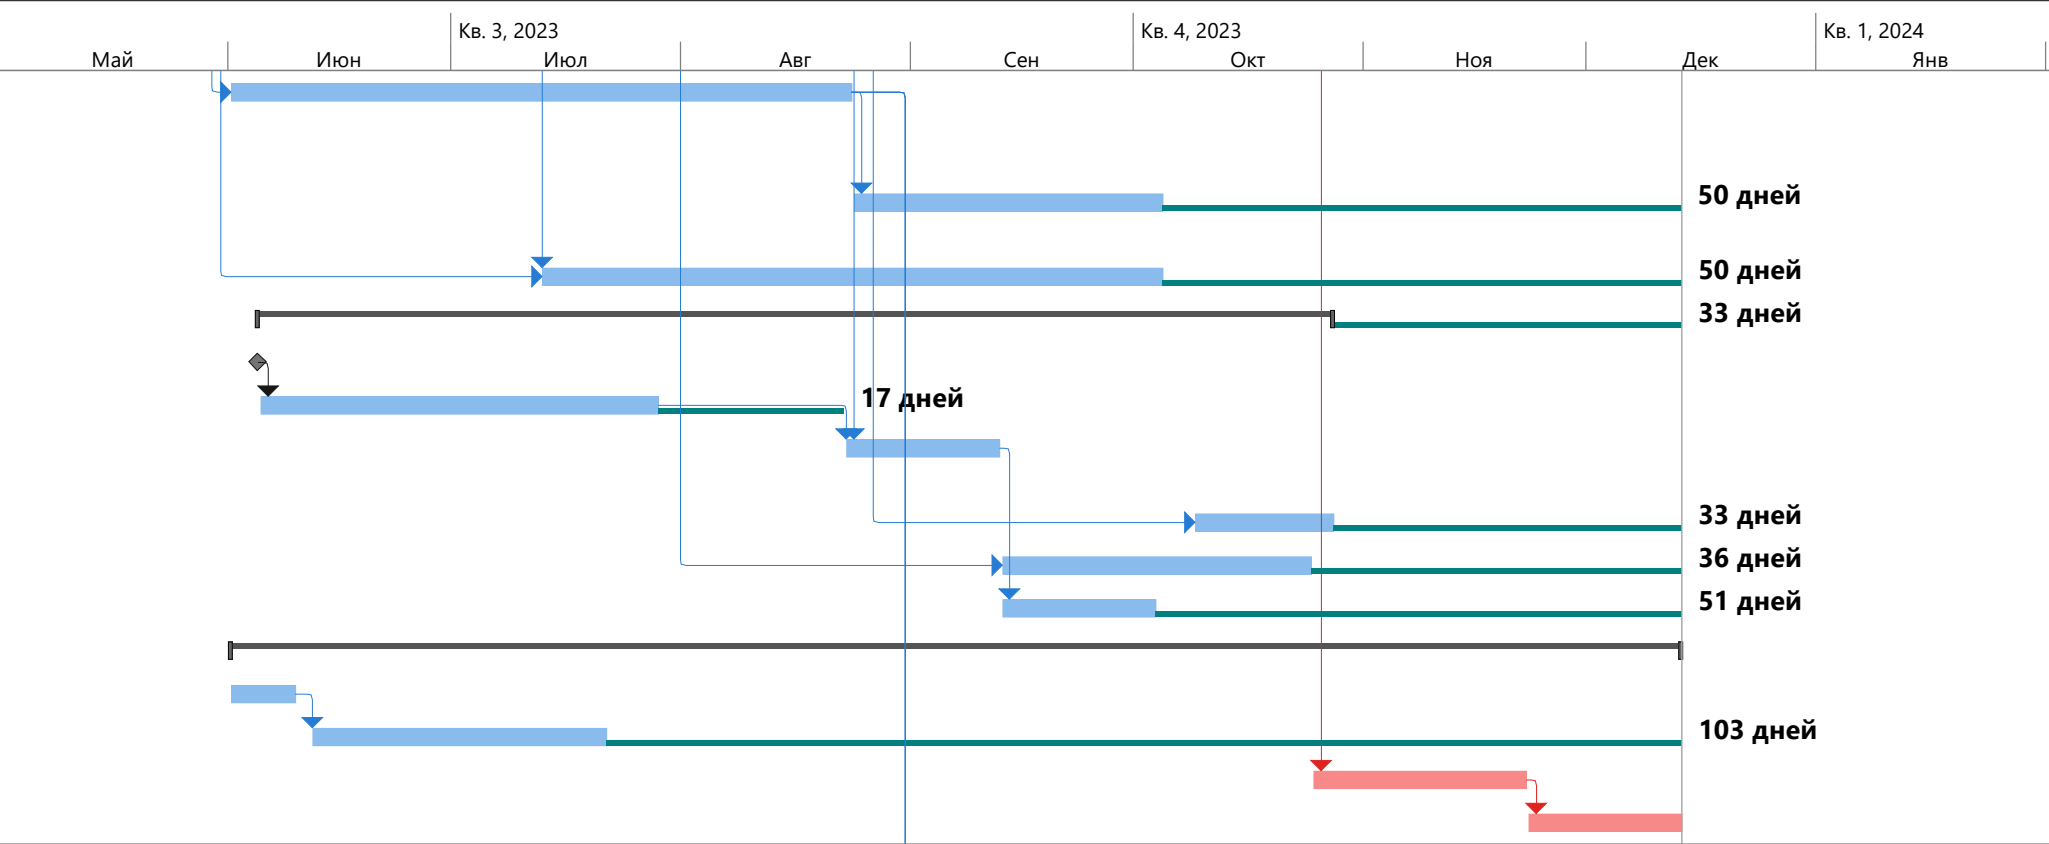

Задача		Задача вручную	
Прерывание		Только длительность	
Веха		Суммарное сведение вручную	
Резерв времени		Суммарная задача вручную	
Запаздывание		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Сведенная критическая задача		Внешняя веха	
Сведенное критическое прерывание		Крайний срок	
Неактивная задача		Критическая задача	
Неактивная веха		Критическое прерывание	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	

